



2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



MART 2018

MART 2018



ANKARA ÜNİVERSİTESİ

**2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2018



Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	8
1.GENEL DEĞERLENDİRME	10
1.MİSYON	10
2.VİZYON.....	10
3.İLKELER	10
4.AMAÇ VE HEDEFLER	11
2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	13
3.MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	15
a) İnsan Kaynakları	15
b) Fiziksel Kaynaklar	18
4.2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	28
5. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	31
a) Genel Yatırım Uygulama Durumu	31
b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	37
6. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	39
1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu	39
2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	47
3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu	64
7.ÖNERİLER.....	73
2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	74
2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU	78

YÖNETİCİ ÖZETİ

Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde toplam 65.892 öğrencisi, 3.508 akademik personeli, 58 yabancı uyruklu akademik personeli, 4.809 idari personeli, 405 sözleşmeli 152 işçi olmak üzere toplam 8.932 personeli ile 18 fakülte, 13 enstitü, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 50 araştırma uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, uzaktan eğitim merkezi, Rektörlüğe bağlı 1 bölüm, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 2 araştırma uygulama hastanesi ve 1 dış hekimliği uygulama hastanesi ile 14 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, kültür, spor, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2017 yılı yatırımları için toplam 173.054.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 45.359.058,09 TL ekleme işlemi ile toplam 196.509.307,50 TL'ye çıkmıştır.

Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %89,97, bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %84,12 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo-1 2017 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)

Sektör	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Gerçekleşme	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	42.500	46.341	43.957	94,86
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	3.500	3.500	3.487	99,63
Kültür	11.500	11.500	10.938	95,11
Sağlık	65.734	76.571	57.627	75,26
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar	49.820	80.501	80.501	100,00
TOPLAM	173.054	218.413	196.510	89,97
TOPLAM (BAP Hariç)	123.234	137.912	116.009	84,12

Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir. BAP harcamaları özel hesaba aktarılan tutarı ifade etmektedir.

2017 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 43.956.598,14 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Didim Uluslararası Gençlik Merkezi başta olmak üzere Biyoteknoloji Enstitüsü Binası ile Ziraat kazan dairesi ve ahır binası ile Cebeci kantin binası ile birlikte 5 adet yeni bina yapılmıştır. Diğer taraftan kampüslerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 84 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, kitap alımı, bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %94,86 ile yüksek oranda bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Beden Eğitimi ve spor sektöründe ise 3.487.018,51 TL harcama gerçekleşmiş olup; proje kapsamında Gölbaşı Yerleşkesi Spor Tesisi ihalesi ve zorunlu olan 4 adet Açık Spor Tesislerinin Onarımı yapılmıştır. Beden eğitimi ve spor sektöründe gerçekleşme %99,63 oranında olmuştur.

Diğer taraftan kültür sektöründe 10.937.666,19 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda etüt proje işleri ve Ziraat Fakültesi Tescilli Yemler ve Hayvan Besleme binası Restorasyon ve Hukuk Fakültesi Isı Merkezi Galeri Hattı, Yıldırım Beyazıt Yurdu Onarımı ile Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Binalarının Restorasyonları yapılmıştır. Kültür sektöründe %95,11 oranında yüksek bir gerçekleştirme olduğu görülmektedir.

Sağlık Sektöründe 57.626.536,49 TL kaynak kullanımı ile 24adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, hastanelerimizin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmış ve Diş Hekimliği Uygulama Hastanesinin inşaatı devam etmektedir. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleştirme oranı %75,26'dır.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 80.501.488,17 TL ödenek bütçeden özel hesaba aktarılarak bilimsel araştırma projeleri desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere emanet hesaplara aktarılmıştır.

2017 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof.Dr.Erkan İBİŞ
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.MİSYON

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

- Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi,
- Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinler arası araştırmalar yapmayı,
- Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeterek yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir.

2.VİZYON

Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır.

3.İLKELER

- Akademik özgürlüğe öncelik verme
- Etik değerlere bağlılık
- Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Tarihine sahip çıkma
- Kentle bütünleşme
- Saydamlık
- Katılımcılık
- Çalışana ve öğrenciye güven duyma
- Öğrenci merkezlilik
- Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı
- Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı

4.AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2014-2018 dönemi stratejik planında 6 adet stratejik amaç altında 31 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir.

Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler


Amaç-1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.1. Üniversitenin Araştırmaya Yönelik Öz Kaynaklarının Arttırılması, Etkin Yönetilmesi ve Dış Kaynaklardan Azami Düzeyde Yararlanılarak Daha Çok Araştırmanın Destek Bulmasını Sağlamak
Hedef 1.2. Araştırmaya İlişkin Kurumsal Yapıyı, Araştırma Sayısını ve Niteliğini Artıracak Şekilde Geliştirmek
Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak
Hedef 1.4. Doktora Öğrenci Sayısını ve Eğitimin Niteliğini Arttırmak
Hedef 1.5. Araştırmaların Öncelikli Alanlara ve Disiplinler Arası Çalışmalara Yönlenmesini Sağlamak
Hedef 1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek ve etkin kullanmak
Amaç-2. Eğitimin Niteliğini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek
Hedef 2.1. Nitelikli Öğrencileri Üniversitemize Çekmek
Hedef 2.2. Gereksemin Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliği Geliştirmek
Hedef 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek
Hedef 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak
Hedef 2.5. Öğrencilerin Akademik ve Bireysel Gelişimini Desteklemek
Hedef 2.6. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Değişim Programlarını Destekleyerek Eğitimde Birbirinden Öğrenme Sürecini Hızlandırmak
Hedef 2.7. Örgün Öğretimi Uzaktan Öğretim İle Desteklemek
Amaç-3. Toplumun Farklı Kesimleriyle İşbirliği İçinde Toplumsal Sorunlara Çözüm Üretmek
Hedef 3.1. Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirerek Ülke Kalkınmasına Hizmet Etmek ve Ankara İle Çevresinin Ekonomik Gelişimini Desteklemek
Hedef 3.2. Farklı İletişim Kanalları Kullanılarak Üniversitenin Ürettiği Bilgiyi Topluma Yaymak
Hedef 3.3. Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kültürel/Sanatsal ve Sportif Etkinliklerle Ankara'nın Sosyal Yaşamına Katkıda Bulunmak
Hedef 3.4. Üniversitenin Eğitim ve Mal/Hizmet Üretme Potansiyelini Ekonominin ve Toplumun Yararına Sunmak
Amaç-4. Ulusal ve Uluslararası Yeterliliğini Sağlamış Kurumsal Yapılanması İle Hasta Memnuniyetini Öne Çıkaran ve Üçüncü Basamak Üst Düzey Merkezler Kurarak Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak
Hedef 4.1. Sağlık Hizmetleri Sunumunda Değişen Talep Koşulları Çerçevesinde Ulusal ve Uluslar Arası Yeterliklere Sahip, Hasta Memnuniyetini Ön Plana Alan Sağlık Kurumu Kimliğini Sürdürmek
Hedef 4.2. Demografik Yapıdaki Değişimle Birlikte, Teknolojideki Değişimleri De Kavrayacak Şekilde Gelişmelere Uygun Yeni Üst Düzey Merkezler Kurmak ve Mevcut Merkezleri İyileştirmek
Hedef 4.3. Kurumsal Yapılanmayı Güçlendirip Çeşitli Ülkelerde Yapılacak İşbirlikleri İle Sağlık Turizmini Geliştirmek
Hedef 4.4. Dış Hekimliği Fakültesini Hastanesi ile birlikte tam teşekküllü bir yapıya ulaştırmak
Hedef 4.5. Hastanelerin Hizmet Sunumunda Yönetimsel Etkinliği Sağlamaya Yönelik Olarak Kurumsal Altyapıyı Güçlendirmek

Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler (Devamı)**Amaç -5. Üniversitenin Bütün Yerleşkelerinde Öğrenci, Çalışan ve Diğer Paydaşların Gereksinimlerini Karşılama ve Yaşam Kalitelerini Yükseltmek****Hedef 5.1.** Yerleşkelerin Fiziksel, Mekansal, Teknolojik Altyapı ve Güvenlik Eksikliklerini Gidermek**Hedef 5.2.** Yerleşkelerde Öğrencilerin Temel Gereksinimlerinin (Barınma, Beslenme, Sağlık, Ulaşım vb.) Giderilmesine Katkıda Bulunmak**Hedef 5.3.** Yerleşkelerdeki Sosyal Yaşam Olanaklarını Geliştirmek**Hedef 5.4.** Bütün Yerleşkelerde Öğrenci, Akademisyen ve Diğer Yararlanıcıların Akademik Yayınlarına Erişimini Sağlamak**Hedef 5.5.** Çevreye Duyarlı Yerleşkeler Oluşturmak**Amaç-6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Yaşama Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek****Hedef 6.1.** Bilgi Sistemlerini Öğrenci/Çalışana Sunulan Bütün Elektronik Hizmetleri İçerecek Şekilde Geliştirmek**Hedef 6.2.** Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Altyapıya Sahip Olmak**Hedef 6.3.** Fakültelerde Ayrı Ayrı Oluşmuş Kimliklere Çatı Oluşturan ve Üniversite Aidiyetini Güçlendiren Ankara Üniversitesi Kurumsal Kimliğini Geliştirmek ve Mezunların Aidiyet Hissini Geliştirmek**Hedef 6.4.** Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini Artırmak

2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ankara Üniversitesi'nin 2017 Yılı Yatırım Programında toplam 20 adet proje için 178.054.000,00 TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde programa sosyal ve teknolojik araştırmalar sektöründen bir proje daha dahil edilmiş olup toplam proje sayısı 21'e yükselmiştir. Diğer taraftan gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu itibariyle 223.613.058,09 TL kaynak olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 528.000,00 TL'si öz gelir, 19.749.768,09 TL'si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 5.200.000,00 TL'si döner sermaye, 198.135.290,00 TL'si hazine yardımı olarak finanse edilmiştir.

Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılımı



2017 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 6 adet proje için 42.500.000,00 TL kaynak ayrılmış olup 528.000,00 TL'sinin öz gelirlerle, 41.972.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 3.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kültür sektörü kapsamında ise biri etüt proje olmak üzere 2 adet projeye yer verilmiştir ve projeler için toplam 11.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sağlık Sektöründe ise 3 adet proje için toplam 70.734.000,00 TL kaynak tahsis edilmiş olup; 5.000.000,00 TL'sinin döner sermaye kaynakları ve 65.734.000,00 TL'sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 8 adet proje için 49.820.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; 9.010.000,00 TL'sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 40.810.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. İlgili sektöre yılı içinde ayrıca Kolorektal Kanseri Erken Tanı Araştırma Projesi eklenmiş olup söz konusu projeye 2017 yılı için 13.930.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-3 2017 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)

PROJE NO	PROJE ADI	2017 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI				
			ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE	DÖNER SERMAYE KATKI PAYI	HAZİNE YARDIMI	HİBE/DIŞ ÖZKAYNAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM		178.054	528	5.000	9.010	163.516	0
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR		49.820	0	0	9.010	40.810	0
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab.	300				300	
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	300				300	
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	37.160				37.160	
2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	550				550	
2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	500				500	
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	1.000				1.000	
2017K120160	Kök Hücre Araştırma Merkezi	1.000				1.000	
2015K120160	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	9.010			9.010		
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM		42.500	528	0	0	41.972	0
2017H032390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500				500	
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	10.000				10.000	
2017H032400	Muhtelif İşler	6.000	528			5.472	
2013H030660	Büyük Onarım	17.000				17.000	
2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	4.000				4.000	
2017H032410	Yayın Alımı	5.000				5.000	
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		3.500	0	0	0	3.500	0
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.500				3.500	
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR		11.500	0	0	0	11.500	0
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	1.000				1.000	
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	10.500				10.500	
SAĞLIK		70.734	0	5.000	0	65.734	0
2011I000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	1.000				1.000	
2012I000160	Muhtelif İşler	39.734		5.000		34.734	
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	30.000				30.000	

3.MEV CUT HİZMET KAPASİTESİ

a) İnsan Kaynakları


Ankara Üniversitesinde 2017 yılsonu itibarıyla 3.508 akademik, 58 yabancı uyruklu akademik, 118 sözleşmeli öğretici, 524 Üniversitemize 2547/35 madde ile görevlendirilen akademik personel, 4.809 idari, 405 sözleşmeli idari ve 152 (135'i sürekli 17'si geçici) işçi olmak üzere toplam 9.574 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %44'ünü akademik, %56'sını idari personel ve işçiler oluşturmaktadır.

Tablo-4 2015-2017 Yılları Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2015 Yılı	2016 Yılı	2017 Yılı	2017 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Akademik Personel (Kadrolu-Şahsa Bağlı Kadro)	3.622	3.565	3.508	-1,60
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	66	74	58	-21,62
Sözleşmeli Öğretici Personel	169	146	118	-19,18
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2547/35)	694	646	524	-18,89
İdari Personel (Kadrolu)	5.115	4.957	4.809	-2,99
Sözleşmeli İdari Personel	453	354	405	14,41
İşçi	183	162	152	-6,17
Toplam	10.302	9.904	9.574	-3,33

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-2 2017 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı



2017 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %1,6 oranında azalma göstermiştir. En büyük azalma %6,8 oran ile doçent kadrosunda görülmekte olup, diğer akademik personel sayıları karşılaştırıldığında %10,9 ile uzman kadrosunda, %10,8 oran ile öğretim görevlisi sayılarında artış yaşanmıştır.


2017 yılsonu 1.776 öğretim üyelerinin, %44,9'u kadın, %55,1'i erkek, toplam akademik personelin ise %51,6'sı kadın, %48,4'ü erkek akademik personel oluşturmaktadır.

Tablo-5 2015-2017 Yılları Akademik Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2015 Yılı	2016 Yılı	2017 Yılı	2017 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Profesör	1.246	1.225	1.194	-2,53
Doçent	305	309	288	-6,80
Yardımcı Doçent	326	307	294	-4,23
Öğretim Görevlisi	157	148	164	10,81
Okutman	263	253	245	-3,16
Araştırma Görevlisi	1.140	1.140	1.120	-1,75
Uzman	182	183	203	10,93
Toplam	3.619	3.565	3.508	-1,60

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-3 2017 Yılı Akademik Personel Kadro Dağılımı




2017 yılı itibarıyla tahsis edilen 4.809 adet dolu kadro sayısının %53,5'ini kadın, %46,5'ini erkek personel oluşturmaktadır. Dolu kadro sayısı bir önceki yıla oranla %3 oranında azalma göstermiştir.

Tablo-6 2015-2017 Yılları İdari Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2015 Yılı	2016 Yılı	2017 Yılı	2017 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Genel İdari	2.201	2.171	2.106	-2,99
Teknik	510	498	491	-1,41
Sağlık	1.772	1.711	1.663	-2,81
Eğitim-Öğretim	1	1	1	0,00
Avukatlık	7	5	4	-20,00
Din	3	3	3	0,00
Yardımcı	621	568	541	-4,75
Toplam	5.115	4.957	4.809	-2,99

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-4 2017 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı



b) Fiziksel Kaynaklar**b.1) Taşınmazlar**


Ankara Üniversitesi, Ankara şehir merkezinde 7, ilçelerde 7 olmak üzere toplam 14 yerleşkeye yayılmış; 18 fakülte, 13 enstitü, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 50 araştırma ve uygulama merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 1 bölüm ile eğitim-öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği Rektörlük binasında, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tandoğan Yerleşkesinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ise Gölbaşı Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tablo-7 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m ²)	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)
Cebeci	79.248	75.761
Dışkapı	515.075	230.205
Dikimevi	125.322	292.517
Gümüşdere	25.831	29.941
Keçiören	24.480	22.571
Sıhhiye	123.666	122.517
Tandoğan	260.749	188.152
Beypazarı	516.195	13.430
Elmadağ	17.260	7.222
Gölbaşı	1.098.626	131.018
Haymana-Ayaş	4.973.710	5.430
Kalecik	207.344	2.889
Kazan	2.397.982	7.535
Nallıhan	2.680	1.902
Ahlatlıbel	122.908	13.100
Balgat	4.474	3.008
Çankaya	48.247	3.475
Etimesgut (Bağlıca)	2.405.083	0
Antalya	86.000	6.200
Aydın-Didim	36.977	554
Bursa	9.912	0
Kastamonu	5.436	3.750
Eskişehir	108.952	0
İzmir	1.467	1.467
Sivas Gürün	11.001	0
Toplam	13.208.625	1.162.644

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Grafik-5 Yerleşkeler Bazında Toplam Arsa/Arazi Alanı (m²)

2017 yılında Cebeci Yerleşkesinde kantin binası ve kazan dairesi yapımı, Sıhhiye Yerleşkesinde Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Binası, Dikimevi Yerleşkesinde inşaatı tamamlanan Nükleer Tıp Ek binası, Dışkapı Yerleşkesinde Ziraat Fakültesi kazan daire yapımı, Gölbaşı Yerleşkesinde Spor Tesisi, Haymana-Ayaş Ziraat Fakültesi Haymana Çiftliği Süt İneği Ahır yapılıması ile Kazan Yerleşkesinde Veteriner Fakültesi Kazan Araştırma Uygulama Çiftliği alanlarının ilavesi ile toplam kapalı hizmet alanı 2016 yılsonu kapalı alana kıyasla %1,39 oranında artmıştır.

Tablo-8 Taşınmazlara 2015 Yılında Yapılan İlaveler

2016 Yıl Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m ²)		1.146.677
Cebeci Yerleşkesi	A.Ü. Cebeci Yerleşkesi Kantin Binası Yapımı	153
	A.Ü. Cebeci Kazan Dairesi Yapımı	50
Sıhhiye Yerleşkesi	A.Ü. A.S.Y.M. Binası	2.338
Dikimevi Yerleşkesi	A.Ü. Nükleer Tıp Ek Binası	5.100
Dışkapı Yerleşkesi	A.Ü. Ziraat Fakültesi Kazan Dairesi Binası Yapımı	156
Gölbaşı Yerleşkesi	A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Spor Tesisi	4.105
Haymana Yerleşkesi	A.Ü. Ziraat Fakültesi Haymana Çiftliği Süt İneği Ahır Yapılıması	1530
Kazan Yerleşkesi	A.Ü. Veteriner Fakültesi Kazan Araştırma Uygulama Çiftliği Yapım İşİ	2535
2017 Yıl Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m ²)		1.162.644
Değişim Oranı		1,39%

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ankara Üniversitesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Üniversite bazında toplam 82 amfide eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Toplam amfinin %81,7'si fakültelerde, %11'i Devlet Konservatuvarı ile Yabancı Diller Yüksekokulunda ve %7,3'ü araştırma ve uygulama hastanelerinde bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesinde 2017 yılı itibarıyla 818 sınıfta eğitim-öğretim yapılmıştır. Toplam sınıfın %39,7'si fakültelerde, %20'si Devlet Konservatuvarı ile Yabancı Diller Yüksekokulunda, aynı oranda araştırma ve uygulama merkezlerinde, %9,8'i meslek yüksekokullarında, %7,9'u araştırma ve uygulama hastanelerinde, %1,7'si enstitülerde geri kalan %0,7'si uygulama merkezleri ile eğitim merkezlerinde bulunmaktadır.

Öğrencilerin uygulama yapmak amacıyla kullandığı 55 atölyenin %34,5'i fakültelerde, %27,3 meslek yüksekokullarında, %25,5 araştırma ve uygulama hastanelerinde, %5,5'er enstitülerde ve aynı oranda uygulama merkezlerinde, geri kalan %1,8'i'de araştırma ve uygulama merkezlerinde bulunmaktadır. Ayrıca toplam 660 laboratuvarın %41,2'si eğitim, %2,9'u sağlık, %55,9'u araştırma laboratuvarlarından oluşmaktadır.

Tablo-9 Eğitim ve Uygulama Alanları

KAPASİTE (m2)	AMFİ	SINIF	ATÖLYE	LABORATVUARLAR	TOPLAM
0-50	815	22.250	4.856	64.531	92.452
51-75	0	7.973	320	9.620	17.913
76-100	820	7.379	1.000	7.183	16.382
101-150	4.222	5.249	0	205	9.676
151-250	6.104	1.059	0	897	8.060
251-Üzeri	6.430	1.465	0	3.924	11.819
TOPLAM	18.391	45.375	6.176	86.360	156.302

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 7 adet öğrenci evi, ayrıca Gölbaşı Yerleşkesi Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binasında bulunan 47 kişi kapasiteli misafirhane ile öğrencilerimize barınma hizmeti sunulmaktadır.

Tablo-10 Öğrenci Evleri Kapasiteleri

ÖĞRENCİ EVİ	ALAN (m ²)	KAPASİTE (Kişi)
Cumhuriyet Öğrenci Evi	5.972	172
Fahriye Özaka Öğrenci Evi	1.680	100
Keçiören Öğrenci Evi	2.596	99
Milli Piyango Öğrenci Evi	10.700	348
Vehbi Koç Öğrenci Evi	4.698	200
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	12.874	242
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	8.058	234
Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası	1.570	47
TOPLAM	48.148	1.442

Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Cebeci Yerleşkesinde yer alan Milli Piyango Öğrenci Evinde bulunan misafirhane 458 m² kapalı alana sahip olup, 36 kişilik kapasite ile hizmet vermektedir. Ayrıca Gümüşdere Yerleşkesinde yardımcı hizmetli personelin yararlandığı 2 bina 20 daireden oluşan lojman bulunmaktadır.

Tablo-11 Misafirhane ve Lojmanlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Misafirhaneler	458	1	36
Lojmanlar	1.780	2	-
TOPLAM	2.238	3	36

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere toplam 52 adet yemekhane, bunun yanı sıra 57 adet kantin/kafeterya ile 4 adet restoran bulunmaktadır.

Tablo-12 Yemekhane, Kantin/Kafeteryalar ve Restoranlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	15.690	52	9.616
Kantin / Kafeteryalar	7.509	57	6.335
Restoran	949	4	900
TOPLAM	24.148	113	16.851

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-13 Toplantı ve Konferans Salonları

KAPASİTE (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	TOPLAM
0-50	141	18	159
51-75	17	8	25
76-100	3	7	10
101-150	3	6	9
151-250	1	6	7
251-Üzeri	1	11	12
TOPLAM	166	56	222

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesinde 2, Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 adet olmak üzere toplam 3 sinema salonu, Ziraat Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 1'er olmak üzere toplam 2 adet tiyatro salonu, Devlet Konservatuvarında 1 adet konser salonu, Eczacılık Fakültesinde el sanatları salonu, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinde Oyuncak Müzesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü binasında Herbaryum Müzesi, Veteriner Fakültesi 2 adet, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü bünyesinde 1'er adet olmak üzere toplamda 9 adet müze bulunmaktadır.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde tiyatro, müzik, sinema gösterimi vb. amaçlar için kullanılmak üzere 60 m² lik çok amaçlı tesis, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde de 22 m² lik çok amaçlı salon bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde Üniversite amblemi bulunan ürünlerin satışının gerçekleştiği 33 m2 lik bir satış yeri ile 50 m2 lik Ziraat Fakültesi ürünlerinin satış ve sunum yeri de Tandoğan Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Aşçılık kursu yeri ANKEV'de, kitap satış yeri de Hukuk Fakültesi ve Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır.

İbn-i Sina Hastanesi poliklinikler girişinde ve Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Tesislerinde 1'er kuaför, Siyasal Bilgiler Fakültesinde de 1 adet berber bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra Ayaş, Kalecik ve Haymana'da öğrencilerimizin kullanımına yönelik sosyal tesisler bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli fakülte, enstitü ve yüksekokullarında okuma salonları, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde de mescit bulunmaktadır.

Tablo-14 Diğer Sosyal Alanlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Sinema Salonu	413	3	390
Tiyatro Salonu	451	2	270
Konser Salonu	385	1	200
El Sanatları Salonu	130	1	9
Okuma Salonu	3.364	19	1.547
Öğrenci Sosyal Alanı	20	1	30
Sosyal Tesis (Ayaş,Haymana,Kalecik)	2.329	3	150
Müze	2.330	9	250
Çok Amaçlı Salon	22	1	15
Çok Amaçlı Tesis	60	1	80
Ürün Satış Yeri	83	3	0
Aşçılık Kursu Yeri	165	1	0
Kitap Satış Yeri	110	2	0
Kuaför	40	2	0
Berber	7	1	0
Mescit	602	18	700
TOPLAM	10.511	68	3.641

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine mesleki alanlarına göre araştırma ve uygulama yapma imkanı sunmaya devam etmektedir.

Tablo-15 Araştırma Uygulama Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Araştırma Uygulama Çiftliği	7.417.506	2
Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri	102.000	3
Kütüphane	19.223	32

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-16 Spor Alanları

Birim Adı	Kapalı Spor Tesisleri			Açık Spor Tesisleri		
	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)
Tıp Fakültesi				Tenis Kortu	1	648
				Basketbol-Voleybol	1	480
Eczacılık Fakültesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	130			
Veteriner Fakültesi				Basketbol	1	362
Ziraat Fakültesi	Basketbol	1	880	Tenis Kortu	2	1.625
				Futbol (Toprak+Halı)	2	2.350
Siyasal Bilgiler Fakültesi	Basketbol-Voleybol-Hentbol vb.	1	560			
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi				Basketbol-Voleybol	1	1.000
Spor Bilimleri Fakültesi	Genel Amaçlı Salon	1	2.200			
	Güreş ve Uzakdoğu Sporları	1	206			
	Jimnastik	1	200			
	Ritm Eğitimi	1	100			
Kalecik Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	720
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	Masa Tenisi (1), Bilardo (1) ve Langırt (1) Alanı	3	138	Basketbol	1	230
				Voleybol	1	230
Beypazarı Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	375
				Voleybol	1	300
İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	180			
Ziraat Uygulama Merkezi				Basketbol-Voleybol	2	700
Gümüşdere Yerleşkesi				Basketbol	1	50
Tandoğan Yerleşkesi	Tenis Kortu	1	648	Tenis Kortu	5	2.486
	Fitness Egzersiz Salonu	2	250	Basketbol	2	1.607
	Yüzme Havuzu	1	3.510	Voleybol	1	275
	Spor Salonu	1	1.082	Plaj Voleybol-Hentbol	1	594
				Futbol	1	1.485
Cebeci Yerleşkesi	Spor Eğitim Merkezi	1	2.045			
Dışkapı Yerleşkesi	Dışkapı Spor Salonu	1	1.250			
Keçiören Yerleşkesi	Keçiören Spor Salonu	1	400			
Gölbaşı Su Sporları Eğitim Merkezi		1	6.000			

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-17 Hastane Alanları

Alan Adı	İbn-i Sina Uyg. ve Arş. Hastanesi	Cebeci Uyg. ve Arş. Hastanesi	Dış Hekimliği Fak. ve Dış Hekimliği Uyg. Hastanesi	TOPLAM
Acil Servis	1	1	2	4
Yoğun Bakım	8	6	0	14
Ameliyathane	26	26	2	54
Poliklinik	42	159	0	201
Klinik	19	25	15	59
Laboratuvar	6	6	16	28
Eczane	1	1	0	2
Radyoloji Alanı	46	58	6	110
Nükleer Tıp Alanı	1	1	0	2
Sterilizasyon Alanı	1	5	14	20
Mutfak	1	1	2	4
Çamaşırhane	1	2	1	4
Teknik Servis	1	1	5	7
Adli Tıp	0	1	0	1
Morg	1	1	0	2
Bilgi İşlem	1	1	0	2
Hasta Bekleme Alanı	35	54	1	90
Kan Merkezi	1	1	0	2
TOPLAM	192	350	64	606

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-18 Hayvan Sağlığı Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Acil Servis	1	164
Ameliyathane	7	227
Klinik	18	293
Laboratuvar	1	103
Radyoloji Alanı	1	141
TOPLAM	28	928

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-19 Ambar ve Arşiv Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Ambar Alanı	121	9.744
Arşiv Alanları	146	7.979
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	311	26.346
TOPLAM	578	44.069

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

b.2) Taşınır

Aşağıda verilen tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. 2017 yılsonu itibarıyla, I. düzeyde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda toplam 65.089, 254 Taşıtlar grubunda toplam 516 ve 255 Demirbaşlar grubunda da 316.629 adet taşınır kayıtlıdır.

Tablo-20 2017 Yılsonu İtibariyle Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayısı

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınır	Ölçü Birimi	2017 Yılı
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	65.089
254	Taşıtlar Grubu	Adet	516
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	316.629

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tablo-21 Taşıtlar Grubu

Taşıtların Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Toplam
Otomobiller (Binek)	19	37	56
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs)	21	0	21
Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon)	18	0	18
Hafif Ticari Araç	1	3	4
Arazi Taşıtları	2	0	2
Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler)	8	0	8
Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork)	417	0	417
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)	8	0	8
Botlar	6	0	6
Yelkenliler	7	0	7
Kanolar ve Kayıklar	9	0	9
Toplam	516	40	556

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üniversitemizin ağ altyapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahiptir. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan tüm toplanma noktalarına fiber optik kablo çekilmiş ve tüm kullanıcılara aktif ağ ucu sağlanmıştır. Üniversitemiz 2 Gbps hızında metro ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahiptir.

Tablo-22 Teknolojik Kaynaklar (2015-2017)

	2015 Yılı	2016 Yılı	2017 Yılı
Sunucular	259	290	298
Masaüstü Bilgisayar	13.190	13.741	14.107
Taşınabilir Bilgisayar	4.334	4.615	4.769
Tablet Bilgisayar	1.540	1.610	1.529
Cep Bilgisayar	73	201	247

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-23 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2013-2015)

	2015 Yılı	2016 Yılı	2017 Yılı
Projeksiyon	1.857	1.902	1.922
Slayt Makinesi	45	0	0
Tepegöz	388	312	277
Barkot Okuyucu	143	146	139
Yazıcı	5.411	5.287	5.553
Baskı Makinesi	20	32	31
Fotokopi Makinesi	278	260	252
Faks	169	154	139
Fotoğraf Makinesi	364	392	405
Kameralar	2.045	2.240	2.002
Televizyonlar	2.664	2.643	2.678
Tarayıcılar	645	641	653
Müzik Setleri	461	443	433
Mikroskoplar	2.640	2.555	2.550
DVD'ler	143	185	207
Akıllı Tahta	1.223	1.341	1.397

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Birim Faaliyet Raporları

2017 yılında birimlerden gelen kitap talepleri doğrudan temin ve ihale yöntemiyle alınmış olup, 2.917 Türkçe, 1.521 yabancı dilde olmak üzere toplam 4.438 adet kitap alınmıştır. Ayrıca e-kitap olarak 274.353 adet kitap sağlanmıştır. Toplam sağlanan kaynak sayısı 278.791'dir. Bunların dağılımı Tablo 24'te gösterilmiştir.

Tablo-24 Kütüphane Kaynakları

	2017 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	4.438	274.353	278.791	821.435	340.521	1.161.956
Dergi Aboneliği Sayısı	0	0	0	10.850	13.100	23.950
Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı*	200	189	357	200	189	357
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	0	3	3	0	97	97
Yazma Eser	0	0	0	17.000	0	17.000
Toplam	4.638	274.545	279.151	849.485	353.907	1.203.360

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

* 32 adet dergi basılı + elektronik dergi olarak abone olunmuştur.

Tablo-25 Alınan Kitapların Birimler İtibari İle Dağılımı

Birimler	Türkçe	Yabancı Dil	Toplam
Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)	-	79	79,00
Beypazarı Meslek Yüksekokulu	-	6	6
Diş Hekimliği Fakültesi	3	18	21
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi	21	100	121
Eczacılık Fakültesi	30	82	112
Eğitim Bilimleri Fakültesi	287	22	309
Fen Fakültesi	10	137	147
Güzel Sanatlar Fakültesi	52	115	167
Hukuk Fakültesi	185	140	325
İlahiyat Fakültesi	749	-	749
İletişim Fakültesi	10	21	31
Mühendislik Fakültesi	-	111	111
Sağlık Bilimleri Fakültesi	274	388	662
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	-	8	8
Siyasal Bilgiler Fakültesi	761	66	827
Spor Bilimleri Fakültesi	-	3	3
Tıp Fakültesi	153	36	189
Tıp Fakültesi 14 Mart (Cebeci)	271	-	271
Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)	26	8	34
Veteriner Fakültesi	29	88	117
Yabancı Diller Yüksekokulu	3	-	3
Ziraat Fakültesi	53	93	146
Elektronik Kitap	-	274.353	274353
Toplam	2.917	275.874	278.791

Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

4.2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2017 Yılı Yatırımları

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Sağlık	2017I000090	Muhtelif İşler	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında büyük onarımının yapılması ve hastanelerin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında 24 Adet büyük bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir ve muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları ödenekler sınırında karşılanmıştır.
Sağlık	2011I000130	İbn-İ Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	Yapım İşine İlişkin Etüt Projelerin tamamlanarak ihale edilmesi planlanmıştır.	Yapım işi ihale edilememiştir.
Sağlık	2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatına devam edilmesi planlanmıştır.	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatın devam etmektedir.
Eğitim	2017H032390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Bağlıca Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Etüt ve Proje Hizmet Alımı İşi ile Muhtelif Etüt Projelerin yapılması planlanmıştır.	9 Adet Etüt Proje Hizmeti Alınmıştır. Bağlıca Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Etüt ve Proje Hizmet Alımı İşinin bir bölümüne ait projeler alınmış olup, iş devam etmektedir.
Eğitim	1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	Didim Uluslararası Gençlik Merkezi olmak üzere Biyoteknoloji Enstitüsü Binası ile Ziraat kazan dairesi ve ahır binası ile Cebeci kantin binası ile birlikte 5 adet yeni bina yapımı planlanmıştır.	Didim Uluslararası Gençlik Merkezi olmak üzere Biyoteknoloji Enstitüsü Binası ile Ziraat kazan dairesi ve ahır binası ile Cebeci kantin binası ile birlikte 5 adet yeni bina yapılmıştır.
Eğitim	2013H030660	Büyük Onarım Projesi	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında büyük onarımlarının yapılması planlanmıştır.	Proje kapsamında 84 Adet Bakım Onarım İşi Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi için kullanılacak sistemlerin yedek parçalarının alınması, gerekli sunucu, veri depolama ünitesi, veri güvenliği ve erişim güvenliği için gerekli cihazlar ve yüksek özellikli tarayıcıların alınması, gerekli yazılım ve lisanslarının satın alınması.	Proje kapsamında mevcut ödenek kısı altında bilgi yönetim sistemi için gerekli olan alımlar gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2017H032400	Muhtelif İşler	Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tablet Bilgisayar, Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazları ile Muhtelif Demirbaşların ve Makine Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2017H032410	Yayın Alımı	Üniversitemiz kütüphane basılı, elektronik, süreli yayın alımı ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje kapsamında mevcut ödenekleri çerçevesinde süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliği ve kitap alımları gerçekleştirilmiştir.

Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2017 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Kültür	2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	Kültür varlığı olarak tescilli binalarımızın ihtiyaç duyulan restorasyon, restitüsyon projelerinin yapılması planlanmıştır.	Tandoğan Kampüsünde Yer Alan Tescilli, Binalarımızın Etüd Proje Hizmeti Alınmıştır.
Kültür	2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında restorasyonlarının yapılması planlanmıştır.	Ziraat Fakültesi Tescilli Yemler ve Hayvan Besleme binası Restorasyon ve Hukuk Fakültesi Isı Merkezi Galerî Hattı, Yıldırım Beyazıt Yurdu Onarımı ile Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Binalarının Restorasyonları yapıldı.
Beden Eğitimi ve Spor	2014H050120	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	Gölbaşı Yerleşkesi Spor Tesisi Yapılması ile Muhtelif Spor Sahalarının Onarımlarının yapılması planlanmıştır.	Gölbaşı Yerleşkesi Spor Tesisi İhalesi yapılmıştır. Zorunlu olan 4 adet Açık Spor Tesislerinin Onarımı yapılmıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı Ve İleri Arş. Lab.	Viral Zoonozlar Laboratuvarının Yapılandırılması planlanmıştır.	Proje kapsamında laboratuvar için makine-teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Merkez Laboratuvarının Çalışmalarına Katkı Sağlayacak Gerekli Alımların Yapılması, insan gücü ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje Kapsamında İhtiyaç Olan hizmet ve mal alımları gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan personel ücreti ödemeleri ile yurt içi ve yurtdışı kongre görevlendirmeleri de proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Diğer Taraftan Proje Kapsamında Çalışmaları Yürütmek Üzere Personel Çalıştırılmaktadır. Özellikle son 4 yıldır projeye tahsis edilen ödenekler altyapı geliştirme çalışmalarında yetersiz kalmaktadır. Bütçe artırım talepleri ve ek personel talepleri Kalkınma Bakanlığına iletilmekte ve imkanlar ölçüsünde bir kısım talepler karşılanmaktadır. Projede çalışan personel sayısının en azından 7'ye yükseltilmesinin projeye büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	Helyum soğutma sisteminin işleme alınması, enjektör sisteminin işleme alınması, süperiletken hızlandırıcı modüllerinin kabul testlerinin tamamlanması, kurulumu başlayan temiz oda sisteminin tamamlanması, pompa-sonda deney oda sisteminin kurulması planlanmıştır.	Helyum soğutma sistemi kısmen işletimdedir. Elektrik altyapısının tamamlanmasının ardından tamamen işleme alınacaktır. Temiz oda sisteminin ihalesi yapılmış ve kurulumuna başlanmıştır. Radyasyon zırhlı kapılarının kurulumu tamamlanmıştır. Radyoaktif hava atım sistemi (baca ile birlikte) tamamlanmıştır. Radyoaktif bölge su soğutma sistemi tamamlanmıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi	Mineral Seperasyon Sistemi, XRF ve LA-ICP-MS alımı yapılması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleşmiş olup; Mineral Seperasyon Sistemi, XRF ve LA-ICP-MS alınmıştır.

Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2017 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2016K120160	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	Ekspande edilen kordon kanlarının etkinliğinin ve güvenilirliğinin hayvan deneylerinde test edilmesi hedeflenmektedir.	Kordon kanı bankası laboratuvar tadilatı ve insan kordon kanı kök hücre ekspansiyon sistemi cihazı alımı ile hayvan deneylerinin yapılacağı laboratuvar hazırlıkları başlamıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	Kök hücre alanında, klinik uygulamalar ve araştırma çalışmalarında eksikliği doldurmak amaçlanmaktadır.	Klinik uygulamalar alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2017 hedefine ulaşılmıştır. Araştırma hedefine de alt yapısının 2018 ulaşılacağı beklenmektedir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	Kök Hücre Araştırma Merkezinin yapımına başlanması planlanmaktadır.	Yatırım programında Kalkınma Bakanlığı tarafından revize proje dokümanı onaylanmadan harcama yapılamayacağına dair dipnot olması sebebi ile projeye başlanamamıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K120770	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	PT MR alımının yapılması planlanmaktadır.	2017 yılında ihale tamamlanamamış olup; 2018 Ocak itibari ile sonuçlandırılabilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K120160	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Tahsis edilen ödenek ile Üniversitemizde yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.	2017 yılında Üniversitemizde 596 adet Bilimsel Araştırma Projesi için özel hesaptan harcama yapılmıştır.

5. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. 2017 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 3 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için 65.734.000,00 TL hazine yardımı ve 5.000.000,00 TL döner sermaye karşılığı olmak üzere toplam 70.734.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 337.000,00 TL likit karşılığı ödenek kayıtları ve 10.500.000,00 TL tutarında Maliye Bakanlığı yatırım hızlandırma ödeneğinden aktarma ile sektör desteklenmiş ve toplam proje tutarı 81.571.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı, Hastanelerin büyük bakım onarımları ve makine teçhizat alımları kapsamında toplam 57.626.536,49 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Kalan ödeneğinde 17.108.666,23 TL'si Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatında kullanılmak üzere 5018 sayılı Kanununun 35 inci maddesi kapsamında taahhüt artığı olarak bir sonraki yıla devretmiştir.

Tablo-27 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2014	18.000	24.392	14.324
2015	26.000	33.242	14.466
2016	39.500	40.542	34.887
2017	70.734	81.571	57.627

Grafik-6 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

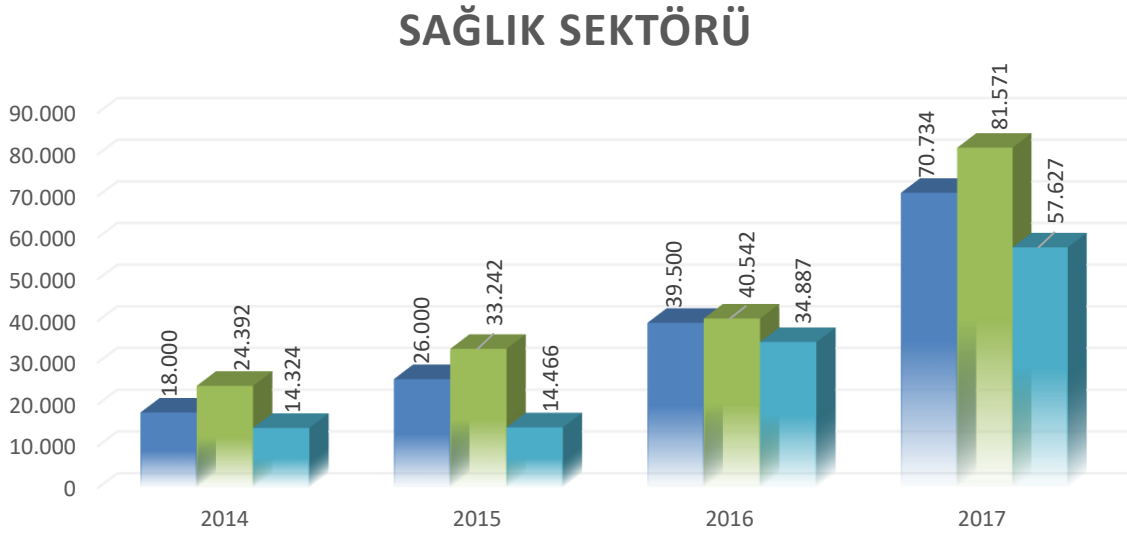


2017 yılında 2 adedi kültür sektöründe ve 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 9 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam 57.500.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılı başlangıç ödeneğinde bir önceki seneye göre %17,3 oranında önemli bir artış olduğu görülmektedir.

Yıl içerisinde 580.560,00 TL taahhüt artığı karşılığı ve 3.260.000,00 likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş ve revize ödenek toplamı 61.340.560,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Restorasyon İşinin yapıldığı ve Didim Uluslar arası Gençlik Merkezi Binası ile Biyoteknoloji Enstitüsü İnşaatı işlerine yıllara sari olarak devam edildiği görülmektedir.

Tablo-28 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2014	31.505	32.777	31.340
2015	38.209	51.096	46.523
2016	49.000	60.174	55.410
2017	57.500	61.541	58.446

Grafik-7 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

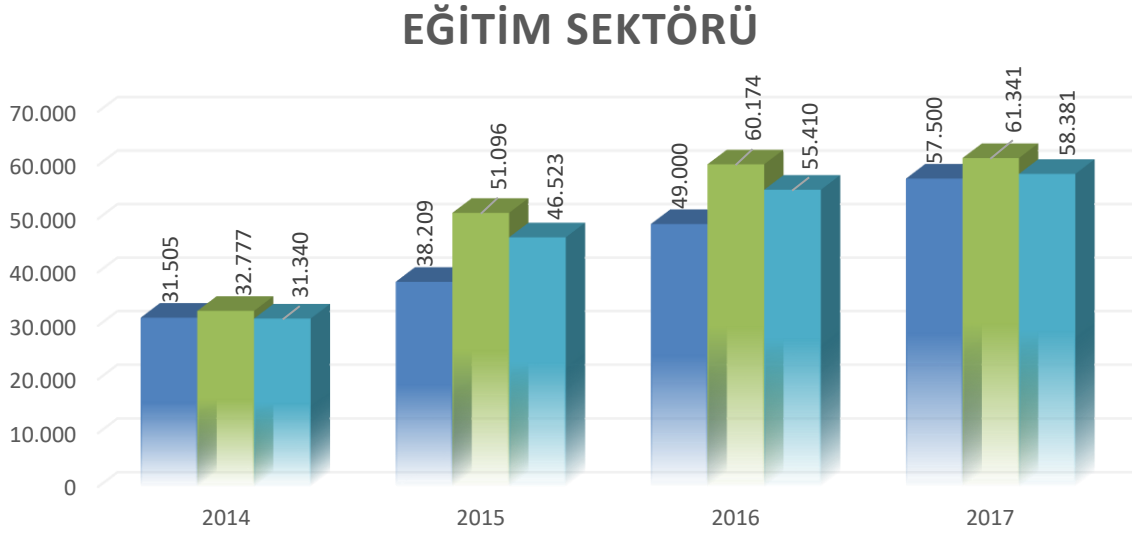


2017 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 8 adet proje için toplam 49.820.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca yılı içerisinde Kolorektal Kanseri için Erken Tanı Araştırma Projesi yatırım programına dahil edilmiş ve ilgili projeye yatırımları hızlandırma ödeneğinden 13.930.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Bilindiği üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-29 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2014	15.370	17.886	17.886
2015	28.010	37.934	37.934
2016	51.655	74.084	74.084
2017	49.820	80.501	80.501

Grafik-8 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

(DKH) SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ

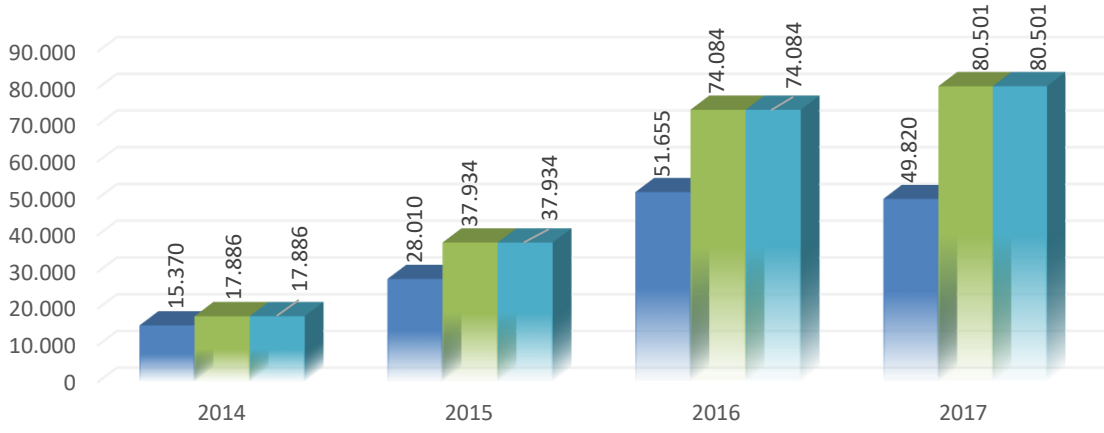

Tablo-30 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Sonu Kümülatif Harcama	2017 Program Ödenęi	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2017 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Lab.	8.657	8.357	300			300	176	8.533
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	16.960	16.660	300			300	226	16.886
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	197.000	125.288	37.160			37.160	35.187	160.475
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk.	10.980	10.430	550			550	1.148	11.578
2016K120160	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hüresel Ürün Geliştirme Altyapısı	3.216	1.726	500			500	2.016	3.742
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	18.224	15.018	1.000			1.000	507	15.525
2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	30.000	0	1.000	5.000		6.000	0	0
2017K120770	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	28.648	0	0	15.130		15.130	0	0
KB Destekli Projeler Toplamı		313.685	177.479	40.810	20.130	0	60.940	39.260	216.739
2017K120160	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri*	9.010	0	9.010	10.540		19.550	18.615	18.615
GENEL TOPLAM		322.695	177.479	49.820	30.670	0	80.490	57.875	235.354

(1) Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücülerini tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır.

(2) Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.

2017 yılı yatırım programında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe biri yıl içerisinde dahil edilmiş olmak üzere toplam 9 adet proje için 40.810.000,00 TL hazine yardımı ve 9.010.000,00 TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 49.820.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 30.669.768,09 TL ekleme işlemi ile toplam ödenek 80.489.768,09 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin tamamı özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 18.615.124,37 TL harcanmıştır.

Tablo-31 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Sonu Kümülatif Harcama	2017 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2017 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	15.000	7.045	3.500			3.500	3.487	10.532
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	158.000	113.156	10.000	1.560		11.560	10.112	123.268
2017H032390	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	500	0	500	581		1.081	946	946
2013H030660	Büyük Onarım	96.000	76.025	17.000	700		17.700	16.956	92.981
2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç.	10.000	0	1.000		1.000	0	0	0
2017I000090	Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	23.000	0	23.000	1.300		24.300	19.297	19.297
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	57.378	16.343	30.000			30.000	12.891	29.234
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2.500	412	1.000			1.000	564	976
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	28.000	14.070	10.500			10.500	10.374	24.444
TOPLAM		390.378	227.051	96.500	4.141	1.000	99.641	74.627	301.678

(1) 5.000 (bin tl) döner sermaye toplama dahil edilmiştir.

Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 6 adet, sağlık sektöründe 3 adet olmak üzere, toplam 9 adet proje için 2017 yılı programında toplam 96.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından etüt, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği 99.640.560,00 TL olmuştur. Ödeneğin 74.627.414,67 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %74,9'dur.

Tablo-32 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 YTL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Sonu Kümülatif Harcama	2017 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2017 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2017H032400	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim)	4.866	0	4.866	200	450	4.616	4.438	4.438
2017H032410	Yayın Alımı	5.000	0	5.000	1.000		6.000	5.992	5.992
2017H032400	Muhtelif İşler (Bil.Teknoloj.)	1.134	0	1.134			1.134	1.130	1.130
2017I000090	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Sağlık)	16.734	0	16.734	10.537		27.271	25.438	25.438
2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	21.000	3.216	4.000	450		4.450	4.446	7.662
TOPLAM		48.734	3.216	31.734	12.187	450	43.471	41.444	44.660

(1) 200 (bin tl) döner sermaye eklemesi ve 64 (bin tl) harcaması toplama dahil edilmiştir.

Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan 4 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 1 adet olmak üzere toplam 5 adet proje için 2017 yılı programında 31.734.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ve döner sermayeden yapılan ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından makine-teçhizat, yayım alımı ve bilgi teknolojileri projelerinin toplam ödeneği 43.471.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 41.444.714,66 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %95,8'dir.

Tablo-33 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)

Açıklama	Proje Tutarı	2016 Sonu Kümülatif Harcama	2017 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2017 Yılı Harcama	Toplam Harcama
Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler*	322.695	177.479	49.820	30.670	0	80.490	57.875	235.354
Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım	390.378	227.051	96.500	3.141	0	99.641	74.627	301.678
Makine Teçhizat	21.600	0	21.600	10.737	450	31.887	29.876	29.876
Yayın Alımı	5.000	0	5.000	1.000	0	6.000	5.992	5.992
Bilgi Teknolojileri	22.134	0	5.134	450	0	5.584	5.576	5.576
GENEL TOPLAM	761.807	404.530	178.054	45.998	450	223.602	173.946	578.476

**Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır. Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.*

Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2017 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için 178.054.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 223.601.328,09 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 80.489.768,09 TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2016 yılından devreden tutar ve 2017 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde projeler ihtiyacına 3.597.000,00 TL ve Kalkınma Ajansı destekli projenin tamamlanabilmesi için sözleşme kapsamında 11.730,00 TL olmak üzere toplam 3.608.730,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Ayrıca taahhüt artığı karşılığı olarak toplam 580.560,00 TL ve Bilimsel Araştırma Projeleri ihtiyacına da gelir fazlası karşılığı toplam 10.739.768,09 TL ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında toplamda; 30.430.000,00 TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2017 yılı yatırım programında Kalkınma Bakanlığı tarafından biri yılı içerisinde dahil edilmiş olmakla birlikte toplam 21 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 58.445.592,84 TL, sağlık sektöründeki projeler için 57.626.536,49 TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 80.489.768,09 TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 196.561.897,47 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo-34 2017 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	EKLENEN					DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
		LİKİT	TAAHÜT ARTIĞI	GELİR FAZLASI	AKTARMA	YEDEK ÖDENEK			
06.1 Mamul Mal Alımları	69.794.000	1.048.730		10.011.814		24.430.000	450.000	104.834.544	102.944.517
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	3.760.000			981.954		1.000.000		5.741.954	5.741.954
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	4.400.000				196.000			4.596.000	4.595.423
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	43.500.000	1.560.000	580.560		500.000	5.000.000		51.140.560	32.436.461
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	500.000							500.000	499.999
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	49.300.000	1.000.000					500.000	49.800.000	48.490.953
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	1.800.000							1.800.000	1.800.000
TOPLAM	173.054.000	3.608.730	580.560	10.993.768	696.000	30.430.000	950.000	218.413.058	196.509.308

b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı

finansman programları daha çok Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.

2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarımı Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda mali bir baskı yaratmaktadır.
6. Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Kalkınma Bakanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır.

6. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-35 Sağlık Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2014I000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	2014-2019	Hastane İnşaatı (35.758 m2), Makine-Teçhizat	30.000.000	30.000.000	12.891.334	Yeni Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi yapım işi inşaat işine devam edilmektedir. Yılı ödeneğinin 12.891.333,77 TL'si harcanmış olup; kalan 17.108.666,23 TL ödenek taahhüt artışı olarak ertesi yıla devretmiştir.
2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	2011-2018	Büyük Onarım	1.000.000	0	0	Ön çalışmalarda deprem güçlendirme çalışmalarının oldukça yüksek maliyette olması ancak bütçe ve döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeni ile işe başlanılamamıştır.
2012I000160	Muhtelif İşler	2017-2018	Makine ve Teçhizat- Bakım Onarım-Taşıtlar (T-15)	39.734.000	51.571.000	44.735.203	Proje kapsamında 24 adet büyük bakım onarım işleri yapılmıştır. Diğer taraftan hastanelerin muhtelif makine-teçhizat ihtiyaçları proje kapsamında karşılanmıştır. Yıl içerisinde Maliye Bakanlığı yatırımları hızlandırma ödeneği kapsamında projeye 10.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; kaynak tahsis amacına uygun şekilde kullanılmıştır.

Tablo-36 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti	
2017I000090	Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)	A.Ü. Kalp Merkezi Binası Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Tadilat İşi	Açık İhale	Kaptan İnşaat	1.250.966	
		A.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Büyük Onarım İşi	Açık İhale	Aydın İnşaat	1.527.083	
		A.Ü.İbni Sina Hastanesi Isı Merkezi Yapım İşi	Açık İhale	Koçoğlu İnşaat	12.826.444	
		A.Ü.İbni Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi Mevcut Yoğun Bakım Ünitesi Ve Reanimasyon Merkezi Yeni Yoğun Bakım Ünitesi Onarımlarının Yapılması İşi	Açık İhale	Akif Mühendislik	619.677	
		A.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Binası 2.Bodrum Kat Tadilatı Sterilizasyon Ve Yangın Merdiveni Yapım İşi.	Açık İhale	Kaptan İnşaat	1.655.481	
		A.Ü. Tıp Fak. Cebeci Yerleşkesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D Tadilat İşi.	Doğrudan Temin	Gülcan SAYIN	67.260	
		A.Ü. Tıp Fakültesi Yerleşkesi Şehitlik-12 Trafosu Ana Şalter Yenileme İşi	Doğrudan Temin	HASDAL ELEKTRİK	14.160	
		A.Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Isıtma Tesisatı Proje Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	Mesen Mühendislik	55.460	
		A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Başhekimlik Hizmet Binası Çevre Korkulukları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Lütfü Möble	67.260	
		A.Ü. Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Yemekhane Asansörü Revizyon İşi	Doğrudan Temin	Logo Asansör	55.460	
		A.Ü. Dış Hekimliği Fakültesi 2017 Yılı 3 Adet Asansörün Yeşil Etiketinin Alınması İçin Eksikliklerinin Tamamlanması İşi	Doğrudan Temin	İbrahim Aydın	20.650	
		A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Eski Sosyal Pediatri Binası Tadilat İşi	Doğrudan Temin	Gülcan SAYIN	56.829	
		A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Atık Deposu Yapım İşi	Doğrudan Temin	Lütfü Möble	66.080	
		A.Ü. Dış Hekimliği Fakültesi 2 Nolu Amfi Ve 5-6 Nolu Dersliklerde Bakım-Onarım Ve Tadilat İşi	Doğrudan Temin	Lütfü Möble	66.080	
		A.Ü. İbn-i Sina Hastanesi B Blok Yangın Merdiveni Yapılması	Açık İhale	Serkan KARADAĞ	239.023	
		SAYFA TOPLAMI				18.587.911

Tablo-36 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					18.587.911
2017I000090	Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)	A.Ü. Kök Hücre Enstitüsü Tadilatı İşİ	Açık İhale	Alev UÇAN	132.583
		A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Nüklül Tıp A.B.D. Rapor Odası Düzenlenmesi	Doğrudan Temin	Gülüstan Ayluştırhan	67.260
		A.Ü. Kalp Merkezi Binası Kroner Yoğun Bakım Ameliyathane Katlarına Ait Mimari Elektirik Ve Tesisat Projelerin Hazırlanması	Doğrudan Temin	Altuğ Mimarlık	61.537
		A.Ü. Mekanik Tesisat İşleri Teknik Danışmanlık	Doğrudan Temin	Onur TUGA	38.232
		A.Ü. Elektrik Tesisat İşleri Teknik Danışmanlık	Doğrudan Temin	Ovacık Mühendislik	38.232
		A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Ruh Sağlığı Hastanesi A.B.D. İkmal İşİ	Doğrudan Temin	Kaptan İnşaat	61.360
		A.Ü. İbn-i Sina Hastanesi Cephe Kaplaması Sökülme Ve Yapımı	Doğrudan Temin	Serkan KARADAĞ	68.440
		A.Ü. Çocuk Hastanesi Radyoloji Bölümü Alt Yapı İyileştirme İşİ	Doğrudan Temin	Sezai ELİAÇIK	17.700
		A.Ü. Çocuk Hastanesi Soğutma Grubu İşİ	Doğrudan Temin	ÜNTEŞ	152.810
		A.Ü. Tıp Fakültesi Gastro Binası İnşaatı	Doğrudan Temin	Hasan Harman	68.322
		Tıp Fakültesi Gastro Binası İnşaatı	Açık İhale	Dönmez İnşaat	2.451
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-37 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı	Açık İhale	Arslanlar İnşaat	12.891.334
TOPLAM					12.891.334

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-38 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
20171000090	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	Acil Tıp ABD(1 Adet Dijital Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı)	Açık İhale	Esaote Tic.Ltd.Şti.	156.492
		Anesteziyoloji ve Re-animasyon ABD(1 Adet Hasta Başı Monitör)	Doğrudan Temin	Philips Tic.A.Ş.	45.900
		Cebeci Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yuğun Bakım ABD.(2 Adet Non-İnvaziv Hasta Monitörü)	Açık İhale	Alpaslan ÇALIŞKAN A.Ş.	121.932
		Cebeci El Cerrahisi Setleri	Doğrudan Temin	B.Braun Med. Ltd.Şti.	62.856
		Cebeci Genel Cerrahi ABD(1 Adet Video Kolonoskop Cihazı)	Doğrudan Temin	Kuzey Büro Malz.Ltd.Şti.	39.960
		Cebeci Hastaneleri(4 Kalem Ameliyathane Malzeme Seti Dolapları(çelik))	DMO	DMO	64.830
		Cebeci Hastanesi Ameliyathanesi(12 Adet İş İstasyonu)	Açık İhale	Draeger Medikal Ltd.Şti.	2.246.409
		Cebeci Kalp ve Damar Cerrahi ABD(1 Adet Laringoskop Sistemi)	Açık İhale	Gentek Medikal Ltd.Şti.	55.620
		Cebeci Ortopedi Seti	Doğrudan Temin	B.Braun Med. Ltd.Şti.	62.424
		Cebeci Ortopedi Seti	Doğrudan Temin	B.Braun Med. Ltd.Şti.	63.180
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(1 Adet Hidrojenperosit)	DMO	DMO	108.545
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(10 Adet Anestezi Arabası)	DMO	DMO	35.942
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(10 Adet Defibrilatör)	DMO	DMO	306.121
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(10 Adet EKG)	DMO	DMO	136.649
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(10 Adet Hastabaşı Monitörü)	DMO	DMO	48.490
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(10 Adet Kemo Terapi Koltuğu)	DMO	DMO	35.575
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(10 Adet Kirli Temiz Çamaşır Arabası)	DMO	DMO	4.491
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(1000 Adet Yastık)	DMO	DMO	11.005
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(12 Adet Aydınlatma Sistemi)	Açık İhale	Gentek Medikal Ltd.Şti.	1.264.896
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(13 Adet Sedyeler)	DMO	DMO	45.792
SAYFA TOPLAMI				4.917.109	

Tablo-38 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					4.917.109
2017I000090	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(130 Adet Serum Askısı)	DMO	DMO	22.949
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(97 Adet Hasta Yemek Masası)	DMO	DMO	22.968
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(150 Adet Refakatçı Koltuğu)	DMO	DMO	71.601
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(18 Adet Pansuman Arabası)	DMO	DMO	35.621
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(2 Adet Transfer Sedyesi)	DMO	DMO	10.101
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(20 Adet Kirli Temiz Çamaşır Arabası)	DMO	DMO	24.091
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(2000 Adet Nevresim Takımı)	DMO	DMO	104.285
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(24 Adet Acil Arabası)	DMO	DMO	71.854
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(4 Adet Seyyar Röntgen Cihazı)	Açık İhale	Dinamik Röntgen Ltd.Şti.	285.120
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(5 Adet Kan Alma Koltuğu)	DMO	DMO	41.618
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(5 Adet Sedye)	DMO	DMO	23.725
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(6 Adet Muayene Masası)	DMO	DMO	2.508
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(600 Adet Yatak Alezi)	DMO	DMO	8.780
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri(7 Adet Kan Alma Koltuğu)	DMO	DMO	15.075
		Cebeci-İbni Sina Hastaneleri (Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemi ve Anons Sistemi)	Açık İhale	Medikal Plus Ltd.Şti.	156.326
		Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.(2 Adet Portable Kapnograf Cihazı)	Doğrudan Temin	Tus Tıbbi Malz.Ltd.Şti.	15.120
		Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Neonatoloji Bilim Dalı Başkanlığı(2 Adet Üst Düzey Yoğun Bakım Ventilatorü)	Açık İhale	Mes Tıbbi Malz.Tic.Ltd.Şti.	207.360
		Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım ABD.(1 Adet Fileksible Video Entübasyon Seti)	Açık İhale	Gentek Medikal Tic.Ltd.Şti.	106.596
		Göğüs Hastalıkları ABD. 3. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi(2 Adet Basınç Destek Ventilatorü)	Açık İhale	Respitek Medikal Ltd.Şti.	126.360
		Göz Hastalıkları ABD(1 Adet Mikropulse Transskleral Siklofotokoagülasyon Diyet Laser Cihazı)	Açık İhale	Medelsis Medikal	172.692
SAYFA TOPLAMI					6.441.858

Tablo-38 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	
DEVİR TOPLAMI					6.441.858
2017I000090	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	İbni Sina Hastanesi Acil ABD(1 Adet Tek Dedektörlü Dijital Radyografik Görüntüleme Sistemi)	Açık İhale	US X-Ray Röntgen Ltd.Şti.	432.000
		İbnisine Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD(1 Adet Yüksek Devirli Drill Sistemi)	Doğrudan Temin	Medel Tıp Med.Ürn.Ltd.Şti.	52.920
		İbnisine Genel Ameliyathanesi KBB(1 Adet Operasyon Laringoskop Seti)	Doğrudan Temin	Gentek Medikal	55.529
		İbnisine Hastanesi ABD, Cebeci Hastanesi Başhekimliği ve Çocuk Radyolojisi (5 Adet Renkli Dijital Dopplerli Ultrasonografi Sistemi)	Açık İhale	Penta Görüntüleme Ltd.Şti.	1.330.560
		İbnisine Genel Anestezi Ameliyathanesi(2 Adet Aydınlatma Sistemi-İş Artışı)	Açık İhale	Gentek Medikal	210.816
		İbnisine Hastanesi Radyoloji ABD.(1 Adet Renkli Dijital Dopplerli Ultrasonografi Sistemi-İş Artışı)	Açık İhale	Penta Görüntüleme Ltd.Şti.	266.112
		İbnisine Nefroloji ABD(2 Adet Hemodiyaliz Cihazı)	Doğrudan Temin	B.Braun Med. Ltd.Şti.	62.910
		Kadın Hastalıkları Doğum ABD(10 Adet Elektrokoter Cihazı)	Açık İhale	Metronic Medikal Ltd.Şti.	177.660
		Kadın Hastalıkları Doğum Ameliyathanesi(1 Adet Çift Başlıklı Ameliyat Tavan Lambası)	Doğrudan Temin	San-Med Medikal Ltd.Şti.	67.496
		Kalp Damar Cerrahi ABD(1 Adet Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı Tip2)	Açık İhale	Penta Görüntüleme Ltd.Şti.	210.600
		Kalp Merkezi(1Adet Efor Cihazı)	Açık İhale	Kardinero Medikal Ltd.Şti.	45.792
		Kardiyoloji ABD Yoğun Bakım(1 Adet İntra-Aortik Balon Pompası)	Açık İhale	Maquet Tıbbi Sist.Ltd.Şti.	159.840
		Kulak Burun Boğaz ABD. A Blok Müdahale Odası(1 Adet Kompakt Endevizyon Sistemi)	Açık İhale	Gentek Medikal	75.384
		Ortopedi El Cerrahisi ABD.(1 Adet Üst Düzey Mikrocerrahi Ameliyat Mikroskobu)	Açık İhale	Carl-Zeiss	377.190
		Pediyatrik Kardiyoloji ABD.(1 Adet Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı Tip1)	Açık İhale	Penta Görün. Ltd.Şti.	161.568
		Radyoloji ABD.(1 Adet Çok Kesitli 64 Sıra Dedektörlü Bilgisayarlı Tomografi Cihazı)	Açık İhale	Toshiba Med.Ltd.Şti.	2.185.920
		Tıp Fakültesi(1 Adet Doppler Ultrasonografi)	Açık İhale	Penta Görüntüleme Ltd.Şti.	139.951
		Tıp Fakültesi(1 Adet Tartılı Hasta Yatağı)	DMO	DMO	8.402
		Tıp Fakültesi(10 Adet Çamaşır Arabası)	DMO	DMO	14.079
		1 Adet Tartılı Hasta Yatağı	DMO	DMO	4.198
10 Adet Çamaşır Arabası	DMO	DMO	10.771		
10 Adet Hasta Muayene Sedyesi	DMO	DMO	40.455		
SAYFA TOPLAMI					12.532.010

Tablo-38 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					12.532.010
20171000090	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	Tıp Fakültesi(10 Adet Tekerlekli Sandalye)	DMO	DMO	1.943
		Tıp Fakültesi(10 Adet Üç Motorlu Hasta Yatağı)	DMO	DMO	1.560
		Tıp Fakültesi(100 Adet Lastikli Çarşaf)	DMO	DMO	80.228
		Tıp Fakültesi(100 Adet Sedye Alezi)	DMO	DMO	207.552
		Tıp Fakültesi(105 Adet Refakatçi Koltuğu)	DMO	DMO	3.644
		Tıp Fakültesi(10.600 Boyalı Çarşaf)	DMO	DMO	74.669
		Tıp Fakültesi(12 Adet Hasta Komidini)	DMO	DMO	13.500
		Tıp Fakültesi(1250 Adet Nevresim Takımı-Beyaz)	DMO	DMO	17.842
		Tıp Fakültesi(14 Adet Tekerlekli Sandalye)	DMO	DMO	5.076
		Tıp Fakültesi(18 Adet Led Tv)	DMO	DMO	5.192
		Tıp Fakültesi(2 Adet 139 Ekran Led Tv, 2 Adet Endoskopi Dolabı, 2 adet ilaç Dolabı)	DMO	DMO	5.711
		Tıp Fakültesi(2 Adet Renkli Doppler Ultrasonografi)	Açık İhale	Penta Görüntüleme Ltd.Şti.	323.349
		Tıp Fakültesi(20.000 Adet İndantren Boyalı Çarşaf)	DMO	DMO	380.376
		Tıp Fakültesi(200 Adet Pike)	DMO	DMO	11.694
		Tıp Fakültesi(200 Adet Pike)	DMO	DMO	12.545
		Tıp Fakültesi(200 Adet Yastık Alezi)	DMO	DMO	1.138
		Tıp Fakültesi(3 Adet 80 Ekran Led TV)	DMO	DMO	3.056
		Tıp Fakültesi(3 Adet Buzdolabı)	DMO	DMO	2.925
		Tıp Fakültesi(3 Adet Hasta Taşıma Sedyesi)	DMO	DMO	14.330
		Tıp Fakültesi(3 Adet Pansuman Arabası)	DMO	DMO	7.024
		Tıp Fakültesi(30 Adet Yemek Masası)	DMO	DMO	8.079
		Tıp Fakültesi(300 Adet Stor Perde)	DMO	DMO	14.658
		Tıp Fakültesi(300 Adet Stor Perde)	DMO	DMO	22.453
		Tıp Fakültesi(35 Adet 32 Led Tv)	DMO	DMO	35.505
		Tıp Fakültesi(35 Adet Üç Motorlu Hasta Bakım Yatağı)	DMO	DMO	139.414
		Tıp Fakültesi(36 Adet Bekleme Koltuğu)	DMO	DMO	16.467
Tıp Fakültesi(38 Adet Üç Motorlu Hasta Yatağı)	DMO	DMO	119.799		
Tıp Fakültesi(4 Adet Acil Arabası)	DMO	DMO	12.592		
SAYFA TOPLAMI					14.074.331

Tablo-38 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					14.074.331
		Tıp Fakültesi(4 Adet Acil Müdahale Sedyesi)	DMO	DMO	21.011
		Tıp Fakültesi(4 Adet EKG)	DMO	DMO	25.357
		Tıp Fakültesi(4 Adet Hasta Başı Monitör)	DMO	DMO	23.147
		Tıp Fakültesi(4 Adet Hasta Taşıma Sedyesi)	DMO	DMO	12.433
		Tıp Fakültesi(4 Adet Pansuman Arabası)	DMO	DMO	10.833
		Tıp Fakültesi(40 Adet Çelik Raf)	DMO	DMO	11.118
		Tıp Fakültesi(5 Adet Led Tv)	DMO	DMO	3.115
		Tıp Fakültesi(5 Adet Pansuman Arabası)	DMO	DMO	11.294
		Tıp Fakültesi(50 Adet Büro Tipi Buzdolabı)	DMO	DMO	23.482
		Tıp Fakültesi(50 Adet Hasta Taşıma Sandalyesi)	DMO	DMO	45.801
		Tıp Fakültesi(50 Adet Sünger Yatak)	DMO	DMO	11.355
		Tıp Fakültesi(500 Adet Yastık Kılıfı)	DMO	DMO	2.295
		Tıp Fakültesi(7 Adet 102 Ekran Tv)	DMO	DMO	9.545
		Tıp Fakültesi(7 Adet Acil Müdahale Arabası)	DMO	DMO	22.036
		Tıp Fakültesi(70 Adet Portatif Çelik Raf)	DMO	DMO	19.456
		Tıp Fakültesi(72 Adet Mini Buzdolabı)	DMO	DMO	27.952
		Tıp Fakültesi(80 Adet 22 Led Tv)	DMO	DMO	56.300
		Tıp Fakültesi(800 Adet Yastık)	DMO	DMO	9.971
		Tıp Fakültesi(85 Adet Serum Askısı)	DMO	DMO	15.522
		Tıp Fakültesi(9 Adet Sedye)	DMO	DMO	28.999
		Diş Hekimliği Fakültesi (9 Kalem Cihaz)	Doğrudan Temin	Beraydent Diş Deposu Ltd.Şti.	61.772
		Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı(1 Adet Multi Imaging 3D ve Infrared (ICG) HD Görüntüleme Sistemi)	Açık İhale	Anadolu Mega Ltd.Şti.	972.000
		Genel Cerrahi Anabilim Dalı(1 Adet İleri Düzey Full HD Laparoskopik Endoskopik Görüntüleme Sistemi)	Açık İhale	Anadolu Mega Ltd.Şti.	398.520
		Beyin ve Sinir Hastalıkları İleri Araştırma Tedavi Merz.(1 Adet Özel Nöroşirurji Ameliyat Mikroskobu)	Açık İhale	Carl-Zeiss	1.981.800
		Beyin ve Sinir Hastalıkları İleri Araştırma Tedavi Merz.(1 Adet Nöronsuit Sistemi)	Açık İhale	V.O.SS Varinak Onkoloji	7.558.920
TOPLAM					25.438.365

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-39 Eğitim Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	2014-2018	Bakım Onarım, Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (1 adet), Sen.At.Pis.Fut.Sa.(1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)	3.500.000	3.500.000	3.487.019	Gölbaşı Yerleşkesi Spor Tesisi Yapımı ile 4 adet Açık Spor Tesislerinin Onarımları yapılmıştır. Proje ödeneğinin tamamına yakını harcanmıştır ve %99,6 oranında bir harcama gerçekleşmiştir.
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	1994-2018	Biyoteknoloji Binası (10.000 m ²), Cebeci SBDB (14.400 m ²), Den.Hay.Uyg.Lab. (1.200 m ²), Didim Ulus.Dil.Kül.Mer. (13.500 m ²), Öğrenci Yaşam Merkezi (5.000 m ²)	10.000.000	11.560.000	10.112.238	Didim Uluslararası Gençlik Merkezi başta olmak üzere Biyoteknoloji Enstitüsü Binası ile Ziraat kazan dairesi ve ahır binası ile Cebeci kantin binası ile birlikte 5 adet yeni bina yapılmıştır. Projeye yıl içerisinde 1.560.000,00 TL tutarında likit karşılığı ödenek eklenmesi yapılmıştır. Ödeneğin 10.112.237,95 TL'si harcanmış olup; kalan ödeneğin tamamı bir sonraki yıl Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Projesinde kullanılmak üzere taahhüt artığı karşılığı olarak devretmiştir.
2017H032390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2017-2017	Etüd Proje	500.000	1.080.560	945.871	Bağlıca Sağlıkta Mükemmelliyet Merkezi Etüt ve Proje Hizmet Alımı İşinin bir bölümüne ait projeler alınmış olup, iş devam etmektedir. Ayrıca 9 adet muhtelif etüd projeler yapılmıştır. Projeye yıl içerisinde taahhüt artığı karşılığı olarak 580.560,00 TL tutarında ödenek eklenmiş olup; 945.871,00 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Kullanılmıştır.
2013H030660	Büyük Onarım	2013-2018	Bakım Onarım, Güçlendirme, Rehabilitasyon, Restorasyon	17.000.000	17.700.000	16.956.449	Proje kapsamında 84 Adet Bakım Onarım İşleri gerçekleştirilmiştir. Projeye yıl içerisinde bakım onarım ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 700.000,00 TL tutarında likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Proje ödeneğinin 16.956.449,00 TL'si kullanılmıştır. %95,8 oranında harcama gerçekleşmesi olmuştur.
2016H032420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	2016-2019	Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüd-Proje, Makine-Teçhizat	4.000.000	4.450.000	4.446.429	Proje kapsamında mevcut bilgisayarların bakım onarım ve iyileştirme işlemleri tamamlanmış olup; ihtiyaca binaen yerleşkelerin donanım ve bağlantı hızları geliştirilmiş ve gerekli bilgisayar, yedek parça alımları yapılmıştır. Proje ihtiyacına kullanılmak üzere yıl içerisinde 450.000,00 TL tutarında aktarma işlemi yapılmıştır. Projede %99,9 oranında yüksek bir harcama gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2017H032410	Yayın Alımı	2017-2017	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	5.000.000	6.000.000	5.991.593	Proje ödeneği yıl içerisinde yapılan 1.000.000,00 TL likit karşılığı yapılan ödenek ekleme işlemi ile birlikte 6.000.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir ve ödeneğin 5.991.593,29 TL'si süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliğinde ve kitap alımında kullanılmıştır.
2017H032400	Muhtelif İşler	2017-2017	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teknikat, Taşıt T-13 (1 Adet), T-5 (1 adet)	6.000.000	5.750.000	5.568.327	Proje ödeneğinden yıl içerisinde yapılan aktarma işlemi ile 450.000,00 TL düşülmüş ve döner sermaye karşılığı olarak 200.000,00 TL eklenmiş olup toplam ödenek 5.750.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 4.373.698,19 TL'si muhtelif makine-teçhizat alımları ve tefriş alımlarında, 1.130.319,29 TL'si ise bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır.
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2014-2019	Etüt Proje	1.000.000	1.000.000	564.150	Tandoğan Kampüsünde Yer Alan Tescilli Binalarımız için Etüt Proje Hizmeti Alınmıştır. Proje kapsamında 564.150,00 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2014-2019	Restorasyon	10.500.000	10.500.000	10.373.516	Ziraat Fakültesi Tescilli Yemler ve Hayvan Besleme binası Restorasyon İşleri, Hukuk Fakültesi İki Merkezi Galerinin Hattı, Yıldırım Beyazıt Yurdu Onarımı ile Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Binalarının Restorasyonları yapıldı. Proje ödeneğinin 10.373.516,19 TL'si harcanmıştır.

Tablo-40 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	A.Ü. SPOR TESİSİ YAPIMI 2015-2017 YILLARINA SARI	AÇIK İHALE	GARDEN İNŞAAT	2.985.932
		A.Ü. TANDOĞAN YERLEŞKESİ SPOR TESİSLERİNE AİT BAKIM ONARIM VE TADİLAT YAPILMASI	DOĞRUDAN TEMİN	METZAN YAPI	58.410
		A.Ü. CEBECİ YERLEŞKESİ SPOR SALONU FITNESS BÖLÜMÜ ELEKTRİK İŞLERİ ONARIMI	DOĞRUDAN TEMİN	BİSA AYDINLATMA	68.322
		A.Ü. OLİMPİK YÜZME HAVUZU TADİLATI	DOĞRUDAN TEMİN	LÜTFÜ MÖBLE	35.400
		A.Ü. GÖLBAŞI KAMPÜSÜ ATLETİZM ALANI TEL ÇİT İŞİ	DOĞRUDAN TEMİN	METZAN İNŞAAT	68.145
		A.Ü. TANDOĞAN KAMPÜSÜ FITNESS SALONU ÇATI TADİLATI VE ALT YAPI İYİLEŞTİRİLMESİ	DOĞRUDAN TEMİN	GDB İNŞAAT	46.610
		A.Ü. DİDİM YENİHİSAR ÖRESEM ULUSLARARASI MUTFAK MAHALLİ CİHAZ ALIM	AÇIK İHALE	İNOKSAN	224.200
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-41 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	A.Ü. DİDİM – YENİHİSAR ÖRSEM ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ BİNASI YAPIM İŞİ.	AÇIK İHALE	ONURSAL PROJE	5.783.647
		A.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ HAYMANA ÇİFTLİĞİ AHIR YAPILMASI İŞİ.	AÇIK İHALE	YAPITEM İNŞAAT	1.665.527
		A.Ü. GÖLBAŞIYERLEŞKESİ SPOR TESİSİ YAPIMI İŞİ 2015-2017 YILLARINA SARI	AÇIK İHALE	GARDEN İNŞAAT	323.932
		A.Ü. KANTİN BİNASI YAPIMI	AÇIK İHALE	SONER AKGÜL	539.981
		A.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ KAZAN DAİRESİ BİNASI YAPIMI	AÇIK İHALE	STATİK ISI	974.680
		A.Ü. DİDİM GENÇLİK MERKEZİ KİLİT TAŞ YAPILMASI	DOĞRUDAN TEMİN	GÖZDE DEKORASYON	68.145
		A.Ü. KALPMERKEZİ BİNASI İLE DİDİM ÖRSEM CİHAZ TAŞIMA VE DEVREYE ALINMASI İŞİ	DOĞRUDAN TEMİN	TOLKAT MAKİNA	30.090
		A.Ü. BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ EK BİNASI YAPIMI VE MEVCUT KARBİYOTEK BİNASI TADİLATI İŞİ 2017-2018 YILLARINA SARI	AÇIK İHALE	ELAY İNŞAAT	726.237
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Şekil-1 Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Proje Resmi



Şekil-2 Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Proje Resmi



Tablo-42 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2017H032390	-
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Etüd Proje Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Etüd-Proje	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017	-
Proje Tutarı (maliyeti)	500 (Hazine Yardımı)	500 (Hazine Yardımı) 581 (Öz Gelir)
Yapılan Harcama		946

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-43 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2015H030390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	A.Ü. Cebeci Yerleşkesi Yeni Kantin Binasına Ait Statik Proje Hazırlanması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	ÖZGÜR TUGA İNŞAAT	30.090
		A.Ü. Enerji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Süper İletken Binasına İlave Kat Yapılması İşine Ait Mimarlık, Mühendislik Projeleri Ve İhale Dosyası Hazırlanması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	GÜMÜŞ YAPRAK	68.322
		A.Ü. Tandoğan Yerleşkesi E Blok Yangın Merdiveni Ve Engelli Asansörü Statik Projelerinin Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	İLKER YILMAZ	52.510
		A.Ü. Bağlıca Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Etüd Ve Proje Hazırlanması İşi (Sarı İş)	Belli İstekliler	ALTUĞ MİMARLIK	364.839
		A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Katlı Otopark Binası Mimari Ve Mühendislik Projelerinin Çim ve Bisiklet Yolu Uygulama Projelerini ve Gölbaşı Yerleşkesi Hali Hazır Haritasının Haz Ait Hiz. Al.	Pazarlık Usulü	EBC MİMARLIK	192.930
		A.Ü. İbn-i Sina Hastanesi Binası Röleve Projelerinin Hazırlanmasına Ait Hizmet Alımı	Pazarlık Usulü	NTD MİMARLIK	112.100
		Mamak İlçesi Balkiraz Mahallesi İmarın 5388 Ada 1 Parseline Ait İmar Planının Esas Jeolojik Etüd Raporlarının Hazırlanması	Doğrudan Temin	GEOMEK MÜHENDİSLİK	33.630
		A.Ü. Hizmet Binalarının Engelli Erişimi Kapsamında Bulunan Standartlara Uygun Olarak Yerinde Keşif Yapılması Projelendirilmesi Montajının Takibi Ve Danışmanlığı Teknik Şartnameleri Oluşturulması Maliyet İhale Dosyasının Haz.	Doğrudan Temin	ZAFER KAPLAN	57.230
		A.Ü. Tandoğan Yerleşkesi Derslik Ve Merkezi Birimler Binası Mimari Avan Proje Hazırlanması Hizmet Alımı İşi.	Doğrudan Temin	ÖZKAN ÖZGÜR	34.220
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-44 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü. Su Yönetimi Enstitüsü İlave Kısım Tadilat İşi	Açık ihale	Lütfü Möble	292.830
		A.Ü.Tandoğan Yerleşkesi Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası Cephe Onarım İşi	Açık ihale	Asyam İnşaat	1.405.591
		A.Ü.Gölbaşı 50. Yıl Kampüsü Nizamiye Binası Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	Açık ihale	Ergen İnşaat Turz. Ltd.Şti.	586.749
		A.Ü. Cebeci Yerleşkesi Giriş Kapıları Ve Araç Yollarının Yeniden Düzenlenmesi İşi	Açık ihale	Emre Türkeli	900.113
		A.Ü. Veteriner Fakültesi Kazan Araştırma Uygulama Çiftliği Onarımı 2. Etap	Açık ihale	Emre Türkeli	2.290.520
		A.Ü. Vehbi Koç Yurdu Kazan Dairesi Yapım İşi	Açık ihale	Doğsan İnşaat	343.530
		A.Ü. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D. Kalan İmalatların Yapılması	Açık ihale	Berkant Ekici İnşaat	310.067
		A.Ü. Veteriner Fakültesi Isı Merkezi Onarım İşi	Açık ihale	Ceren İnşaat	1.664.761
		A.Ü.Cebeci Yerleşkesi İletişim Fakültesi Yangın Merdiveni Yapım İşi	Açık ihale	Hasan Harman	220.822
		A.Ü.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Fizyopatoloji Laboratuvarı Onarımı İşi.	Açık ihale	Hasan Harman	170.199
		A.Ü. Cebeci Yerleşkesi Tescilli Hukuk Fakültesi Binaları Ve Bağlı Birimlerine Ait Isı Merkezi, Galeri Hatları Restorasyon, Yapım, Onarım Ve Uygulama İşi	Açık ihale	Mehmet Koç	2.482.610
		A.Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Isıtma Kanalı Ve Sirkülasyon Kazanı Onarım İşi	Açık ihale	Alkomak Isı Sistemleri	121.540
		A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü İlave Kat Yapılması İşi 2017-2018 Yıllarına Sari	Açık ihale	Yapıtem İnşaat	1.354.419
		A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi M Blok Tadilat İşi	Açık ihale	Dönmez İnşaat	714.773
		A.Ü.İletişim Fakültesi Çevresine Andezit Kaplama Ve Bordür Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Mesan İnşaat	62.245
		A.Ü. Cebeci Uygulamalı Bilimler Fakültesi Giydirme Cephe Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Anka Sav İnşaat	47.200
		A.Ü. Keçiören Kampüsü Eski Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Doğrama Değişimi İşi	Doğrudan Temin	Kom Yapı	38.940
		A.Ü. Dil Ve Tarih- Coğrafya Fakültesi(D Blok) Ek Binasındaki Sınıflara Ait 150 Adet Çift Kişilik Sıranın Onarımı Ve 9 Adet Platform Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Lütfü Möble	61.950
		SAYFA TOPLAMI			

Tablo-44 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	
DEVİR TOPLAMI					13.068.860
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü. Rektörlük Binası Toplantı Salonu Ve Senato Toplantı Salonlarını Besleyen Arızalı Klima Santralinin Tamiri İşİ.	Doğrudan Temin	Murat Teknik Isıtma	4.720
		A.Ü. Cebeci Kampüsü Kanalizasyon Hattı İyileştirme Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	İnci Emre İnşaat	66.670
		A.Ü. Keçiören Yerleşkesi Muhtelif Çatılara Ait Bakım, Onarım Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	Demirler İnşaat	19.293
		A.Ü. Veteriner Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Duş Ve Dinlenme Mahalleri Onarım İşİ	Doğrudan Temin	Güzeloğulları İnşaat	68.145
		A.Ü Siyasal Bilgiler Fak. Kütüphane Ve Spor Salonuna Ait Galeri İçindeki Isıtma Ve Temizsu Hatlarının Yenilenmesi İşİ	Doğrudan Temin	Ergen İnşaat Turz. Ltd.Şti.	62.835
		A.Ü. Veteriner Fakültesi Beyaz Bina Kütüphane Mahali Döşeme Kaplaması Yapılması Ve Histoloji Laboratuvarına Ups Ve Klima Takılması İşİ	Doğrudan Temin	Gülüstan Ayluçtarhan	27.140
		A.Ü. Fen Fakültesi E Blok Bodrum Kat Muhtelif Tadilat İşİ	Doğrudan Temin	Berkant Ekici İnşaat	68.145
		A.Ü. Milli Piyango Yurdu Kapı Eşikleri Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Taşyapı İnşaat	67.909
		A.Ü. Hukuk Fakültesi Kanalizasyon Hattı İyileştirmesi Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Doğan Karaca	66.080
		A.Ü. Asım Binası Muhtelif Mahallerinin Tadilatının Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Özkan Gündüzlü	67.732
		A.Ü. D.T.C.F Diller Binası Toner ve Balkonların Zemin Ve Korkuluklarının Yapımı İşİ	Doğrudan Temin	Güvem Proje	68.558
		A.Ü. Rektörlüğü Asansörün Hidrolik Ünite Yenileme İşİ	Doğrudan Temin	Logo Asansör	13.570
		A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarbiyotek Laboratuvarı Asansörünün Revizyonu İşİ	Doğrudan Temin	Logo Asansör	4.720
		A.Ü.Kültür Sanat Merkezi Bahçe Duvarı Yap.İşİ	D. Temin	Özgür T. İnş.	41.300
		A.Ü. Gama Meslek Yüksekokulu Pis Su Hattı Yenilenmesi Ve Çökertme Havuzunun Giderinin Yenilenmesi İşİ	Doğrudan Temin	Doğan Karaca	61.360
		Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma Ve Uygulama İstasyonuna Ait Binaların Enerji Hatlarının Çekilmesi İşİ	Doğrudan Temin	Disa Elektrik	25.370
		A.Ü. Eczacılık Fakültesi Doğalgaz Avan Projesi Hazırlaması İşİ	Doğrudan Temin	Taner İrfan Yılmaz	36.580
		A.Ü.Tandoğan Yerleşkesi Rektörlük Giriş Düzenlemesi İşİ	Doğrudan Temin	Koçoğlu İnşaat	65.431
		A.Ü. Eczacılık Fakültesi Klima Santralleri Çelik Kaide Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	İlker Yılmaz	67.850
		A.Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhtelif Mahallere Ait Onarım İşİ	Doğrudan Temin	Doğuş 2000 İnşaat	66.965
SAYFA TOPLAMI					14.039.233

Tablo-44 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					14.039.233
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü. Cebeci Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Tadilat İşİ	Doğrudan Temin	Ergen İnş.Turz. Ltd.Şti.	60.180
		A.Ü. Haymana Ciftliği Yem Ambarı Betonarme Tadilat İşİ	Doğrudan Temin	Ergen İnşaat Turz. Ltd.Şti.	35.046
		A.Ü. Şevket Aziz Kansu Binası Yangın Tesisatı Tadilatı İşİ	Doğrudan Temin	Yetiş Yangın Sistemleri	51.330
		A.Ü. Keçiören Ve Dışkapı Yerleşkesi Muhtelif Binalara Ait Çatı Onarım Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Demirler İnşaat	10.620
		A.Ü. Muhtelif İnşaat Tesisat Ve Elektrik Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Yılmaz Açıkgoz	67.850
		A.Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhtelif Elektrik Ve Tesisat Arızalarının Giderilmesi İşİ	Doğrudan Temin	Bisa Aydınlatma	67.850
		A.Ü. Asym Binası Muhtelif Mahallere Güvenlikli Kapı Giriş Güvenlik Alanı Düzenlenmesi Ve Merdiven Korkulukları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Özkan Gündüzlü	67.496
		A.Ü. Vet. Fak. Personel Odasının Düzenlenmesi ve Doğum A.B.D. Paslanmaz Kafes Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Doğuş 2000 İnşaat	63.602
		A.Ü. Tandoğan Yer. Eczacılık Fak. Laboratuvarlara Dikdörtgen Enerji Ünitesi Ve Tezgah Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Sc Eğitim Araçları	12.945
		A.Ü. Rektörlük Binası Kanalizasyon Hattı İyileştirme Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Doğan Karaca	68.145
		A.Ü. Olimpik Yüzme Hav. Soyunma Odaları Tad. İşİ	D. Temin	Gdb İnşaat	62.540
		A.Ü.Kreiken Rasathanesi Muhtelif Mahallere Ait Onarım İşİ	Doğrudan Temin	Özgüven İnşaat	68.558
		A.Ü.Gölbaşı Yerleşkesi Belge Yönetimi Ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü(Beyas)Binasına Yedek Elektrik Besleme Hattı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Mp System İnşaat	56.050
		A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Süper İletken Binası 134 Nolu Laboratuvar Tadilat İşİ	Doğrudan Temin	Asmin Yükselen	68.204
		A.Ü.Ziraat Fak. Gümüşdere Yerleşkesi Kanalizasyon Hattı İyileştirme İşİ	Doğrudan Temin	Doğan Karaca	64.251
		A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Yeşil Alan Otomatik Sulama Tesisatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	Garden İnşaat	68.558
		A.Ü. Man. Örsem Öğrenci Kam. Mut. Mahali Exproof Havalandırma Tesisatı Yapım İşİ.	Doğrudan Temin	Yılmaz Açıkgoz	23.423
		A.Ü. Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliği Koyunculuk Ünitesi Çatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	Emre Türkeli	67.850
		A.Ü. Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Ek Hizmet Binası Galeri Boşluğu Kapatılması İşİ	Doğrudan Temin	İlker Yılmaz	67.850
		A.Ü. D.T.C.F Altyapı İyileştirme Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Şaban Kırmızı	48.380
A.Ü. Tandoğan Yerleşkesi Kanalizasyon İyileştirme Yapımı İşİ	Doğrudan Temin	Karaca İnşaat	68.204		
SAYFA TOPLAMI					15.208.165

Tablo-44 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti	
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
DEVİR TOPLAMI					15.208.165	
2013H030660 Büyük Onarım Projesi	A.Ü. Ziraat Fak. Su Yönetimi Ens. Engelsiz Dersliği ve Eş Ayır Binaya Doğalgaz Alt Yapı Hattı Çekilmesi İşi	Doğrudan Temin	Ahmet Ceyhan	68.322		
	A.Ü.Gölbaşı Kampüsü 50.Yıl Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Kısmı Peyzaj Düzenlemesi	Doğrudan Temin	Bt Plan İnşaat	64.900		
	A.Ü. Uygulamalı Bilimler Kazan Dairesi Yenilenme	Doğrudan Temin	Yetiş Yangın Sistemleri	68.322		
	A.Ü. Eski Gıda Mühendisliği 1 Nolu Bina Tadilatı	Doğrudan Temin	Lütfü Möble	66.080		
	A.Ü. Muhtelif Mahallerde Tesisat Tamir Ve Onarım İşleri Yapılması	Doğrudan Temin	Karaca İnşaat	64.310		
	A.Ü. Ziraat Fakültesi Gümüşdere Yerleşkesi 5 Adet Lojmana Kombi Ve Doğalgaz Hattı Çekilmesi	Doğrudan Temin	Ahmet Ceyhan	30.444		
	A.Ü. Sağlık Spor Ve Kültür Daire Başkanlığı Telefon Kompazisyon Panosunun Şönt Reakter İlave Edilmesi	Doğrudan Temin	Eymir Bileşim	9.440		
	A.Ü. Muhtelif Çatıların Onarımı	D. Temin	Demirler İnş.	64.546		
	A.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kanalizasyon Hattının Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	Doğan Karaca	62.245		
	A.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kazan Dairesi Kedi Yolu Ve Ana Giriş Kapısı Muhtelif Tadilat İşi.	Doğrudan Temin	Kaptan İnşaat	35.400		
	A.Ü. Hukuk Fakültesi Kanalizasyonun İyileştirilmesi	D. Temin	Su İnşaat	2.803		
	A.Ü. 2016 Yılından Kalan Veteriner Fakültesi Beyaz Bina Barınak Tesisat Ve İhale Dokümanı Hazırlanması	Doğrudan Temin	Bece İnşaat	20.060		
	A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Ek Bina Ve Mevcut Karbiyotek Binası Tadilat Projelerinin Hazırlanması	Doğrudan Temin	Özgür Tuga İnşaat	47.200		
	A.Ü. Veteriner Fakültesi Süt İşletme Binası Zemin Kaplama Muhtelif Onarım İşleri	Doğrudan Temin	Emre Türkeli	68.558		
	A.Ü. Cebeci Yerleşkesi Mescid Düzenlenmesi	Doğrudan Temin	Metzan İnşaat	35.400		
	A.Ü. Tandoğan Yerleşkesi Mescit Düzenlenmesi	D. Temin	Koçoğlu İnş.	66.670		
	A.Ü. Gölbaşı – Cebeci Yerleşkesi Geçiş Koridorları Ve Sosyal Faaliyet Alanları Düzenlenmesi İşi	Doğrudan Temin	Lütfü Möble	65.820		
	A.Ü. D.T.C.F. D Blok Ek Bina Muhtelif Tadilat İşleri	Doğrudan Temin	Güzeloğulları İnş.	64.310		
	A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Güvenlik Kulübeleri Taş Cephe Ve Kanalizasyon İle Drainaj Hattı Yapılması İşi.	Doğrudan Temin	Taşyapı Granit	64.310		
	A.Ü. Gıda Mühendisliği Laboratuvarlarına Saf Su Arıtma Sisteminin Yapılması	Doğrudan Temin	Yetiş Yangın Sistemleri	68.499		
	A.Ü. Sıhhiye Tıp Yerleşkesi 5. Blok Muhtelif Mahallerin Tadilat İşi	Doğrudan Temin	Hasan Harman	67.850		
	A.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Büyük Onarımı	Açık ihale	Aydın Akman	330.827		
	A.Ü. İlahiyat Fakültesi Onarım İşi	Açık ihale	Selim İnş.	15.078		
	A.Ü. D.T.C.F. Kütüphane Onarımı	Açık ihale	Güvem Proje	13.174		
	A.Ü. D.T.C.F. Asansör Onarım İşi	Açık ihale	Doğuş.2000 İnş.	4.127		
	A.Ü. Besyo Binası Kesin Hesabı	Açık ihale	Emre İnşaat	11.963		
	A.Ü.Milli Piyango Tad. ve Yemekhane Bin. Çatı Onar.	Açık ihale	Esat Fırat İnş.	267.400		
	A.Ü.D.T.C.F. Ekbina	Açık ihale	Güvem Proje	226		
	TOPLAM					16.956.449

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-45 Yayın Alımı Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2017H032410	-
Proje Adı	Yayın Alımı	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Kütüphane Yayın Alımı	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017	-
Proje Tutarı (maliyeti)	5.000 (Hazine Yardımı)	5.000 (Hazine Yardımı) 1.000 (Öz Gelir)
Yapılan Harcama		5.992

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tablo-46 Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları

Proje No	Proje Adı	Alım Usulü	Alımı Yapılan Mallar	Adedi	Alımın Toplam Maliyeti
2017H032410	Yayın Alımı	4734 Sayılı Kanununun 22/a maddesi	Sürelî Yayın Aboneliği	359	808.264
			Veri Tabanı Aboneliği	97	4.764.742
			Kitap Alımı	4.438	418.587
TOPLAM					5.991.593

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Şekil-3 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi

Tablo-47 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2017H032400	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Makine-Teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017	-
Proje Tutarı (maliyeti)	5.472 (Hazine Yardımı) 528 (Öz Gelir)	5.222 (Hazine Yardımı) 528 (Öz Gelir)
Yapılan Harcama		5.568

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-48 Muhtelif İşler Projesi (Bilgi Teknolojileri) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2017H032400	MUHTELİF İŞLER (Bilgi Teknolojileri)	Kablosuz ağ cihazı alımı	DMO	DMO	368.982
		Kablosuz ağ cihazı alımı	DMO	DMO	380.989
		Kablosuz ağ cihazı alımı	DMO	DMO	167.468
		Kablosuz ağ cihazı alımı	DMO	DMO	212.881
TOPLAM					1.130.319

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-49 Muhtelif İşler Projesi (Makine Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti	
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
2017H032400	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	Zebra Stor Perde Alımı	Doğrudan temin 22/d	Ata Tekstil Dekorasyon	62.049	
		Kurutma Makinesi Çamaşır Makinesi Isıtıcı Elektrikli Sübürge Ütü Ütü Masası Televizyon 123 Ekran Bulaşık Makinesi Çay Makinesi Çay Makinesi (160 brdk Yorgan 2' li Ocak 80 Ekran Televizyon Büro Tipi Buzdolabı	Doğrudan temin 22/d	Boran İnşaat Burhan BORAN	62.320	
		Kürsü Masa 190x70 Masa 130x70 Orta Sehpa 90x45 Metal ayaklı katlanır masa 160x90 Kitaplık 142x75x33 Kromajlı Kutu Ayaklı Masa 130x80 Akşap Temizlik Dolabı Masa Üstü Kitaplık 100x105x25 Ahşap Soyunma Dolabı Ahşap Malzeme Dolabı Ayarlanabilir Yüksek Sandalye Yüksek Oturumlu Metal Ayaklı Masa 140x75x110	Doğrudan temin 22/d	MU-KA Mutfak Banyo Dekorasyon	59.065	
		Lüks Ortopedik Yatak 90x190 Tek Kişilik Alez Yastık Alezi Nevresim Yastık	Doğrudan temin 22/d	Sünsa Sünger Yaylı Yatak SaniTic.Ltd.Şti.	54.558	
		Elektrikli Ocak 2' li Elektrik Sübürgesi Ütü/Ütü Masası Çay Kazanı Tost Makinası Termosifon Fırın Saç Kurutma Makinesi Klima	Doğrudan temin 22/d	Kıbrıs Dayanıkl Tüketim Mal.Paz.Ltd.Şti	57.389	
		Gömme Dolap	Pazarlık Usulü 21/f	Fuba Mutfak Dekarasyon	213.934	
		TOPLAM				509.315

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2017H032400	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	Rektörlük (1 Adet Telefon Santrali)	Doğrudan Temin	Telsim Telef. Ltd.Şti.	78.883
		Şevket Aziz Kansu Binası (60 Adet Akü)	Doğrudan Temin	Enel Enerji Ltd.Şti.	36.816
		Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi(15 Adet Dolap	Doğrudan Temin	Çırakoğlu Mobilya	146.432
		7 Kalem Cihaz Alımı	Doğrudan Temin	Dalış Malz. Ltd.Şti.	26.184
		1 Adet Fotoğraf Makinası ve Sualtı Kılıfı	Doğrudan Temin	Tripod Fot.	20.680
		10 Kalem Cihaz Alımı)	Doğrudan Temin	Magnart Taş Yapı Ltd.Şti.	35.459
		150 Adet 190'lık Yarım Kapaklı Dolap,150 Adet Çalışma Koltuğu,5 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı,10 Adet Büro Tipi Buzdolabı,7 Adet Evrak İmha Makinesi ve 73 Adet Çalışma Koltuğu)	DMO	DMO	130.596
		220 Adet Kütüphane Dolapları ve Tefriş	Pazarlık İhalesi	Sinan Mobilya	188.789
		İklimlendirme ve kima Sistemi	Pazarlık İhalesi	Fib-Tek	224.672
		14 Adet Kompak Dolap	Doğrudan Temin	Kayhan İnşaat	13.716
		1 Adet Projeksiyon	D. Temin	EMN Ltd.Şti.	35.152
		Analitik Kimya ABD(1 Adet Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi(HPLC)	Açık İhale	Ant Teknik Ltd.Şti.	92.630
		1 Adet Mikrosantrifüj,1 Adet Eliza Okuyucu	Açık İhale	Prizma Lab.	45.253
		1 Set GNSS Alıcısı,1 Aset Tip1 Elektronik Total Station,6 Set Optik Nivo,2 Set Dijital Nivo,1 Adet Laze Nivo, 2 Adet Elektronik Plainemetre,4 Set laserli Mesafe Ölçer, 1 Set Laserli Mesafe Ölçer	Açık İhale	Dikmen Harita Danışmanlık	73.490
		1 Adet Isıtıcı Montolar Sıralı, 15 Adet Isıtıcı Su Banyosu, 1 Adet 6 Gözlü Su Banyosu,1 Adet 6 Gözlü Su banyosu, 2 Adet Mantolu Isıtıcı,1 Adet Kül Fırını,1 Adet Karpuz makinası	Açık İhale	Protek Grup İç ve Dış tic.Ltd.Şti.	62.522
		10 Adet Kamera Alımı	Doğrudan Temin	CNM İletişim	21.075
		Biyoloji Bölümü (1 Adet Saf Su Cihazı(+25 Lt.Tanklı),1 Adet Çalkalamalı Su Banyosu,1 Adet Tirinoküler Işık Mikroskobu ve Görüntüleme Sistemi,1 Adet Yarı Motorize Rotary Mikrotom,1 Adet Analitik Terazi 0,001 ve 1 Adet Elektroforez Sistemi)	Açık İhale	Ongen Medikal	139.063
		SAYFA TOPLAMI			

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti	
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
DEVİR TOPLAMI					1.371.413	
2017H032400 MUHTELİF İŞLER (Makine- Teçhizat)	16 Adet Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı	Açık İhale	Uludağ Elek. Med.	26.804		
	Kimya Bölümü,4 Adet Kimyasal Saklama Dolabı	Açık İhale	Alptek Müh.	67.496		
	Dekanlık(1 Adet Güvenlik Dolabı,1 Adet Kimyasal Dolabı(Aspirasyon Sistemi ile Birlikte),2 Adet Isı ve Nem Kayıt Cihazı,10 Adet Ayaklı Mercek ve 10 Adet Akrobat Büyüteç)	Açık İhale	YNL Bilişim	96.524		
	(130 Adet Masa ve 366 Adet Sandalye Alımı)	DMO	DMO	54.720		
	Biyomedikal Bölümü(4 Adet Biyomedikal Uygulamalar Eğitim Seti)	Açık İhale	Commat İletişim Hiz.Ltd.Şti.	186.440		
	Elektrik-Elektronik Bölümü(1 Adet Temel Elektronik ve Kontrol Lab. Eğitim Seti ve 1 Adet Temel Elektronik ve Kontrol Lab. Eğitim Seti Bakı Devre Prototipleme Cihazı)	Açık İhale	Yıldırım Elektronik	405.920		
	Hassas Terazi	Açık İhale	İnterlab Lb. Ürün.Tic.A.Ş.	3.674		
	Vakum Pompası,Vorteks,Vakum Desikaötür,Isı transferi Deney Düzeneği,Isı Değiştiriciler Deney Düzeneği,Hidrolik Şebeke Deney Düzeneği,Hava Akış test Düzeneği,Damıtık Su Sistemi Desikatör	Açık İhale	Arter Tekn Cih.Tic.Ltd.şti.	402.864		
	Desikatör Dolabı, Ph Metre	Açık İhale	Art Labor Teknik Ltd.Şti.	9.959		
	Temas Açısı Ölçüm Cihazı	Açık İhale	Terralab Lb.Tic.A.Ş.	51.802		
	Hidrostatik ve Akışkan Deney Düzeneği	Açık İhale	Zara Cih. A.Ş.	60.062		
	1 Adet Manyetik Karıştırıcı,Etüv ve Ultrasonik Banyo	Doğrudan Temin	Arter Tekn Cih.Tic.Ltd.şti.	24.072		
	1 Adet Buzdolabı	Doğrudan Temin	Önay İç ve Dış Tic.A.Ş.	2.006		
	1 Adet yüksek performanslı iş istasyonu	Doğrudan Temin	Boxx Bilgisayar	68.440		
	1 Adet Aerobik ve Anaerobik Ergometresi Cihazı,1 Adet Dijital El Dinamometresi ve Sırt Bacak Dinamometresi,1 Adet Antrometrik Ölçüm Seti,1 Adet Anatomik İnsan,İskelet ve İç Organ Modellemeleri ve 1 Adet 6/1ı Ganyometre Seti)	Açık İhale	Bravomed San.	125.670		
	Vücut Analiz Monitörü2 adet,1 Adet Abdomil Caliper,2 Adet deri kıvrım kalınlığı ölçüm cihazı,1 adet bazal metabolizma hızı ölçer,1 adet abdomil yağlanma ölçüm cihazı,2 adet el dinamometresi	Açık İhale	ASM Sağl.Ltd.şti.	81.420		
	Otomatik yağ tayin cihazı,1 adet çeker ocak,1 adet kaba terazi,1 adet masaüstü soğutmalı santrifüh,1 adet manyetik karıştırıcı,1 adet homojenitör,1 adet çalkamalı su banyosu,1 adet nem tayin cihazı,	Açık İhale	Art Labor Teknik Ltd.Şti.	127.170		
	SAYFA TOPLAMI					3.166.456

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					3.166.456
2017H032400	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	Etüv	Açık İhale	Tesa Mak.Ltd.Şti.	4.177
		Histoloji-Embriyoloji ABD(1 Adet Doku Görme Cihazı)	Açık İhale	Ser-Med Tıbbi Cih.	36.462
		Doğum ve Jinekoloji ABD(1 Adet Mobil Operasyon Lambası)	Açık İhale	Monde Tıbbi Malz.Ltd.Şti.	6.372
		1 Adet Yoğun Bakım Ünitesi	Açık İhale	Monde Tıbbi Malz.Ltd.Şti.	12.508
		İç Hastalıkları ABD(2 Adet Yoğun Bakım Ünitesi)	Açık İhale	Monde Tıbbi Malz.Ltd.Şti.	27.848
		Dölerme ve Suni Tohumlama ABD(1 Adet Lineer Prob.)	Açık İhale	Esaote Medik.Ltd.Şti.	27.677
		1 Adet Sperma Konsantrasyon Cihazı	Doğrudan Temin	Şark Kemikal	31.860
		Parazitoloji(1 Adet İnkibatör Cihazı)	Doğrudan Temin	Dizge Analitik	26.196
		Fizyoloji ABD(1 Adet Öğrenci Spirometresi)	Açık İhale	Esenmed Tıp lab. Ltd.Şti.	6.112
		2 Adet Eğitim Seti	Açık İhale	Radon Medikal	76.700
		Biyokimya ABD(1 Adet Dikey Elektroforez Cihazı)	Açık İhale	Gen Plaza Ltd.Şti.	11.116
		Hastane Birimleri	DMO	DMO	55.200
		Ses Sistemi	Doğrudan Temin	Desibel İletişim A.Ş.	17.523
		Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği(1 Adet CNS İşleme Tezgahı)	Açık İhale	Tezmaksan Ltd.Şti	188.210
		Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü(1 Adet Boru Şebekesi Cihazı)	Doğrudan Temin	Dotek Ltd.Şti.	64.782
		Bitki Koruma Bölümü(10 Adet Binoküler Stereo Mikroskopu)	Doğrudan Temin	Karfo Karacasulu Tic.A.Ş.	37.800
		6 Kalem Malzeme Alımı	DMO	DMO	25.464
		1 Adet Projeksiyon	Doğrudan Temin	EMN Ltd.Şti.	41.920
		TOPLAM			

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-51 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Yedekleme yazılımı lisans yazılımı	Açık ihale	İnnovera Bilişim Tek. A.Ş.	88.500
		Antivirus yazılımı lisans yenileme	Açık ihale	İnnovera Bilişim Tek. A.Ş.	100.300
		Windows işletim sistemi lisans yenileme	Açık ihale	Kuralkan Bilişim Dış Tic. A.Ş.	216.648
		Log yazılımı lisans yenileme	Açık ihale	Profelis Bilişim Danışmanlık	62.139
		Redhat Lisans yenileme	Açık ihale	Profelis Bilişim Danışmanlık	11.800
		SCB lisans yenileme	Açık ihale	Profelis Bilişim Danışmanlık	50.351
		SecureW2 lisans yenileme	Açık ihale	Profelis Bilişim Danışmanlık	36.875
		Database cluster (several lines) lisans yenileme	Açık ihale	Profelis Bilişim Danışmanlık	68.086
		Band genişliği ve trafik izleme yazılımı	Açık ihale	Profelis Bilişim Danışmanlık	22.184
		Sanallaştırma yazılımı lisans yenileme	Açık ihale	Bilgibim Bilgi Tek.San. Tic. Ltd. Şti.	56.404
		Infoblox yazılımı lisans yenileme	Açık ihale	İnfrasis Bilgi teknolojileri Ltd.Şti.	157.070
		F5 yazılımı lisans yenileme	Açık ihale	İnfrasis Bilgi teknolojileri Ltd.Şti.	113.475
		Fortinet yazılımı lisans yenileme	Açık ihale	İnfrasis Bilgi teknolojileri Ltd.Şti.	394.592
		Taşeron işçi takip programı lisans yenileme	D.Temin	Kamutech Yaz. Eğt.Dan.San.Tic. A.Ş.	17.000
		Sanallaştırma sunucu alımı	Açık ihale	Bilgibim Bilgi Tek.San. Tic. Ltd. Şti.	464.625
		Zararlı yazılım engelleme	Açık ihale	İnfrasis Bilgi teknolojileri Ltd.Şti.	1.807.760
		Switch cihazı alımı	DMO	DMO	39.489
		Switch cihazı alımı	DMO	DMO	73.450
		Switch cihazı alımı	DMO	DMO	214.117
		Kablosuz ağ cihazı alımı	DMO	DMO	251.565
		Teknik servis için yedek parça alımı	D.temim	Üçtuğ Mühendislik Tic. Ltd. Şti.	66.659
		Yangın söndürme, parmak izi giriş sistemi, iklimlendirme sistemi ve klimaların bakım onarımı	D.Temin	Altay Mekanik Isı sis. İç ve Dış Tic.	27.152
		UPS akü değişimi	D.Temin	Ver.Güç.sis.Ltd. Şti.	28.084
		NetApp veri depolama sistemi bakımı	D.Temin	Bilgi.Bil. Tek. San.Tic.Ltd. Şti.	30.562
Network cihazları için yedek parça alımı	D.Temin	Bilgibim Bilgi Tek.San. Tic. Ltd. Şti.	47.543		
TOPLAM					4.446.429

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-52 Tarihi Yapıların Etüd Projesi Kapsamında Yapılan Proje Çalışmaları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	A.Ü. TESCİLLİ FEN FAKÜLTESİ A-B BLOK CEPHELERİNE AİT RÖLEVE RESTİTÜSYON VE YAPILARIN KISMİ RESTORASYON PROJELERİN HAZIRLANMASI	BELLİ İSTEKLİLER	KATRE PROJE	382.500
		A.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ 2027 ADA 84 / A PARSELDE BULUNAN ZİRAAT VE VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIK BİNASI VE YILDIRIM BEYAZIT YURDU RESTİTÜSYON PROJELERİN HAZIRLANMASI	PAZARLIK USULÜ	ART LİNE İNŞAAT	153.450
		A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 8245 ADA 1 PARSELDE BULUNAN HUKUK FAKÜLTESİ BİNASI İLE ADALET YÜKSEK OKULU RÖLEVE RESTİTÜSYON PROJELERİN HAZIRLANMASI	DOĞRUDAN TEMİN	ART LİNE İNŞAAT	28.200
TOPLAM					564.150

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-53 Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi Kapsamında Yapılan Bakım Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	A.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi 2. Kısım 2016-2017 Yıllarına Sari Restorasyon İş	BELLİ İSTEKLİLER	DOĞUŞ 2000 İNŞAAT	1.022.196
		A.Ü. Ziraat Fakültesi Tescilli Yemler Ve Hayvan Besleme Binası Restorasyon Ve Uygulama İş 2017-2018 Yıllarına Sari	BELLİ İSTEKLİLER	SARAÇOĞLU İNŞAAT	317.936
		A.Ü. Tescilli Hukuk Fakültesi Binaları Ve Bağlı Birimlerine Ait Isı Merkezi Galerî Hattı Restorasyon Yapım Onarım Ve Uygulama İş	BELLİ İSTEKLİLER	MEHMET KOÇ	6.356.132
		A.Ü. Tescilli Hukuk Fakültesi Binaları Ve Bağlı Birimlerine Ait Çatı Tadilatlarının Yapılması İş	PAZARLIK USULÜ	MEGA İNŞAAT	172.280
		A.Ü. Yıldırım Beyazıt Yurdu Ve Dekanlık Binası Cephe Onarımı Ve Bağlı İşler Uygulama İş	BELLİ İSTEKLİLER	TAŞYAPI İNŞAAT	2.306.731
		A.Ü. Tescilli Hayvan Has. Çevre Düzenlemesi Ve Muhtelif Tad. İş.	DOĞRUDAN TEMİN	DOĞUŞ 2000 İNŞ	198.240
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-54 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Lab.	2011-2017	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	300.000	300.000	176.200	Proje kapsamında 2017 yılında laboratuvarın yapılandırmasının tamamlanması amacı ile makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmiş olup; yılı toplam harcaması 176.199,84 TL'dir.
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	2010-2017	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (5.930 m ²)	300.000	300.000	225.681	Projenin ihtiyacı olan Süperiletken Kuantum Girişim Cihazlı Titreşimli Örnek Magnetometresi alımına ilişkin yaşanan sorunla ilgili mahkeme süreci devam etmektedir. Diğer taraftan yılı içerisinde proje kapsamında personel giderleri, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme ücretleri ve çeşitli mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. Harcama tutarına görevlendirme ve personel gideri ücretleride dahil edilmiştir.
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	2006-2019	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (5.148 m ²)	37.160.000	37.160.000	35.186.722	Mevcut elektrik altyapısında meydana gelen yangın sebebiyle elektrik altyapısının tamamen değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Helyum soğutma sisteminin devreye alınması elektrik altyapısına hızlandırıcı modüllerin testleri ise Helyum Soğutma sistemine bağlıdır. Birbirine bağlı iş paketlerinin birisinde meydana gelen aksama tüm sistemi etkilemekte olup; tüm projenin süresinide etkilemiştir. Bu kapsamda 2017 yılı için proje yürütücüsü tarafından personel giderleri ile görevlendirme ücretleride dahil olmak üzere bildirilen toplam harcama tutarı 35.186.721,84 TL'dir.
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Lab.	2012-2017	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (2.500 m ²)	550.000	550.000	1.147.588	Proje kapsamında 2017 yılında Mineral Seperasyon Sistemi ve XRF alımı gerçekleştirilmiş olup; proje özel hesabından toplam 1.147.588,47 TL harcama yapılmıştır.

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme	2016-2018	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (200 m ²)	500.000	500.000	2.015.628	Projede personel çalıştırılması, kordon kanı ekspansiyonu, hayvan deneylerinin; ilaveten diğer ihale usullerinde yapılacak bakım onarım harcama kalemlerinin ihalesinin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında ihtiyaca binaen alımların bir kısmı yapılmış ve hayvan deneylerinin yapılacağı laboratuvar hazırlıkları yapılmıştır. Bu doğrultuda projenin özel hesaptaki parasından 2017 yılında toplam 2.015.627,67 TL harcama gerçekleşmiştir.
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	2016-2018	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (700 m ²)	1.000.000	1.000.000	506.779	Araştırma için gerekli olan alt yapının incelenmesi ve hangilerinin Üniversitemiz için en verimli olacağını planlanması zaman almıştır. Bu doğrultuda gerekli araştırmaların tamamlanmasının ardından 2017 yılında proje kapsamında toplam 506.778,80 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.
2017K120770	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	2017-2019	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	0	15.130.000	0	Proje kapsamında PT MR cihazı alımı ihalesine çıkmış olup ihale süreci 2017 yılı içerisinde tamamlanmamış olması sebebi ile yılında herhangi bir harcama gerçekleşmesi olmamıştır.
2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	2017-2019	Etüt-Proje	1.000.000	6.000.000	0	Yatırım programında Kalkınma Bakanlığı tarafından revize proje dokümanı onaylanmadan harcama yapılamayacağına dair dipnot olması sebebi ile projeye başlanamamıştır.
2017K120160	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2017-2017	Proje Desteği	9.010.000	19.549.768	18.615.124	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 18.615.124,37 TL tutarında özel hesaptan yapılan harcamalar ile toplam 596 adet proje desteklenmiştir.

***Projelerin özel hesabına 2016 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.**

Tablo-55 Viral Zoonozlar Tane ve İleri Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Laboratuvarı Yapılandırması	Mal Alımı	İhale	ZEISS	176.200
		Mal Alımı	İhale	Medsantek	
TOPLAM					176.200

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Tablo-56 Süperiletkenlik Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti	
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Mal Alımı	Doğrudan Temin	ENOVAS Müh.Dan.Bilg.San.Tic.Ltd.Şti.	7.080	
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	ENOVAS Müh.Dan.Bilg.San.Tic.Ltd.Şti.	30.680	
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Enel Enerji Elek. San.Tic.A.Ş.	2.832	
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Zemin Bilgisayar Yazılım Tanıtım İletişim Med.Elektr.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti.	43.247	
		Mal Alımı	Doğrudan Temin	Zemin Bilgisayar Yazılım Tanıtım İletişim Med.Elektr.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti.	2.065	
		Proje kapsamında çalışan personel ücret ödemeleri				119.311
		Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirme ve Kongre Katılım Giderleri				20.467
TOPLAM					225.681	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Tablo-57 Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi	XRF Alımı	İhale	BES Mühendislik A.Ş.	507.400
		Mineral Seperasyon Alımı	İhale	Tia Teknis Ltd.Şti.	601.800
		Yolluk-Harcırah Kongre Katılım			
TOPLAM					1.147.588

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Tablo-58 Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	RF Dalga Kılavuzu Tutturucu Destek Aparatı İmalatı Hizmeti, Faraday Kafesi imalatı hizmeti	İhale	Enomak Endüstriyel Makine İmalat Pazarlama İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.	57.348
		Seksiyonel Kapı İmalat ve Kurulum Hizmet	İhale	3A Kapı Sistemleri Üm.İnş.Elk.San ve Tic.Ltd.Şti.	56.286
		Hızlandırıcı Kontrol Sistemi Danışmanlık Hizmeti	İhale	COSYLAB	289.987
		Tarla Tesisi Laboratuvar Mekanları Mutfak Tadilat ve Kurulum Hizmeti	İhale	Ertsan Endüstriyel Day.Tük.Mal.İnş.Bil.Sp or.Malz.San.Tic.Ltd.Şti	104.430
		250 keV Normal İletken Hızlandırıcı Yüksek Gerilim Hattının Elektrik Altyapısı Kurulum Hizmeti	İhale	ARES Analitik Elektronik Bilişim Medikal İmalat San. ve Tic.Ltd.Şti.	48.380
		Mekanik Tasarım Destek Hizmeti	İhale	KENAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK PROJE HİZ.İML. Ve PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	40.710
		Kişisel Doz Takip Sistemi Yazılım Hizmeti	İhale	ZENOTEK İTHALAT PAZARLAMA VE TİCARET YÜKSEL ÖZKAN	33.984
		Özel Elektronik Devre Tasarım Destek Hizmeti	İhale	ARES Analitik Elektronik Bilişim Medikal İmalat San. ve Tic.Ltd.Şti.	56.640
		Rogar Kapağı Tadilat Hizmeti	İhale	OLCA ENERJİ İNŞAAT TAAH.Tic.A.Ş.	57.230
		Baca Gazı İyonize Hava Monitor Sistemi Tasarım Hizmeti	İhale	SAAS	65.256
		Kontrol odası tasarım üretim ve kurulum hizmeti	İhale	LİNDA GROUP-Ayhan Ersoy	57.525
		Seminer Salonu Tadilatı ve Onarım Hizmeti	İhale	LİNDA GROUP-Ayhan Ersoy	46.964
		Tesis Misafirhanesi tadilatı	İhale	Gönülşan Nak.İnş.Mad.Ltd.Şti.	50.622
		Vakum Pompaları Bakım Onarım (İyon pompası, yağlı pompa, turbo pompa, leak dedektörü)	İhale	ARES Analitik Elektronik Bilişim Medikal İmalat San. ve Tic.Ltd.Şti.	57.820

SAYFA TOPLAMI**1.023.182**

Tablo-58 Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					1.023.182
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	Su soğutma sistemi bakımı	ihale	ARES Analitik Elektronik Bilişim Medikal İmalat San. ve Tic.Ltd.Şti.	57.230
		İdari Bina Elektrik Tesisatı Bakım ve Kabloleme ve Etiketlendirme Hizmeti	ihale	Info Power Enerji Güç.Sistemleri San. Ve Tic.Ltd.Şti.	61.006
		Dönüştürücü port ve vakum kazanı imalatı	ihale	Zenotek İthalat Pazarlama Ve Ticaret Yüksel Özkan	250.000
		Azot Transfer Hattı İmalat Hizmeti	ihale	Zenotek İthalat Pazarlama Ve Ticaret Yüksel Özkan	114.300
		Güvenlik Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlemesi Kurulum Hizmeti	ihale	EMK Restorasyon Tasarım Mehmet Koç	643.100
		Temiz Oda Kurulum Hizmeti	ihale	Koçoğlu Elektromekanik Endüstri İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti.	5.841.000
		Havalandırma Sistemi ve Kazan Brülör Bakım ve Tadilatı Hizmeti	ihale	Barış Isıtma-Soğutma	36.923
		Demet Hattı Elemanları İmalatı Hizmeti	ihale	Zenotek İthalat Pazarlama Ve Ticaret Yüksel Özkan	51.920
		Diagnostik Donanımları İmalatı Hizmeti	ihale	Atag Makine Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.	41.300
		Demet Hattı Elemanları İmalatı Hizmeti	ihale	Zenotek İthalat Pazarlama Ve Ticaret Yüksel Özkan	49.914
		Demet Taşınım Hattı Sehpa İmalat Hizmeti	ihale	Enomak Endüstriyel Mak. İmalat Pazarlama İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.	59.000
		Su soğutma Helyum Hattı Revizyonu Hizmeti	ihale	Met Isıtma	55.910
		Kapıların boyutlarının büyütülmesi hizmeti	ihale	Linda Group-Ayhan Ersoy	52.687
		LLRF Tasarım Hizmeti	ihale	DESY-Deutsches ElektronenSynchrotron	1.652.000
		Mekanik İmalat İşleri	ihale	LİNDA GROUP-Ayhan Ersoy	55.100
		Araç Kiralama Hizmeti	ihale	ÖZERBEY Tarım Gıda Petrol İnş.Taah.Orman Ürün Oto.Nak.Paz.San. Ve Tic.Ltd.Şti.	39.648
Leak Dedektörü Bakım Onarım ve Kalibrasyonu	ihale	ARES Analitik Elektronik Bilişim Medikal İmalat San. ve Tic.Ltd.Şti.	46.000		
SAYFA TOPLAMI					10.130.220

Tablo-58 Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					10.130.220
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	Dipol magnet üretim hizmeti	ihale	ATAG MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	64.723
		Selonoid magnet üretim hizmeti	ihale	ATAG MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	64.900
		Enjektör spektrometre üretimi	ihale	ATAG MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	66.670
		TARLA LDAP, web sayfası, personel yönetimi vs. yapılandırılması yazılım destek hizmeti	ihale	CREWORKER BİLAL TONGA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI FAALİYETLERİ	59.826
		Projeksiyon cihazı Tip1, Zayıf İstemci bilg. Ve projeksiyon cihazı tip2	ihale	TEKNOPARK PROJE YAZILIM VE DONANIM HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.	30.550
		Güçmetre	ihale	Rohde&Schwarz Eletronik Ve Telekomunikasyon Sistemleri Ve Ürünleri San. Ve Tic.Ltd.Şti.	59.000
		Master Osilatör	ihale	Laurin AG	310.000
		Nano Boyutlu FTIR Spektroskopi Sistemi	ihale	Nanomanyetik Bilimsel Cihazlar San.Tic.Ltd.Şti.	2.700.000
		Çözünmüş Oksijen Sensörü	ihale	Mettler-Toledo Tr Ölçüm Aletleri Tic.Satış Ve Servis	60.356
		İnternet Kenar Anahtar	ihale	DMO	102.422
		Elemental Analiz Spektrometresi	ihale	Amptek.Inc.	90.000
		Femto saniye lazer yükselteç sistemi	ihale	Spectra-Physics	5.600.000
		Kontrol sistemi donanımları	ihale	Teknopark Proje Yazılım Ve Donanım Hiz.Tic.Ltd.Şti.	45.620
		Optik Donanımlar	ihale	Optomek Optik Mekanik Müh. San. Ve Tic.Ltd.Şti.	56.050
		Güçmetre	ihale	Rohde&Schwarz Eletronik Ve Telekomunikasyon Sistemleri Ve Ürünleri San. Ve Tic.Ltd.Şti.	52.155
		Yaka tipi oksijen dedektörü ve duvar tipi oksijen dedektörü	ihale	ARES Analitik Elektronik Bilişim Medikal İmalat San. ve Tic.Ltd.Şti.	40.000
		Ayarlanabilir yüksek gerilim güç kaynağı tip 1	ihale	İradets İnovatif Radyasyon Dedektör Sistemleri Ltd.Şti.	31.000
SAYFA TOPLAMI					19.563.492

Tablo-58 Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
DEVİR TOPLAMI					19.563.492	
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	Network analizör ve spektrum analizör	İhale	ROHDE&SCHWARZ ELETRONİK VE TELEKOMİNİKASYON SİSTEMLERİ VE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	1.300.000	
		Radyasyon Donanımları	İhale	DOZA	815.000	
		Kütle Spektrometresi	İhale	HIDEN Analytical	447.619	
		KGS Kontrol Panoları	İhale	SAAS	959.528	
		Optik Masa	İhale	OPTOMEK OPTİK MEKANİK MÜH. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	330.900	
		RF Sinyal Üretici	İhale	Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş.	113.900	
		Test Ölçüm ve bağlantı sistemleri	İhale	NANOMANYETİK BİLİMSEL CİHAZLAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	53.500	
		7 Kalem Donanım Alımı	İhale	Sistek Elektronik Sistemler San. Ve Tic.Ltd.Şti.	32.250	
		Fiber Optik Füzyon Cihazı	İhale	OPTOMEK OPTİK MEKANİK MÜH. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	29.999	
		Azot Tankı tip 1	İhale	CRYOCAN Basınçlı Kaplar, Endüstriyel Tesisler San. Ve Tic. Ltd.Şti.	175.000	
		Dozimetre Elektrometresi ve okuyucu	İhale	MEDİTEL	249.924	
TOPLAM					24.071.112	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

*Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir.

Tablo-59 Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme	Floresan Lamba mikroskop için	Doğrudan Temin	Labor İldam Ltd.Şti.	1.298
		Etik Kurul Başvurusu	Doğrudan Temin	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi	5.000
		İhale İlan Hizmeti	Doğrudan Temin	AÜ.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	1.190
		Laboratuvar Tadilatı	İHALE	ENKA Grup	220.660
		İnsan Kordon Kanı Kök Hücre Expansiyon Sistemi	İHALE	Nükleer A.Ş.	1.127.363
		Buz Makinesi	İHALE	Kobay A.Ş.	6.000
		Eksi 80 derin dondurucu dolap	Doğrudan Temin	Labor İldam Ltd.Şti.	69.325
		Otomatik pipet seti	Doğrudan Temin	Labor İldam Ltd.Şti.	5.487
		Hassas Terazı (0,001 g)	Doğrudan Temin	Taykim Ltd.	7.965
		Laminar Hava Kabini	Doğrudan Temin	ABC Medikal	29.370
		Monoklanol Anitikor Kit	İHALE	Elips	43.200
		Kan Dondurma Torbası	Doğrudan Temin	Nükleer A.Ş.	2.690
		Kriyojenik Tüp (2 ml)	Doğrudan Temin	Labor İldam Ltd.Şti.	8.614
		Kordon Kanı bankası cihazları bakım onarımı hizmeti	Doğrudan Temin	Anka Kalibrasyon	43.660
		Oksijen Gazı	Doğrudan Temin	Labor İldam Ltd.Şti.	680
		Karbondioksit Gazı	Doğrudan Temin	Labor İldam Ltd.Şti.	1.239
		Azot Gazı	Doğrudan Temin	Labor İldam Ltd.Şti.	885
		Hayvan Kafes Seti, Hay. Transfer Ücreti, Otoklav, Buz Mak.	İHALE	DLS LTD.	139.600
		HLA-A-B-C-DR B1 NGS ile yüksek çözünürlüklü doku tiplendirmesi (sarfları dahil)	İHALE	GENSUTEK LTD.	10.487
		Klima santrali bakım onarımı (bakım onarım otomasyon hizmeti alımı)	Doğrudan Temin	Çınar Soğutma A.Ş.	44.840
		eksi 187 c derece hücre saklama tankı bakım onarımı	Doğrudan Temin	TEKNİS LTD.	11.800
		Methocult besi yeri (tüm sarflar dahil)	Doğrudan Temin	GENSUTEK LTD.	15.660
Personel Giderleri			218.614		
TOPLAM				2.015.628	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Tablo-60 Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	Araştırma ve Uygulama merkezi arasında taşıma hizmeti	Doğrudan temin	35.159
		Karbondioksit inkübatör	Doğrudan temin	25.900
		Soğutmalı santrifüj	Doğrudan temin	42.640
		Biyogüvenlik kabini	Doğrudan temin	29.500
		Ultra santrifüj	Doğrudan temin	327.450
		Kongre katılımı ve harcırah		
TOPLAM			506.779	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

7.ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik arařtırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerekleřtirilmesinde başarı saęlayıcı unsurların bařında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu erevede Üniversitemiz her geen yıl deęiřen öncelik ve ihtiyalar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik alıřmalarını sürdürmektedir. Dięer taraftan üniversitenin ihtiyalarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların arttırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel arařtırma ve bařta saęlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduęu katkının artması anlamına gelecektir.

Yılı Büte Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereęince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü ere ve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı aısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karřılařılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluęu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta eřitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geirilmesine yardımcı olacağı düşünölmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari büte ile yatırım bütesinin iliřkilendirilmesi ve e-büte sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinlięi arttıracaktır.

Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduęu ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde deęiřtirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet ii eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Dięer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve deęerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlıęının öncülüęünde geliřtirilecek hizmet ii eğitim programlarının Üniversitemiz aısından oldukça faydalı olacağı düşünölmektedir.

Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakölteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniř tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile iřletilmesi gerekmekte olup modernleřtirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduęu öngörülmektedir. Ancak Kalkınma Bakanlıęı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım - enerji gibi dięer sektörlerde de Üniversitelerin proje sunmasına imkân tanınmasının bu sektörlerde gerekli uzman personeli aęın gereklerine göre yetiřtirmekle görevli üniversitelerdeki sunulan eğitimlerde etkinlięi arttıracığı deęerlendirilmektedir.

2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Tablo-61 Ankara Üniversitesi 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	9		332.000			213.924			57.500			61.341			58.381
Sağlık	3		109.378			16.343			65.734			76.571			57.626
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	9		322.695			177.479			49.820			80.490			57.875
TOPLAM	21		764.073			407.746			173.054			218.402			173.882

Tablo-62 Ankara Üniversitesi 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	1		200			0			0			200		64	
Sağlık	1		5.000			0			5.000			5.000		0	
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	2		5.200			0			5.000			5.200		64	

Tablo-63 Ankara Üniversitesi 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: HİBE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	-		-			-			-			-			-
Sağlık	-		-			-			-			-			-
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	-		-			-			-			-			-
TOPLAM	-		-			-			-			-			-

Tablo-64 Ankara Üniversitesi 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: İCMAL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	9		332.000			213.924			57.500			61.541			58.445
Sağlık	3		114.378			16.343			70.734			81.571			57.626
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	9		322.695			177.479			49.820			80.490			57.875
TOPLAM	21		769.073			407.746			223.402			223.602			173.946

2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablo-65 Sektör Adı: Eğitim

2017 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2016 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	158.000	113.156	11.560	+	1.500(1) 60(2)	10.112
408	2013H030660	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	96.000	76.025	17.700	+	700(3)	16.956
408	2014H040020	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	2.500	412	1.000			564
408	2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	28.000	14.070	10.500			10.374
408	2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	15.000	7.045	3.500	+		3.487
408	2017H032390	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0	500	0	1.081	+	581(4)	946
408	2017H032400	Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR	2017	Ankara	0	6.000	0	6.200	+ -	200(5) 450(6)	5.568
408		Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0		0	528			
408	2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	21.000	3.216	4.000	+	450(7)	4.446
408	2017H032410	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0	5.000	0	6.000	+	1.000(8)	5.992
TOPLAM						0	332.000	213.924	61.541			58.445

- (1) Likit karşılığı ekleme işlemi.
(2) Likit karşılığı ekleme işlemi.
(3) Likit karşılığı ekleme işlemi.
(4) Taahhüt artışı karşılığı ekleme işlemi.
(5) Döner sermaye karşılığı ekleme işlemi.
(6) Kurum içi aktarma ile düşme işlemi.
(7) Kurum içi aktarma ile ekleme işlemi.
(8) Likit karşılığı ekleme işlemi.

Tablo-66 Sektör Adı: Sağlık

2017 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2016 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2011I000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	10.000	0	0	-	1.000(1)	0
408	2017I000090	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	40.000	0	46.571	+	1.000(2) 7.500(3) 1.200(4) 300(5) 37(6) 1.800(7)	44.735
408		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2018	Ankara	0	5.000	0	5.000			0
408	2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	59.378	16.343	30.000			12.891
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	57.378	16.343	30.000			12.891
408		Makine ve Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	2.000	0	0			0
TOPLAM						0	114.378	16.343	81.571			57.626

(1) Kurum içi aktarma ile düşme işlemi.

(2) Kurum içi aktarma ile ekleme işlemi.

(3) Maliye Bakanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarılan tutar.

(4) Maliye Bakanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarılan tutar.

(5) Likit karşılığı ekleme işlemi.

(6) Likit karşılığı ekleme işlemi.

(7) Maliye Bakanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarılan tutar.

Tablo-67 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)
2017 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2016 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	197.000	125.288	37.160			35.187
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	13.760	13.760				
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	183.240	111.528				
408	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0	16.960	16.660	300			226
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	7.720	7.720				
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0	9.240	8.940				
408	2011K120220	Viral Zo. Tanı ve İleri Araştırma Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0	8.657	8.357	300			176
408	2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. Ve Ar.Merke.	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0	10.980	10.430	550			1.148
408	2017K120160	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2017	Ankara	0	9.010	0	19.550	+	2.082(1) 1.896(2) 799(3) 1.155(4) 456(5) 757(6) 2.394(7)	18.615
408	2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	3.216	1.726	500			2.016
408	2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	18.224	15.018	1.000			507
408	2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	30.000	0	6.000	+	5.000(8)	0
408	2017K120770	Kolorektal Kanseri Erken Tanı Araş. Pro.	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	28.648	0	15.130	+	13.930(9) 1.200(10)	0
TOPLAM						0	322.695	177.479	80.490			57.875

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Gelir fazlası karşılığı yapılan ekleme işlemi.

(8) Maliye Bakanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarılan tutar.

(9) Maliye Bakanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarılan tutar.

(10) Gelir fazlası karşılığı yapılan ekleme işlemi.
