




# 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2019





**ANKARA ÜNİVERSİTESİ**

**2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Mart 2019**





***Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.***

*K. Atatürk*



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ**  
**ANKARA ÜNİVERSİTESİ**  
**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**İÇİNDEKİLER**

---

<b>YÖNETİCİ ÖZETİ .....</b>	<b>8</b>
<b>1.GENEL DEĞERLENDİRME .....</b>	<b>10</b>
1.MİSYON .....	10
2.VİZYON.....	10
3.İLKELER .....	10
4.AMAÇ VE HEDEFLER .....	11
<b>2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .....</b>	<b>12</b>
<b>3.MEVcut HİZMET KAPASİTESİ .....</b>	<b>14</b>
a) İnsan Kaynakları .....	14
b) Fiziksel Kaynaklar .....	17
<b>4.2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....</b>	<b>27</b>
<b>5. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....</b>	<b>30</b>
a) Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	30
b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar .....	36
<b>6. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI.....</b>	<b>38</b>
1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu .....	38
2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	46
3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu .....	65
<b>7. ÖNERİLER.....</b>	<b>73</b>
<b>2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ .....</b>	<b>74</b>
<b>2018 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU .....</b>	<b>78</b>



## YÖNETİCİ ÖZETİ

Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde toplam 65.734 öğrencisi, 4.174 akademik personeli, 4.691 idari personeli, 540 sözleşmeli ve 2.239 işçi olmak üzere toplam 11.644 personeli ile 18 fakülte, 14 enstitü, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 46 araştırma uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, uzaktan eğitim merkezi, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 2 araştırma uygulama hastanesi ve 1 dış hekimliği uygulama hastanesi ile 36 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, kültür, spor, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2018 yılı yatırımları için toplam 185.250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 63.393.500,83 TL ekleme işlemi ile toplam 248.643.500,83 TL'ye çıkmıştır.

Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %85,89, bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %80,63 oranında gerçekleşmiştir.

**Tablo-1 2018 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)**

Sektör	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Gerçekleşme	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	44.998	64.016	61.665	96,33
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	2.000	600	553	92,17
Kültür	20.000	20.510	19.976	97,40
Sağlık	67.978	91.887	60.618	65,97
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar	44.049	65.406	65.406	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>179.025</b>	<b>242.419</b>	<b>208.218</b>	<b>85,89</b>
<b>TOPLAM (BAP Hariç)</b>	<b>134.976</b>	<b>177.013</b>	<b>142.812</b>	<b>80,68</b>

**Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir. BAP harcamaları özel hesaba aktarılan tutarı ifade etmektedir.**

2018 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 61.664.574,07 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Didim Uluslararası Gençlik Merkezi başta olmak üzere Biyoteknoloji Enstitüsü Binası yapılmıştır. Diğer taraftan kampüslerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 64 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, kitap alımı, bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %96,33 ile yüksek oranda bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Beden Eğitimi ve spor sektöründe ise 552.804,83 TL harcama gerçekleşmiş olup; proje kapsamında Gölbaşı Yerleşkesi 2.etap spor kompleksi projelerin hazırlanması, olimpiik yüzme havuzu soyunma odaları yapımı ile Didim Yerleşkesine voleybol sahası yapılması için montajlı malzeme alımı yapılmıştır. Beden eğitimi ve spor sektöründe gerçekleşme %92,17 oranında olmuştur.



Diğer taraftan kültür sektöründe 19.976.350,43 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda etüt proje işleri ve 10 adet restorasyon uygulaması ve Yazma ve Nadir Eserler Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alımlar gerçekleştirilmiştir. Kültür sektöründe %97,40 oranında yüksek bir gerçekleşme olduğu görülmektedir.

Sağlık Sektöründe 60.617.811,02 TL kaynak kullanımı ile 20 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, hastanelerimizin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmış ve Diş Hekimliği Uygulama Hastanesinin inşaatı devam etmektedir. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleşme oranı %65,97'dir.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 65.405.883,70 TL ödenek bütçeden özel hesaba aktarılarak bilimsel araştırma projeleri desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere emanet hesaplara aktarılmıştır.

2018 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof.Dr.Erkan İBİŞ  
Rektör

## 1.GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.MİSYON

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

- Eleştirel düşünebilen ve çözüm odaklı, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, yaratıcı ve farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi,
- Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, disiplinlerarası ve etik değerleri gözetilen araştırmalar yapmayı,
- Sosyal sorumluluk bilinci ile dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözetilen ve bulunduğu bölgenin kalkınmasına-gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı, görev edinmiştir.

### 2.VİZYON

Nitelikli araştırmalar yapan, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi araştırma üniversitesi olmaktır.

### 3.İLKELER

- Akademik özgürlüğe öncelik verme
- Etik değerlere bağlılık
- Liyakat
- Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Kültür öğelerine ve tarihine bağlılık
- Saydamlık
- Öğrenci merkezlik
- Kaliteyi içselleştirme
- Katılımcılık
- Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı

#### 4.AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2019-2023 dönemi stratejik planında 5 adet stratejik amaç altında 22 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir.


**Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler**

<b>Amaç-1. Araştırma Üniversitesi statüsünü sürdürülebilir kılmak</b>
<b>Hedef 1.1.</b> Araştırma proje kaynaklarının sürekli artırılması ve çeşitlendirilmesi
<b>Hedef 1.2.</b> Araştırma altyapısını geliştirerek etkin kullanımının sağlanması
<b>Hedef 1.3.</b> İndekslerce (SCI, SCI expanded, SSCI, AHCI vb) taranan dergilerdeki öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının ve bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısının %20 oranında artırılması
<b>Hedef 1.4.</b> Araştırma ve lisansüstü eğitimde ülke öncelikleri de gözetilerek disiplinlerarası çalışmaların geliştirilmesi
<b>Amaç-2. Akredite eğitim programlarını artırmak ve nitelikli mezun vermek</b>
<b>Hedef 2.1.</b> Eğitim kalitesini geliştirerek; akredite eğitim programlarının sayısının artırılması
<b>Hedef 2.2.</b> Öğretim elemanlarının niteliğinin ve motivasyonunun artırılması
<b>Hedef 2.3.</b> Öğrenme ve sosyal yaşam ortamları geliştirerek öğrencilerin akademik ve bireysel gelişiminin desteklenmesi
<b>Hedef 2.4.</b> Uluslararasılaşma niteliğinin geliştirilmesi
<b>Hedef 2.5.</b> Uluslararası değişim programlarından yararlananların sayısının %25 artırılması
<b>Amaç-3. Paydaşlarıyla işbirliği içinde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak</b>
<b>Hedef 3.1.</b> Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülkenin sosyal, çevresel ve ekonomik gelişiminin desteklenmesi
<b>Hedef 3.2.</b> Üniversitede öğretilen bilginin toplumla paylaşılması
<b>Hedef 3.3.</b> Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkıda bulunulması
<b>Hedef 3.4.</b> Etkin sağlık hizmeti sunmak için, ulusal ve uluslararası akreditasyonunu sağlamış, hasta memnuniyetini öne çıkaran üçüncü basamak üst düzey merkezler kurulması ve mevcut merkezlerin niteliğinin geliştirilmesi
<b>Amaç-4. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek</b>
<b>Hedef 4.1.</b> Teknoloji Transfer Ofisi'nin sanayi ile etkileşimini üst düzeye çıkarmak
<b>Hedef 4.2.</b> Eğitim, ürün ve her türlü hizmetin toplum yararına sunulması
<b>Hedef 4.3.</b> Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasının/ürüne dönüştürülmesinin özendirilmesi/teşvik edilmesi
<b>Hedef 4.4.</b> Kuluçkadan yararlanan öğrenci sayısının artırılması
<b>Amaç -5. Üniversitenin bütün yerleşkelerinde kurumsal yapıyı güçlendirmek</b>
<b>Hedef 5.1.</b> Yerleşkelerin altyapı ve fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi
<b>Hedef 5.2.</b> Yönetim bilgi sisteminin bütünüyle hayata geçirilmesi
<b>Hedef 5.3.</b> Kurumsal aidiyeti geliştirmek
<b>Hedef 5.4.</b> Kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi
<b>Hedef 5.5.</b> Yerleşkelerin ekolojik bilinçle yeniden yapılanması

## 2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ankara Üniversitesi'nin 2018 Yılı Yatırım Programında toplam 21 adet proje için 185.250.000,00 TL kaynak öngörülmüştür. Diğer taraftan gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu itibariyle 248.643.500,83 TL kaynak olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 1.711.000,00 TL'si öz gelir, 23.366.883,70 TL'si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 5.820.000,00 TL'si döner sermaye, 405.000,00 TL hibe, 217.340.617,13 TL'si hazine yardımı olarak finanse edilmiştir.

**Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılımı**

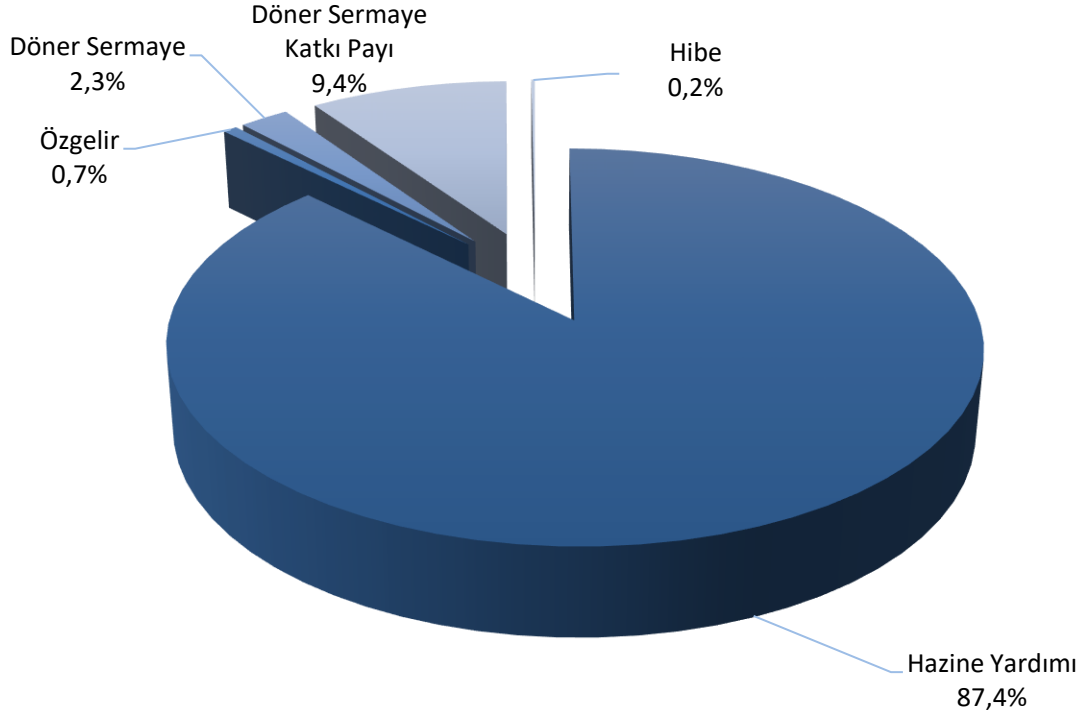

2018 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 6 adet proje için 44.998.000,00 TL kaynak ayrılmış olup 516.000,00 TL'sinin öz gelirlerle, 44.482.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile ve 54.000,00 TL'sinin ise hibe olarak finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kültür sektörü kapsamında ise biri etüt proje olmak üzere 3 adet projeye yer verilmiştir ve projeler için toplam 20.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sağlık Sektöründe ise 3 adet proje için toplam 74.149.000,00 TL kaynak tahsis edilmiş olup; 5.820.000,00 TL'sinin döner sermaye kaynakları, 351.000,00 TL hibe ve 67.978.000,00 TL'sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 8 adet proje için 44.049.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; 9.010.000,00 TL'sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 35.039.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılabilir Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5.

Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

**Tablo-3 2018 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)**

PROJE NO	PROJE ADI	2018 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI				
			ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE	DÖNER SERMAYE KATKI PAYI	HAZİNE YARDIMI	HİBE/DIŞ ÖZKAYNAK
<b>ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM</b>		<b>185.250</b>	<b>516</b>	<b>5.820</b>	<b>9.010</b>	<b>169.499</b>	<b>405</b>
<b>DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR</b>		<b>44.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.010</b>	<b>35.039</b>	<b>0</b>
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	300				300	
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	29.990				29.990	
2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	300				300	
2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	1.065				1.065	
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	2.374				2.374	
2017K120160	Kök Hücre Araştırma Merkezi	1.000				1.000	
2017K120770	Kolorektal Kanseri İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	10				10	
2018K120720	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	9.010			9.010		
<b>EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM</b>		<b>45.052</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.482</b>	<b>54</b>
2018H032390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500				500	
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	6.000				6.000	
2018H030290	Muhtelif İşler	7.568	516			6.998	54
2013H030660	Büyük Onarım	20.484				20.484	
2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	4.000				4.000	
2018H032410	Yayın Alımı	6.500				6.500	
<b>EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
2018H050910	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000				2.000	
<b>EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	1.000				1.000	
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	18.000				18.000	
2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler	1.000				1.000	
<b>SAĞLIK</b>		<b>74.149</b>	<b>0</b>	<b>5.820</b>	<b>0</b>	<b>67.978</b>	<b>351</b>
2011I000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	500				500	
2017I000090	Muhtelif İşler	37.671		5.820		31.500	351
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	35.978				35.978	

### 3.MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

#### a) İnsan Kaynakları


Ankara Üniversitesinde 2018 yılsonu itibarıyla 3.647 akademik, 2 2547/30 madde kapsamında sözleşmeli akademik, 70 yabancı uyruklu akademik, 107 sözleşmeli öğretici, 348 Üniversitemize 2547/35 madde ile görevlendirilen akademik personel, 4.691 kadrolu idari, 540 sözleşmeli idari ve 2018 yılında taşeron çalışanların kadroya alınması sonrasında sürekli işçi sayısında yaşanan değişim ile 2.239 (1210'u sürekli 29'u geçici) işçi olmak üzere toplamda 11.644 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %35,8'i akademik, %64,2'si idari personel ve işçiler oluşturmaktadır.

**Tablo-4 2016-2018 Yılları Personel Sayıları**

Personel Sınıfı	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2018 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Kadrolu Akademik Personel	3.565	3.508	3.647	4,0
2547/30 Md. Kapsamında Sözleşmeli Akademik Personel			2	
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	74	58	70	20,7
Sözleşmeli Öğretici Personel	146	118	107	-9,3
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2547/35)	646	524	348	-33,6
İdari Personel (Kadrolu)	4.957	4.809	4.691	-2,5
Sözleşmeli İdari Personel	354	405	540	33,3
İşçi (Sürekli+Geçici)	162	152	2.239	1.373,0
<b>Toplam</b>	<b>9.904</b>	<b>9.574</b>	<b>11.644</b>	<b>21,6</b>

*Kaynak: Personel Daire Başkanlığı*

**Grafik-2 2018 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı**



2018 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %4 oranında artış göstermiştir. En büyük artış %8,3 ile araştırma görevlisi kadrosunda görülmektedir. Diğer akademik personel sayıları karşılaştırıldığında doçent kadrosunda %2,1 azalış yaşanırken profesör kadrosunda %2,8 oranında artış yaşanmıştır.


2018 yılsonu 1.803 öğretim üyesinin, %45,4'ü kadın, %54,6'sı erkek, toplam akademik personelin ise %51,6'sı kadın, %48,4'ü erkek akademik personel oluşturmaktadır.

**Tablo-5 2016-2018 Yılları Akademik Personel Kadro Dağılımı**

Personel Sınıfı	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2018 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Profesör	1.225	1.194	1.228	2,85
Doçent	309	288	282	-2,08
Doktor Öğretim Üyesi	307	294	293	-0,34
Öğretim Görevlisi	584	612	631	3,10
Araştırma Görevlisi	1.140	1.120	1.213	8,30
<b>Toplam</b>	<b>3.565</b>	<b>3.508</b>	<b>3.647</b>	<b>3,96</b>

*Kaynak: Personel Daire Başkanlığı*

**Grafik-3 2018 Yılı Akademik Personel Kadro Dağılımı**




2018 yılı itibarıyla tahsis edilen 4.691 adet dolu kadro sayısının %53,3'ünü kadın, %46,7'sini erkek personel oluşturmaktadır. Dolu kadro sayısı bir önceki yıla oranla %2,5 oranında azalma göstermiştir.

**Tablo-6 2015-2017 Yılları İdari Personel Kadro Dağılımı**

Personel Sınıfı	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2018 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Genel İdari	2.171	2.106	2.078	-1,33
Teknik	498	491	485	-1,22
Sağlık	1.711	1.663	1.614	-2,95
Eğitim-Öğretim	1	1	1	0,00
Avukatlık	5	4	2	-50,00
Din	3	3	2	-33,33
Yardımcı	568	541	509	-5,91
<b>Toplam</b>	<b>4.957</b>	<b>4.809</b>	<b>4.691</b>	<b>-2,45</b>

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

**Grafik-4 2018 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı**





**b) Fiziksel Kaynaklar****b.1) Taşınmazlar**

Ankara Üniversitesi, Ankara ili sınırları içinde 31, diğer illerde 5 olmak üzere toplam 36 yerleşkeye yayılmış; 18 fakülte, 14 enstitü, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 46 araştırma ve uygulama merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği Rektörlük binasında, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Beşevler 10 Yıl Yerleşkesinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ise Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

**Tablo-7 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar**

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m <sup>2</sup> )	Toplam Bina/Tesis Alanı (m <sup>2</sup> )
Beşevler	231.184	135.599
Diş Hekimliği	17.505	52.695
İlahiyat	12.020	15.136
Cebeci	78.359	87.408
Cebeci 30. Yıl	5.010	3.226
Cebeci Tıp	114.200	137.394
Gümüşdere 60. Yıl	22.300	13.489
Gümüşdere Ziraat	392.249	67.133
Dışkapı Yerleşkesi	100.606	64.987
Gölbaşı 50. Yıl	712.923	146.437
Keçiören Yerleşkesi	24.480	15.258
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sıhhiye	19.125	33.115
Demirlibahçe Sağlık Bilimleri	435	5.503
Sıhhiye Tıp	82.163	160.387
Cevizlidere Kök Hücre	4.474	3.562
Beypazarı	517.798	10.704
Kalecik Meslek Yüksekokulu	34.230	3.230
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	6.422	3.853
Haymana Meslek Yüksekokulu	560	3.720
Nallıhan Meslek Yüksekokulu	2.680	2.507
Ayaş Meslek Yüksekokulu	6.298	1.554
Kızılcahamam	16.758	1.269
Manavgat ÖRSEM	21.843	9.194
İlgaz ÖRSEM	5.436	6.791
Elmadağ ÖRSEM	10.838	777
Didim ÖRSEM	36.977	14.097
Gölbaşı ÖRSEM	45.600	1.893
<b>Sayfa Toplamı</b>	<b>2.522.473</b>	<b>1.000.918</b>

**Tablo-7 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (Devamı)**

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m <sup>2</sup> )	Toplam Bina/Tesis Alanı (m <sup>2</sup> )
<b>DEVİR TOPLAMI</b>	<b>2.522.473</b>	<b>1.000.918</b>
Urla Yerleşkesi	146.700	1.667
Bağlıca 70. Yıl Yerleşkesi	2.405.803	23.149
Ahlatlıbel 20. Yıl	122.908	18.061
Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama Kazan	2.395.445	18.217
Ziraat Fakültesi Haymana Çiftlik	4.973.710	20.257
Ziraat Fakültesi Ayaş	416.145	2.616
Kalecik Bağcılık	198.423	409
Çifteler	108.952	2.150
Maltepe A.Ü. Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)	600	2.315
Beyazarı Abbaslar Konak	484	644
ANKEV	505	813
ANKÜSEV	651	1.001
Vehbi Koç Yurdu	2.686	5.387
Gölbaşı Öğrenci Yurdu	251.313	62.304
Gölbaşı Teknokent	115.103	19.849
Teknokent Keçiören	22.996	2.291
Şaraphane Keçiören	1.130	1.149
Yüksek İhtisas Yerleşkesi	23.514	47.254
Çankaya Konut+Kongre Arası	44.338	0
<b>Toplam</b>	<b>13.753.879</b>	<b>1.230.451</b>

**Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**

2018 yılında Didim ÖRSEM ile Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binasının tamamlanması ve Gümüşdere Yerleşkesi Ziraat Fakültesine depo alanı yapımı ile 2018 yılı toplam kapalı alan bir önceki yıl kıyasla %1,34 oranında artmıştır.

**Tablo-8 Taşınmazlara 2018 Yılında Yapılan İlaveler**

<b>2017 Yıl Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m<sup>2</sup>)</b>		<b>1.214.230,52</b>
Didim Örsem Yerleşkesi	Didim ÖRSEM	<b>14.097,00</b>
Kızılcahamam Yerleşkesi	Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	<b>1.269,00</b>
Gümüşdere Ziraat Yerleşkesi	Ziraat Fakültesi Depo Alanı	<b>854,00</b>
<b>2018 Yıl Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m<sup>2</sup>)</b>		<b>1.230.450,52</b>
<b>Değişim Oranı</b>		<b>1,34%</b>

**Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**

Ankara Üniversitesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Üniversite bazında toplam 74 amfide eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Toplam amfinin %87,8'i fakültelerde, %12,2'si Devlet Konservatuvarında bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesinde 2018 yılı itibarıyla 846 sınıfta eğitim-öğretim yapılmıştır. Toplam sınıfın %51,4'ü fakültelerde, %22,2'si yüksekokullarda, %17,6'sı araştırma ve uygulama merkezlerinde, %6,9'u Devlet Konservatuvarında, %1,3'ü enstitülerde ve geri kalan %0,6'sı da uygulama merkezleri ile eğitim merkezlerinde bulunmaktadır.

Öğrencilerin uygulama yapmak amacıyla kullandığı 43 atölyenin %46,5'i fakültelerde, %34,9'u yüksekokullarda, %9,3'ü enstitülerde, %7'si uygulama merkezlerinde, geri kalan %2,3'ü de araştırma ve uygulama merkezlerinde bulunmaktadır. Ayrıca toplam 654 laboratuvarın %41,4'ü eğitim, %0,3'ü sağlık, %58,3'ü araştırma laboratuvarlarından oluşmaktadır.

**Tablo-9 Eğitim ve Uygulama Alanları**

KAPASİTE (m2)	AMFİ	SINIF	ATÖLYE	LABORATUVARLAR	TOPLAM
0-50	10	623	41	595	1.269
51-75	0	93	1	32	126
76-100	3	79	1	22	105
101-150	24	39	0	3	66
151-250	19	9	0	0	28
251-Üzeri	18	3	0	2	23
<b>TOPLAM</b>	<b>74</b>	<b>846</b>	<b>43</b>	<b>654</b>	<b>1.617</b>

*Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu*

Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 6 adet öğrenci evi, ayrıca Gölbaşı Yerleşkesi Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası ile öğrencilerimize barınma hizmeti sunulmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla Fahriye Özaka ile Keçiören Öğrenci Evine öğrenci alımı yapılmamıştır.

**Tablo-10 Öğrenci Evleri Kapasiteleri**

ÖĞRENCİ EVİ	ALAN (m <sup>2</sup> )	KAPASİTE (Kişi)
Cumhuriyet Öğrenci Evi	5.972	172
Fahriye Özaka Öğrenci Evi	1.670	100
Keçiören Öğrenci Evi (A Blok)	2.119	52
Keçiören Öğrenci Evi (B blok)	477	45
Milli Piyango Öğrenci Evi	10.700	372
Vehbi Koç Öğrenci Evi	4.698	200
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	4.439	160
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	5.145	234
Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası	1.570	47
<b>TOPLAM</b>	<b>36.790</b>	<b>1.382</b>

*Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı*

Beşevler 10. Yıl Yerleşkesinde 23 kişilik, 512 m2 alana sahip AKKEM Konukevi ve Cebeci Yerleşkesinde yer alan Milli Piyango Öğrenci Evi içerisinde 24 kişilik, 333 m2 alana sahip misafirhane ile toplam 2 misafirhane 47 kapasite ile hizmet vermektedir. Ayrıca Gümüşdere Yerleşkesinde yardımcı hizmetli personelin yararlandığı 2 bina 20 daireden oluşan lojman bulunmaktadır.

**Tablo-11 Misafirhane ve Lojmanlar**

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m <sup>2</sup> )	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Misafirhaneler	845	2	47
Lojmanlar	1.780	2	-
<b>TOPLAM</b>	<b>2.625</b>	<b>4</b>	<b>47</b>

*Kaynak: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu*

Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere toplam 49 adet yemekhane, bunun yanı sıra 55 adet kantin/kafeterya ile 5 adet restoran bulunmaktadır.

**Tablo-12 Yemekhane, Kantin/Kafeteryalar ve Restoranlar**

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m <sup>2</sup> )	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	14.486,69	49	9.918
Kantin / Kafeteryalar	7.041,19	55	5.212
Restoran	1.004,75	5	840

*Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu*

**Tablo-13 Toplantı ve Konferans Salonları**

KAPASİTE (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	TOPLAM
0-50	162	15	<b>177</b>
51-75	18	5	<b>23</b>
76-100	4	5	<b>9</b>
101-150	3	5	<b>8</b>
151-250	1	6	<b>7</b>
251-Üzeri	0	11	<b>11</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>188</b>	<b>47</b>	<b>235</b>

*Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu*

İletişim Fakültesinde 2, Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 adet olmak üzere toplam 3 sinema salonu, Ziraat Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 1'er olmak üzere toplam 2 adet tiyatro salonu, Devlet Konservatuvarında 1 adet konser salonu, Eczacılık Fakültesinde el sanatları salonu, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinde Oyuncak Müzesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü binasında Herbarium Müzesi, Veteriner Fakültesi 2 adet, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü bünyesinde 1'er adet olmak üzere toplamda 9 adet müze bulunmaktadır.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde tiyatro, müzik, sinema gösterimi vb. amaçlar için kullanılmak üzere 69,82 m<sup>2</sup> lik çok amaçlı tesis, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde de 21,50 m<sup>2</sup> lik çok amaçlı salon bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde Üniversite amblemi bulunan ürünlerin satışının gerçekleştiği 33 m<sup>2</sup> lik bir satış yeri ile 51,7 m<sup>2</sup> lik Ziraat Fakültesi ürünlerinin satış ve sunum yeri de Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Açıklık kursu yeri ANKEV'de, kitap satış yeri de Hukuk Fakültesi ve Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır.

İbn-i Sina Hastanesi poliklinikler girişinde ve Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Tesislerinde 1'er kuaför, Siyasal Bilgiler Fakültesinde de 1 adet berber bulunmaktadır.

İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi ile Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde 1'er market bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra Ayaş, Kalecik ve Haymana'da öğrencilerimizin kullanımına yönelik sosyal tesisler bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli fakülte, enstitü ve yüksekokullarında okuma salonları, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde de mescit bulunmaktadır.

**Tablo-14 Diğer Sosyal Alanlar**

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m <sup>2</sup> )	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Sinema Salonu	413	3	390
Tiyatro Salonu	471	2	270
Konser Salonu	385	1	200
Müze	2.330	9	-
Okuma Salonu	4.014	22	1.842
Çok Amaçlı Salon	91	2	95
Dans Atölyesi	55	1	10
Drama Salonu	110	1	80
El Sanatları Salonu	130	1	9
Yaratıcı Drama Atölyesi	68	1	30
Aşçılık Kursu Yeri	165	1	-
Öğrenci Sosyal Alanı	20	1	30
Sosyal Tesis (Ayaş,Haymana,Kalecik)	2.329	3	150
Öğrenci Kulüpleri	431	11	-
Kitap Satış Yeri	100	1	-
Ürün Satış Yeri	85	2	-
Berber	7	1	-
Kuaför	40	2	-
Market	1.339	3	-
Mescit	1.139	22	1.120
<b>TOPLAM</b>	<b>13.721</b>	<b>90</b>	<b>4.226</b>

*Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu*

Ankara Üniversitesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine mesleki alanlarına göre araştırma ve uygulama yapma imkanı sunmaya devam etmektedir.

**Tablo-15 Araştırma Uygulama Alanları**

ALAN ADI	Arsa/Arazi Alanı (m <sup>2</sup> )	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	ADET
Araştırma Uygulama Çiftliği	8.092.675,00	43.649,00	5
Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri	120.694,00	32.752,00	5
Kütüphane	-	18.429,83	31

*Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu*

Tablo-16 Spor Alanları

Birim Adı	Kapalı Spor Tesisleri			Açık Spor Tesisleri		
	Spor Dalı	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Spor Dalı	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )
Tıp Fakültesi				Tenis Kortu	1	648
				Basketbol-Voleybol	1	480
Eczacılık Fakültesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	130			
Veteriner Fakültesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	62	Basketbol	1	362
Ziraat Fakültesi	Basketbol	1	880	Tenis Kortu	2	1.625
				Futbol (Toprak+Halı)	2	2.350
Siyasal Bilgiler Fakültesi	Basketbol-Voleybol-Hentbol vb.	1	547			
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi				Basketbol-Voleybol	1	1.000
Spor Bilimleri Fakültesi	Genel Amaçlı Salon	1	2.200	Futbol	1	
	Güreş ve Uzakdoğu Sporları	1	206			
	Jimnastik	1	200			
	Ritm Eğitimi	1	100			
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu				Voleybol	1	162
Kalecik Meslek Yüksekokulu				Basketbol-Voleybol	1	720
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	Masa Tenisi (1), Bilardo (1) ve Langırt (1) Alanı	3	138	Basketbol	1	230
				Voleybol	1	230
Beypazarı Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	375
				Voleybol	1	300
İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	180			
Ziraat Uygulama Merkezi				Basketbol-Voleybol	2	700
Gümüşdere Yerleşkesi				Basketbol	1	50
Tandoğan Yerleşkesi	Tenis Kortu	1	648	Tenis Kortu	5	2.486
	Fitness Egzersiz Salonu	2	250	Basketbol	2	1.607
	Yüzme Havuzu	1	3.510	Voleybol	1	275
	Spor Salonu	1	1.082	Plaj Voleybol-Hentbol	1	594
				Futbol	1	1.485
Cebeci Yerleşkesi	Spor Eğitim Merkezi	1	2.045			
Dışkapı Yerleşkesi	Dışkapı Spor Salonu	1	1.250			
Keçiören Yerleşkesi	Keçiören Spor Salonu	1	400			
Gölbaşı Su Sporları Eğitim Merkezi		1	6.000			

Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-17 Hastane Alanları

Alan Adı	İbn-i Sina Uyg. ve Arş. Hastanesi	Cebeci Uyg. ve Arş. Hastanesi	Diş Hekimliği Fak. ve Diş Hekimliği Uyg. Hastanesi	TOPLAM
Acil Servis	1	1	2	4
Yoğun Bakım	8	6	0	14
Ameliyathane	26	26	2	54
Poliklinik	24	176	0	200
Klinik	18	25	15	58
Laboratuvar	6	6	16	28
Eczane	1	1	0	2
Radyoloji Alanı	46	58	6	110
Nükleer Tıp Alanı	1	16	0	17
Sterilizasyon Alanı	1	5	14	20
Mutfak	1	1	2	4
Çamaşırhane	1	0	1	2
Teknik Servis	9	1	5	15
Adli Tıp	0	1	0	1
Morg	1	1	0	2
Hasta Bekleme Alanı	35	35	1	71
Kan Merkezi	1	1	0	2
<b>TOPLAM</b>	<b>180</b>	<b>360</b>	<b>64</b>	<b>604</b>

Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-18 Hayvan Sağlığı Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m <sup>2</sup> )	ADET
Acil Servis	1	164
Ameliyathane	7	227
Klinik	18	293
Laboratuvar	1	103
Radyoloji Alanı	1	141
<b>TOPLAM</b>	<b>28</b>	<b>928</b>

Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-19 Ambar ve Arşiv Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m <sup>2</sup> )	ADET
Ambar Alanı	101	7.459,30
Arşiv Alanları	156	8.116,50
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	587	28.404,60
<b>TOPLAM</b>	<b>844</b>	<b>43.980,40</b>

Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

**b.2) Taşınır**

Aşağıda verilen tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. 2018 yılsonu itibarıyla, I. düzeyde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda toplam 65.089, 254 Taşıtlar grubunda toplam 516 ve 255 Demirbaşlar grubunda da 316.629 adet taşınır kayıtlıdır.

**Tablo-20 2018 Yılsonu İtibariyle Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayısı**

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınır	Ölçü Birimi	2018 Yılı
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	63.056
254	Taşıtlar Grubu	Adet	522
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	323.208

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**Tablo-21 Taşıtlar Grubu**

Taşıtların Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Toplam
Otomobiller (Binek)	19	37	56
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs)	21	0	21
Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon)	18	0	18
Hafif Ticari Araç	1	3	4
Arazi Taşıtları	2	0	2
Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler)	8	0	8
Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork)	420	0	420
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)	9	0	9
Botlar	8	0	8
Yelkenliler	7	0	7
Kanolar ve Kayıklar	9	0	9
<b>Toplam</b>	<b>522</b>	<b>40</b>	<b>562</b>

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üniversitemizin ağ altyapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahiptir. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan tüm toplanma noktalarına fiber optik kablo çekilmiş ve tüm kullanıcılara aktif ağ ucu sağlanmıştır. Üniversitemiz 2 Gbps hızında metro ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahiptir.

**Tablo-22 Teknolojik Kaynaklar (2016-2018)**

	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı
Sunucular	290	298	356
Masaüstü Bilgisayar	13.741	14.107	14.463
Taşınabilir Bilgisayar	4.615	4.769	4.761
Tablet Bilgisayar	1.610	1.529	1.372
Cep Bilgisayar	201	247	244

Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu



**Tablo-23 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2016-2018)**

	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı
Projeksiyon	1.902	1.922	2.037
Tepegöz	312	277	255
Barkot Okuyucu	146	139	151
Yazıcı	5.287	5.553	5.763
Baskı Makinesi	32	31	31
Fotokopi Makinesi	260	252	250
Faks	154	139	133
Fotoğraf Makinesi	392	405	396
Kameralar	2.240	2.002	2.131
Televizyonlar	2.643	2.678	2.787
Tarayıcılar	641	653	541
Müzik Setleri	443	433	430
Mikroskoplar	2.555	2.550	2.534
DVD'ler	185	207	211
Akıllı Tahta	1.341	1.397	1.502

**Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Birim Faaliyet Raporları**

2018 yılında birimlerden gelen kitap talepleri doğrudan temin ve ihale yöntemiyle alınmış olup, 2.459 Türkçe, 1.311 yabancı dilde olmak üzere toplam 3.770 adet kitap alınmıştır. Ayrıca e-kitap olarak 26.279 adet kitap sağlanmıştır. Toplam sağlanan kaynak sayısı 317.090'dır. Bunların dağılımı Tablo 24'te gösterilmiştir.

**Tablo-24 Kütüphane Kaynakları**

	2018 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	3.770	26.279	30.049	825.205	317.090	1.142.295
Dergi Aboneliği Sayısı	0	0	0	0	41.406	41.406
Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı*	163	157	320	163	157	320
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	0	10	10	0	105	105
Yazma Eser	0	0	0	17.000	0	17.000
<b>Toplam</b>	<b>3.933</b>	<b>26.446</b>	<b>30.379</b>	<b>842.368</b>	<b>358.758</b>	<b>1.201.126</b>

**Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu**

**Tablo-25 Alınan Kitapların Birimler İtibari İle Dağılımı**

Birimler	Türkçe	Yabancı Dil	Toplam
Adalet Meslek Yüksekokulu	190	-	190
Adli Bilimler Enstitüsü	-	11	11
Diş Hekimliği Fakültesi	2	19	21
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi	264	140	404
Eczacılık Fakültesi	31	16	47
Eğitim Bilimleri Fakültesi	62	37	99
Fen Fakültesi	2	23	25
Güzel Sanatlar Fakültesi	13	8	21
Hukuk Fakültesi	347	158	505
İlahiyat Fakültesi	-	186	186
İletişim Fakültesi	26	97	123
Mühendislik Fakültesi	1	67	68
Sağlık Bilimleri Fakültesi	302	3	305
Beyazırma Meslek Yüksekokulu	24	7	31
Siyasal Bilgiler Fakültesi	924	64	988
Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi	-	77	77
Tıp Fakültesi	52	69	121
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	10	5	15
Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)	14	73	87
Veteriner Fakültesi	11	10	21
Kök Hücre Enstitüsü	-	13	13
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	7	-	7
Nallıhan Meslek Yüksekokulu	18	3	21
Nükleer Bilimler Enstitüsü	-	21	21
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü	15	-	15
Uygulamalı Bilimler Fakültesi	-	104	104
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	48	48
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7	-	7
Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi	-	12	12
Ziraat Fakültesi	101	14	115
Haymana Meslek Yüksekokulu	9	-	9
<b>Toplam</b>	<b>2.459</b>	<b>1.311</b>	<b>3.770</b>

**Kaynak: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu**

## 4.2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2018 Yılı Yatırımları

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Sağlık	2017I000090	Muhtelif İşler	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında büyük onarımının yapılması ve hastanelerin muhtelif makine-teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında 20 Adet büyük bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir ve muhtelif makine-teçhizat ihtiyaçları ödenekler sınırında karşılanmıştır.
Sağlık	2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	Yapım İşine İlişkin Etüt Projelerin tamamlanarak ihale edilmesi planlanmıştır.	Yapım işi ihale edilememiştir.
Sağlık	2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatının tamamlanması ve ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımlarının yapılması planlanmıştır.	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatın devam etmektedir ve makine-teçhizat alımlarının ödenek kısıtı altında bir kısmı gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2018H032390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Bağlıca Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Etüt ve Proje Hizmet Alımı İşi ile Muhtelif Etüt Projelerin yapılması planlanmıştır.	12 adet etüd proje hizmeti alınmıştır.
Eğitim	1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	Didim Örsem Uluslararası Gençlik Merkezi Binası (2014-2015-2016-2017 Yıllarına Sari) Yapım İşinin Namı Hesabına Yapılması Ve İlave İşler Yapım İşi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kazan Uygulama Ve Araştırma Çiftliği 2-6 Aylık Buzağı Ahır Yapım Ve Muhtelif Mahaller Tadilat İş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mimari Rölöve Projeleri Hazırlanması İşlerinin Yapılması Planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2013H030660	Büyük Onarım Projesi	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Bakım Onarımının Yapılması Planlanmıştır.	Proje kapsamında 64 Adet Bakım Onarım İş Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi için kullanılacak sistemlerin yedek parçalarının alınması, gerekli sunucu, veri depolama ünitesi, veri güvenliği ve erişim güvenliği için gerekli cihazlar ve yüksek özellikli tarayıcıların alınması, gerekli yazılım ve lisanslarının satın alınması.	Proje kapsamında mevcut ödenek kısıtı altında bilgi yönetim sistemi için gerekli olan alımlar ihtiyaca binaen gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2018H030290	Muhtelif İşler	Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tablet Bilgisayar, Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazları ile Muhtelif Demirbaşların ve Makine Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2018H032410	Yayın Alımı	Üniversitemiz kütüphane basılı, elektronik, süreli yayın alımı ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje kapsamında mevcut ödenekleri çerçevesinde süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliği ve kitap alımları gerçekleştirilmiştir.

Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2018 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Kültür	2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	A.Ü. Keçiören Tescilli Atatürk Evine Ait Röleve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İle A.Ü. Tescilli Fen Fakültesi A-B Blok Cephelerine Ait rölove, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	Hedeflenen kapasite gerçekleşmiştir.
Kültür	2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Acil Restorasyon ve Uygulama İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Restorasyonlarının Yapılması Planlanmıştır.	Proje kapsamında 10 Adet Restorasyon uygulama ve 2 adet proje işi gerçekleştirilmiştir.
Kültür	2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler	Yazma ve Nadir Eserlerin korunması için gerekli ortamın sağlanması ve kataloglama işlemlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	Gerekli bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilmiş, kapılar değiştirilmiş ve iklimlendirme sistemleri kurulmuştur. 2019 yılında kataloglama işlemleri gerçekleştirilecektir.
Beden Eğitimi ve Spor	2018H050910	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi 2.Etap Spor Kompleksi Projelerin Hazırlanması, Olimpik Yüzme Havuzu Soyunma Odaları Yapımı ile A.Ü. Didim Yerleşkesi ne Voleybol Sahası Yapılması İçin Montajlı Malzeme Alımı	Hedeflenen kapasite gerçekleşmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Projenin ihtiyacı olan Süperiletken Kuantum Girişim Cihazlı Titreşimli Örnek Magnetometresi'nin alınımının yapılması ve proje kapsamında binası tamamlanan merkezimizde kurumsal işlemlerin ve laboratuvar çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması için gerekli insan gücü ve ekipman eksiklerinin tamamlanması hedeflenmektedir.	Projenin ihtiyacı olan Süperiletken Kuantum Girişim Cihazlı Titreşimli Örnek Magnetometresi'nin alınımına ilişkin yaşanan probleme ilişkin mahkeme süreci devam etmektedir. Önceki raporlarda da belirttiğimiz gibi Ankara Üniversitesi hukuk müşavirliği nezdinde firma ile görüşmeler devam etmektedir. En son olarak Mayıs 2017'de firma teknik ziyarette bulunmuştur. Proje kapsamında mevcut ödenekler insan gücü ve ekipman sıkıntısını tamamlama konusunda yetersiz kalmaktadır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	*Helyum soğutma sisteminin işleme alınması *Enjektör sisteminin işleme alınması *Süperiletken hızlandırıcı modüllerinin kabul testlerinin tamamlanması *Kurulumu başlayan temiz oda sisteminin tamamlanması *Pompa-Sonda Deney Odası sisteminin kurulması *Infrared Spektroskopi Laboratuvarının kurulması	*Helyum sistemi şubat 2019 itibari ile işleme alınmıştır. *Enjektör sistemi çalıştırılmaya başlanmış, aşama aşama devreye alma işlemleri devam etmektedir. *Süperiletken hızlandırıcı modüllerinin kabul testleri 2019 Mart ayı içerisinde tamamlanacaktır. *Modüllerin yan sistemi olan yüksek güç RF yükselteçler (18 Kw) başarılı bir şekilde devreye alınmıştır. *Temiz oda sisteminin kurulumu tamamlanmış, yeterlilik testlerinin yapılması beklenmektedir. Pompa Sonda lazer sisteminin temini ve teslimatı yapılmıştır. *Infrared Lazer Sistemi temin edilmiş, kurulmuş ve kullanıcıya hizmet vermeye başlamıştır.

Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2018 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi	LA-LIBS-ICP-MS Flouresans Mikroskop TIMA Sistemi Ergiyik Kapanım Sistemi	LA-LIBS-ICP-MS
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2016K120160	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	Kordon kanı bankası laboratuvar tadilatı ve insan göbek kordon kanı kök hücre ekspansiyon sistemi cihazı alımı ile hayvan deneylerinin yapılacağı laboratuvarın hizmete girmesi hedeflenmiştir.	Hedeflenen kapasite %80 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	Kök hücre alanında, klinik uygulamalar ve araştırma çalışmalarında eksikliği doldurmak	Klinik uygulamalar alanında ve araştırma hedefine gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2018 yılında büyük oranda ulaşılmıştır. Yapılması planlanan hayvan evi inşaatına başlanılamamıştır. Araştırma alt yapısı ile çeşitli Üniversitelere hizmet verilmeye başlanılmıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	Kök hücre alanında, klinik uygulamalar ve araştırma çalışmalarında eksikliği doldurmak amaçlanmaktadır.	İnşaat ihalesi yapılmış ve inşaat çalışması başlamıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K120770	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	Proje kapsamında ihtiyaç duyulan makine-teçhizatların alınması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2018K120720	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Tahsis edilen ödenek ile Üniversitemizde yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.	2018 yılında Üniversitemizde 527 adet Bilimsel Araştırma Projesi için özel hesaptan harcama yapılmıştır.

## 5. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


### a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. 2018 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 3 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için 67.978.000,00 TL hazine yardımı, 5.820.000,00 TL döner sermaye karşılığı ve 351.000,00 TL hibe olmak üzere toplam 74.149.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 17.108.666,23 TL Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi ihtiyacına kullanılmak üzere taahhüt artışı karşılığı, 3.800.000,00 TL likit karşılığı ödenek kayıtları ve 3.000.000,00 TL Hazine ve Maliye Bakanlığı yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarılan tutar ile sektör desteklenmiş ve toplam proje tutarı 98.057.666,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı ve makine-teçhizat alımları, hastanelerin büyük bakım onarımları ve makine teçhizat alımları kapsamında toplam 60.617.811,02 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Kalan ödeneğinde 31.121.154,79 TL'si Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatında kullanılmak üzere 5018 sayılı Kanununun 35 inci maddesi kapsamında taahhüt artışı olarak bir sonraki yıla devretmiştir.

**Tablo-27 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)**

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2015	26.000	33.242	14.466
2016	39.500	40.542	34.887
2017	70.734	81.571	57.627
2018	74.149	98.058	60.618

**Grafik-6 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)**

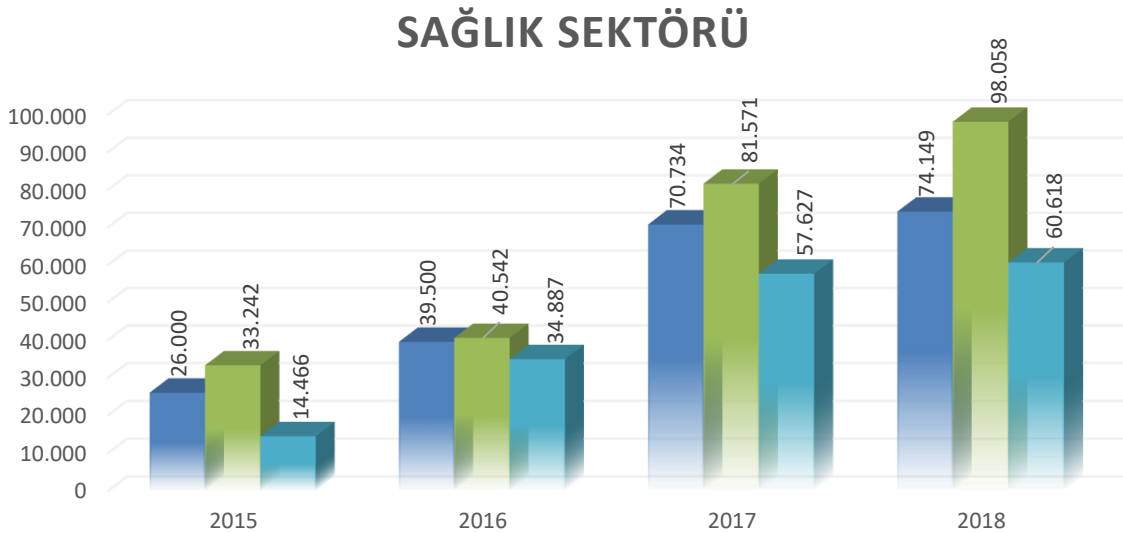


2018 yılında 3 adedi kültür sektöründe ve 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 10 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam 67.052.000,00 TL tutarında kaynak tahsis edilmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneğinde bir önceki seneye göre %16,6 oranında önemli bir artış olduğu görülmektedir.

Yıl içerisinde 2.092.450,90 TL taahhüt artışı karşılığı ve 13.035.500,00 TL likit karşılığı ödenek kayıtları, Hazine ve Maliye Bakanlığı yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarılan 3.000.000,00 TL ile projeler desteklenmiş ve revize ödenek toplamı 85.179.950,90 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı, çeşitli restorasyon işlerinin yapıldığı ve Didim Uluslar arası Gençlik Merkezi Binası ile Biyoteknoloji Enstitüsü İnşaatı işlerinin tamamlandığı görülmektedir. Diğer taraftan birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yayın alımları, bilişim malzemesi alımları ve makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.

**Tablo-28 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)**

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2015	38.209	51.096	46.523
2016	49.000	60.174	55.410
2017	57.500	61.341	58.381
2018	67.052	85.180	82.194

**Grafik-7 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)**

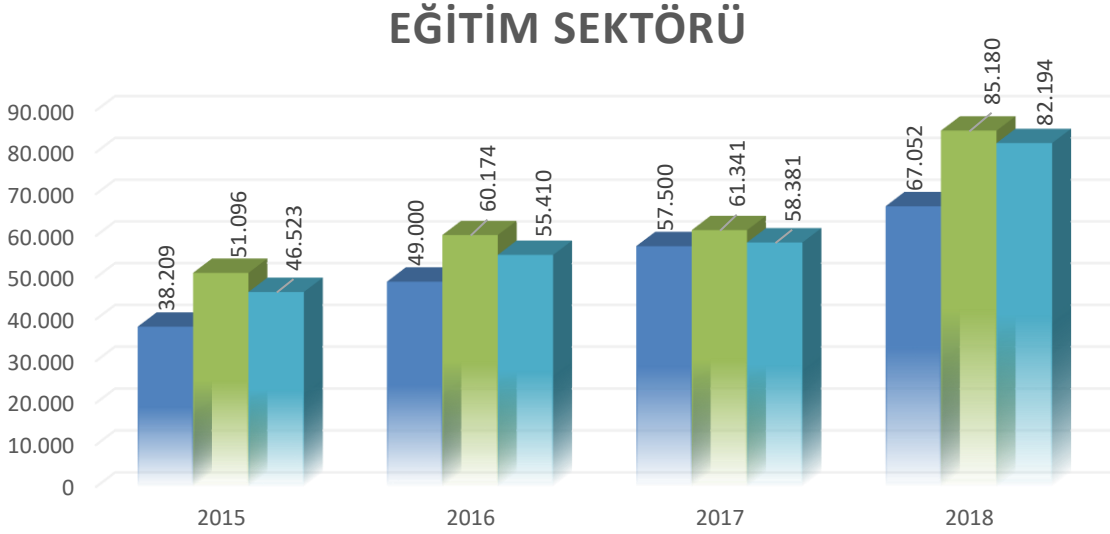

2018 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 8 adet proje için toplam 44.049.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden 5.000.000,00 TL kaynak Hibrid Dijital Anjiyografi Sistemi kurulması için aktarılmıştır. Diğer taraftan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine yıl içerisinde gelir fazlası karşılığı olarak toplam 14.356.883,70 TL ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Projesine 2.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.


Bilindiği üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

**Tablo-29 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)**

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2015	28.010	37.934	37.934
2016	51.655	74.084	74.084
2017	49.820	80.501	80.501
2018	44.049	65.406	65.406

**Grafik-8 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)**

### (DKH) SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ

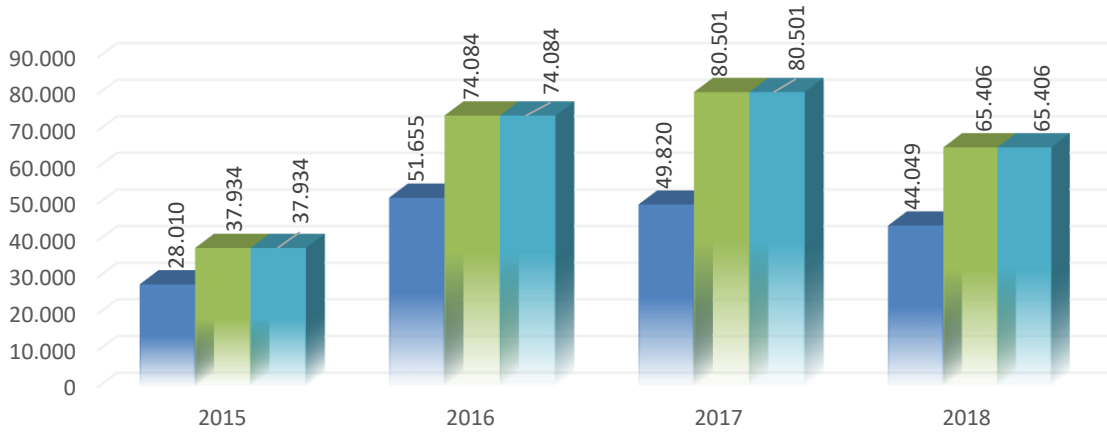



Tablo-30 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Sonu Kümülatif Harcama	2018 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2018 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	18.549	18.249	300			300	300	18.549
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	211.972	67.194	29.990			29.990	6.393	73.587
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk.	12.115	11.815	300			300	3.415	15.230
2016K120160	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme Altyapısı	3.460	2.395	1.065			1.065	860	3.255
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	19.609	17.235	2.374	5.000		7.374	15.246	32.481
2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	30.000	6.000	1.000	2.000		3.000	6.992	12.992
2017K120770	Kolorektal Kanseri İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	28.648	13.930	10			10	776	14.706
<b>KB Destekli Projeler Toplamı</b>		<b>324.353</b>	<b>136.818</b>	<b>35.039</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>42.039</b>	<b>33.982</b>	<b>170.800</b>
2018K120720	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri*	9.010	0	9.010	14.357		23.367	14.842	14.842
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>333.363</b>	<b>136.818</b>	<b>44.049</b>	<b>21.357</b>	<b>0</b>	<b>65.406</b>	<b>48.824</b>	<b>185.642</b>

(1) Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır.

(2) Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.

2018 yılı yatırım programında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe toplam 8 adet proje için 35.039.000,00 TL hazine yardımı ve 9.010.000,00 TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 44.049.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 21.356.883,70 TL ekleme işlemi ile toplam ödenek 65.405.883,70 TL'ye ulaşmıştır. Ödenğin tamamı özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 48.823.216,57 TL harcanmıştır.

**Tablo-31 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)**

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Sonu Kümülatif Harcama	2018 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2018 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2018H050910	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000	0	2.000		1.400	600	553	553
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	20.500	11.500	6.000	5.907		11.907	11.907	23.407
2018H032390	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	500	0	500	535		1.035	1.034	1.034
2013H030660	Büyük Onarım	118.000	95.500	20.484	7.406	360	27.530	27.529	123.029
2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç.	10.000	0	500		500	0	0	0
2017I000090	Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	57.241	34.570	22.320	5.985		28.305	22.485	57.055
2014I000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	63.000	40.000	23.000	17.109	485	39.624	8.502	48.502
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	4.495	1.495	1.000		200	800	743	2.238
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	53.072	3.072	18.000	710		18.710	18.674	21.746
2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler	300	0	300		74	226	226	226
<b>TOPLAM</b>		<b>329.108</b>	<b>186.137</b>	<b>94.104</b>	<b>37.652</b>	<b>3.019</b>	<b>128.737</b>	<b>91.653</b>	<b>277.790</b>

(1) 5.820 (bin tl) döner sermaye toplama dahil edilmiştir.

Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 7 adet, sağlık sektöründe 3 adet olmak üzere, toplam 10 adet proje için 2018 yılı programında toplam 94.104.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından etüt, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği 128.737.264,13 TL olmuştur. Ödeneğin 91.653.453,11 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %71,19'dur.

**Tablo-32 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 YTL)**

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Sonu Kümülatif Harcama	2018 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2018 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2018H030290	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim)	5.516	0	5.516	1.880		7.396	7.320	7.320
2018H032410	Yayın Alımı	6.500	0	6.500	1.000		7.500	7.228	7.228
2018H030290	Muhtelif İşler (Bil.Teknoloj.)	1.998	0	1.998			1.998	1.998	1.998
2017I000090	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Sağlık)	15.000	0	15.000	1.800		16.800	16.652	16.652
2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	15.000	7.000	4.000	2.948	298	6.650	4.648	11.648
2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	3.200	0	700	433	359	774	334	334
2014I000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	20.000	0	12.978			12.978	12.978	12.978
<b>TOPLAM</b>		<b>67.214</b>	<b>7.000</b>	<b>46.692</b>	<b>8.061</b>	<b>657</b>	<b>54.096</b>	<b>51.158</b>	<b>58.158</b>

Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan 5 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 7 adet proje için 2018 yılı programında 46.692.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından makine-teçhizat, yayım alımı ve bilgi teknolojileri projelerinin toplam ödeneği 54.095.353,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 51.158.087,24 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %94,6'dır.

**Tablo-33 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)**

Açıklama	Proje Tutarı	2017 Sonu Kümülatif Harcama	2018 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2018 Yılı Harcama	Toplam Harcama
Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler*	333.363	136.818	44.049	21.357	0	65.406	48.824	185.642
Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım	329.108	186.137	94.104	37.652	3.019	128.737	91.653	277.790
Makine Teçhizat	43.716	0	34.194	4.113	359	37.948	37.284	37.284
Yayın Alımı	6.500	0	6.500	1.000	0	7.500	7.228	7.228
Bilgi Teknolojileri	16.998	7.000	5.998	2.948	298	8.648	6.646	13.646
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>729.685</b>	<b>329.955</b>	<b>184.845</b>	<b>67.070</b>	<b>3.676</b>	<b>248.239</b>	<b>191.635</b>	<b>521.590</b>

\*Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır. Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.

Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2018 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için 184.845.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 248.238.500,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 65.405.883,70 TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2017 yılından devreden tutar ve 2018 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde projeler ihtiyacına toplam 18.765.500,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Ayrıca taahhüt artığı karşılığı olarak toplam 19.201.117,13 TL ve Bilimsel Araştırma Projeleri ihtiyacına da gelir fazlası karşılığı toplam 14.426.883,70 TL ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında toplamda; 11.000.000,00 TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2018 yılı yatırım programında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından toplam 21 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 82.193.729,33 TL, sağlık sektöründeki projeler için 60.617.811,02 TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 65.405.883,70 TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 208.217.424,05 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo-34 2018 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	EKLENEN					DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
		LİKİT	TAAHÜT ARTIĞI	GELİR FAZLASI	AKTARMA	YEDEK ÖDENEK			
06.1 Mamul Mal Alımları	69.712.000	3.466.500		13.426.884	5.440.553	6.900.000	5.414.000	93.531.937	91.697.488
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	10.539.000			1.000.000				11.539.000	11.539.000
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	4.140.000	793.000			254.000	800.000	138.000	5.849.000	5.047.228
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	38.000.000	6.500.000	18.691.117		360.000	300.000	1.666.250	62.184.867	30.727.678
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	900.000				290.000		358.700	831.300	830.255
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	55.284.000	8.006.000	510.000		1.885.250	3.000.000	653.853	68.031.397	67.925.775
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	450.000							450.000	450.000
<b>TOPLAM</b>	<b>179.025.000</b>	<b>18.765.500</b>	<b>19.201.117</b>	<b>14.426.884</b>	<b>8.229.803</b>	<b>11.000.000</b>	<b>8.230.803</b>	<b>242.417.501</b>	<b>208.217.424</b>

## b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı

finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.

2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarımı Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda mali bir baskı yaratmaktadır.
6. Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır.

## 6. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

## 1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-35 Sağlık Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2014I000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	2014-2019	Hastane İnşaatı (35.758 m2), Makine-Teçhizat	35.978.000	39.623.416	21.480.261	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatın devam etmektedir. İnşaat için 8.502.261,46 TL harcanmıştır. Diğer taraftan proje kapsamında 12.978.000,00 TL ödenek hastane ihtiyacına makine-teçhizat alımları için harcanmıştır. Hastane inşaatı henüz tamamlanamamış olup; kalan 31.121.154,79 TL ödenek taahhüt artığı karşılığı olarak devretmiştir.
2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	2011-2020	Büyük Onarım	500.000	0	0	Ön çalışmalarda deprem güçlendirme çalışmalarının oldukça yüksek maliyette olması ancak bütçe ve döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeni ile işe başlanılamamıştır.
2017I000090	Muhtelif İşler	2017-2018	Makine ve Teçhizat- Büyük Onarım-Taşıtlar (T-15) (2 adet)	37.320.000	39.285.250	39.137.550	Proje kapsamında 20 adet büyük bakım onarım işleri yapılmıştır. Diğer taraftan hastanelerin muhtelif makine-teçhizat ihtiyaçları proje kapsamında karşılanmıştır. Yıl içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yatırımları hızlandırma ödeneği kapsamında projeye 3.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; kaynak tahsis amacına uygun şekilde kullanılmıştır.

Tablo-36 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
20171000090	Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)	A.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Binası Tadilat Yapım İşi (2015-2016 Yıllarına Sari) Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi İçin	AÇIK İHALE	TAŞYAPI RESTORASYON MİMARLIK İNŞAAT TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	186.097
		A.Ü.Tıp Fak.Anatomi Binası Ve Cebeci Yerleşkesi Yemekhane Çatı Onarım Yapılması İşi	DOĞRUDAN TEMİN	DEMİRLER İNŞ.	33.630
		A.Ü.Tıp Fak.İbni Sina Hastanesi Kbb A.B.D.Odyoloji Ünitesi Mekanik Elektrik Projelerinin Ve İhale Dökümanlarının Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi	DOĞRUDAN TEMİN	OVACIK MÜHENDİSLİK	76.700
		A.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Uzman Odası Ve Başhekimlik Tadilat İşi	DOĞRUDAN TEMİN	KAP-TAN	64.900
		A.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Fizyopatoloji Bilim Dalı Laboratuvar Tadilatı İşi(2017-2018 Yıllarına Sari)	AÇIK İHALE	HASAN HARMAN-HARMAN İNŞAAT	560.079
		A.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Çöp Asansörü Tadilat İşi	DOĞRUDAN TEMİN	DURU MÜHENDİSLİK	69.030
		A.Ü.Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Hematoloji Bilim Dalı Muhtelif Mahallere Ait Onarım İşi	DOĞRUDAN TEMİN	KAP-TAN	76.110
		A.Ü.Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Başhekimlik Binası Ve Onkoloji Binasına Ait Tadilat İşi	DOĞRUDAN TEMİN	LÜTFİ MÖBLE	78.470
		A.Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji Ünitesi Tadilat İşi	AÇIK İHALE	MESEN MÜH.	1.336.810
		A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Kalp Merkezi Binası Yangın Merdiveni Yapılması Ve Ameliyathane Katına Ait Büyük Onarım İşi	AÇIK İHALE	EKOTERM MÜH.	12.705.566
		A.Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ana dağıtım Panosu Yenileme Ve Yedekleme İşi	AÇIK İHALE	JEN TEK JENERATÖR	258.052
		A.Ü. Tıp Fak. Morfoloji Binası Kadavra Asansörü Yapım İşi	AÇIK İHALE	İSMAİL DURU	171.454
		İbni Sina Hastanesi Ve Hizmet Birimleri Asansör Yenileme Onarım	AÇIK İHALE	ERGÜN BİLİR İNŞAAT	709.532
		<b>Sayfa Toplamı</b>			

Tablo-36 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>Devir Toplamı</b>					<b>16.326.430</b>
2017I000090	Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)	A.Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Binası Hepatoloji Laboratuvarı Onarım İşİ	AÇIK İHALE	ARTI MÜHENDİSLİK	274.388
		A.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kazan Dairesi, Eşanjörler Kazan Değişimi Ve 4c Blok Wc Onarım İşİ Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi İçin	AÇIK İHALE	KAP-TAN	802
		A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Rehabilitasyon Kliniği Büyük Onarım Ve Uygulama İşİ (2014-2015 Yıllarına Sari) Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi İçin	AÇIK İHALE	LÜTFİ YILDIZ İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.TAŞYAPI REST.MİM.İNŞ.TİC VE SAN.LTD.ŞTİ.ADI ORTAKLIĞI	62.883
		A.Ü.Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Muhtelif Mahaller Tadilat İşİ	DOĞRUDAN TEMİN	MG2A İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.	77.644
		A.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 7.Blok Laboratuvar Onarım İşİ	AÇIK İHALE	HASAN HARMAN	712.006
		A.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Laboratuvar Ekipmanları Alım İşİ	PAZARLIK	SC EĞİTİM	166.380
		A.Ü.Tıp Fakültesi Cebeci Hematoloji Binası Tadilat İşİ	PAZARLIK	KOÇOĞLU ELKTROMEKANİK ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	4.581.856
		A.Ü.İbni Sina Hastanesi A,B,C,D Yüksek Bloklarının 2007 Türk Deprem Yönetmeliğine Göre Deprem Performans Analizlerinin Yapılması Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşİ	DOĞRUDAN TEMİN	BUPİM	68.440
		A.Ü.İbni Sina Hastanesi Tesisat Şaftları Ve Galeri Hatlarında Bulunan Temiz Su Hatlarının Bakım Onarımı Yapılması İçin Hizmet Alım İşİ	DOĞRUDAN TEMİN	MG2A İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.	70.800
		A.Ü.Çocuk Hastanesi Ana Hat Sıcak Soğuk Sirkülasyon Borusu Değişimi İşİ	DOĞRUDAN TEMİN	DİRİOĞLU MEKANİK TESİSAT	70.800
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Kalp Merkezi 1.Bodrum Kat Onarım İşİ Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi İçin	AÇIK İHALE	GÜR MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞ.	4.262
<b>TOPLAM</b>					<b>22.416.691</b>

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



Tablo-37 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı	Açık İhale	Arslanlar İnşaat	8.502.261
		<b>TOPLAM</b>			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-38 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	1 Adet Merkezi Sterilizasyon Ünitesi	Açık İhale	Damla Tıbbi ve Kimyevi İç ve Dış Ltd.Şti.	1.946.344
		4 adet Öğrenci ve 3 adet Klinik Laboratuvarlarına Malz. Cihaz ve Teçhizat	Açık İhale	Ermetal Tıbbi Cih.Paz.İm.San.Ltd.Şti.	8.124.589
		28 Kalem Mobilya Mefruşat	DMO	DMO	501.776
		28 Adet Diş Üniti ve Fötöy	Açık İhale	Gülsa Tıbbi Cih.ve Mlaz.San.Tic.A.Ş.	2.050.272
		Mobilya Mefruşat	DMO	DMO	355.019
<b>TOPLAM</b>					<b>12.978.000</b>

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2017I000090	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	Anesteziyoloji(1 Adet Hasta Isıtma Yatağı)	Açık İhale	Üç Işık Basın Yayın Org.A.Ş.	20.520
		Beyin ve Sinir Cerrahisi(1 adet Ultrasonik Cerrahi Aspiratör (Tip 2))	Açık İhale	Medel Tıp Med.Ürn.Ltd.şti.	52.920
		Cebeci Göz hastalıkları ABD(1 adet Renkli Otoflorasan Fundus Kamera)	Açık İhale	Carl-Zeiss	189.000
		Cebeci Kardiyoloji(8 Adet Holter Kaydedici ve Monşonu 12 Adet)	Açık İhale	Çınar Tıbbi Malz.	162.000
		Çocuk Ameliyathanesi(2 Adet Cerrahi Sinir Bulucu Ünite)	Açık İhale	STN Medikal Tic.Ltd.Şti.	44.816
		Çocuk Hastanesi(1 adet Yüksek Devirli Drill Sistemi Aksesuarları)	Açık İhale	Medel Tıp Med.Ürn.Ltd.şti.	62.640
		Çocuk Yoğun Bakım(2 Adet İki Seviyeli Nasal CRAP Cihazı)	Açık İhale	Alpaslan Çalışkan Tıbbi Ltd.Şti.	170.100
		Çocuk Yoğun Bakım(3 adet Yüksek Frekanslı Üst Düzey Yoğun Bakım Ventilatorü)	Açık İhale	Göbeklioğlu Med. Tic.Ltd.Şti.	385.560
<b>Sayfa Toplamı</b>					<b>1.087.556</b>

Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
<b>Devir Toplamı</b>					<b>1.087.556</b>	
2017I000090	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	Göz Hastalıkları ABD(4 Adet 5X Büyütmeli Biyomikroskop)	Açık İhale	Butik Medikal Yapı Malz.Tic.A.Ş.	165.737	
		İbn-i Sina ve Cebeci Hastaneleri(16 Adet Kurşun İçermeyen Radyasyon Koruyucu Set)	Açık İhale	Orca TR Medikal ve Çevresel Ürü. İth.Ltd.Şti.	122.844	
		İbn-i Sina ve Cebeci Hastaneleri(80 Adet Kurşun İçermeyen Radyasyondan Koruyucu Set)	Açık İhale	Orca TR Medikal ve Çevresel Ür. İth.Ltd.Şti.	614.218	
		İbni Sina Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD(GAAB Teleskop Seti)	Doğrudan Temin	Gentek Medikal Ltd.Şti.	71.928	
		İbni Sina Kardiyoloji(8 adet Holter Kaydedici (Tip 2))	Açık İhale	Çınar Tıbbi Malz.	86.314	
		İbni Sina Radyoloji ABD(1 adet CD/DVD Robot Cihazı)	Açık İhale	Trend Rad. Med. Bilişim Tic.Ltd.Şti.	41.890	
		İbn-i Sina ve Cebeci Has. Nefroloji ABD(8 Adet Hemodiyaliz Cihazı)	Açık İhale	B.Braun Med. Ltd.Şti.	332.640	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(1 adet Ameliyat Masası)	DMO	DMO	39.650	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(1 adet Ameliyathane Lambası)	DMO	DMO	27.781	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(1 adet Aşı Saklama Dolabı)	DMO	DMO	6.227	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(1 Adet Ayaklı Lamba)	DMO	DMO	20.416	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(1 adet Derin Dondurucu)	DMO	DMO	1.462	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(1 adet İleri Yaşam Desteği Simülatörü)	DMO	DMO	58.096	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(1 adet Tam Otomatik Cerrahi Alet Yıkama Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı)	DMO	DMO	61.505	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(1 Adet Ultrason Cihazı)	DMO	DMO	148.857	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(1 Adet Ultrason Cihazı)	DMO	DMO	202.283	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(10 adet Büro Tipi Buzdolabı)	DMO	DMO	8.962	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(100 adet Stor Perde)	DMO	DMO	12.392	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(10000 adet Çarşaf)	DMO	DMO	236.304	
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(10600 adet İndantren Boyalı Çarşaf)	DMO	DMO	211.674	
İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(11 adet Cerrahi Aspiratör)	DMO	DMO	10.614			
<b>Sayfa Toplamı</b>					<b>3.569.347</b>	

Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>3.569.347</b>
20171000090	Muhtelif İşler Projesi	İbni Sina ve Cebeci Has.(40 adet Soyunma Dolabı)	DMO	DMO	17.612
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(15 adet Hasta Yemek Masası)	DMO	DMO	4.214
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(15 adet Hastabaşı Monitörü)	DMO	DMO	135.656
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(15 adet Refakatçi Koltuğu)	DMO	DMO	12.695
		İbni Sina ve Cebeci Has. (15 adet Tedavi Arabası)	DMO	DMO	37.447
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(150 adet Nevresim Takımı)	DMO	DMO	12.727
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(17 adet 3 Motorlu Hasta Yatağı)	DMO	DMO	66.628
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(18 adet Laboratuar Taburesi)	DMO	DMO	3.384
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(1800 adet Çarşaf)	DMO	DMO	39.735
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(19 adet Hasta Başı Monitör)	DMO	DMO	98.791
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(2 Adet Ameliyat Masası)	DMO	DMO	113.841
		İbni Sina ve Cebeci Has. (2 adet Hava Perdesi)	DMO	DMO	8.022
		İbni Sina ve Cebeci Has. (2 adet KBB Koltuğu)	DMO	DMO	8.868
		İbni Sina ve Cebeci Has.(2 adet Sedye)	DMO	DMO	16.746
		İbni Sina ve Cebeci Has. (2 adet Ultrason)	DMO	DMO	156.281
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(2 adet Yer Yıkama Makinası)	DMO	DMO	18.902
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(20 adet Defibrilatör)	DMO	DMO	133.985
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(20 adet Serum Askısı)	DMO	DMO	5.859
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(21 Adet Kat Otomatı Akülü)	DMO	DMO	282.277
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(22 Adet Cila Makinası)	Doğrudan Temin	Karcher Ser. Tic.A.Ş.	77.880
		İbni Sina ve Cebeci Has.(22 adet Led TV (80 Ekran))	DMO	DMO	24.684
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(25 Adet Çok Amaçlı Kar Arabası (Pressli))	DMO	DMO	9.330
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(25 adet Led TV (55 Ekran))	DMO	DMO	17.671
		İbni Sina ve Cebeci Has.(250 adet Yastık Alezi)	DMO	DMO	2.184
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(2650 adet Renkli Çarşaf)	DMO	DMO	79.277
		İbni Sina ve Cebeci Has. (28 adet Klima)	DMO	DMO	99.404
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(280 Adet Sızdırmaz Kapaklı Çöp Arabası 240 Lt).	DMO	DMO	70.567
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(3 adet Acil Müdahale Arabası)	DMO	DMO	13.909
<b>Sayfa Toplamı</b>					<b>5.137.923</b>

Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>5.137.923</b>
2017I000090	Muhtelif İşler Projesi	İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(3 adet Hasta Taşıma Sedyesi)	DMO	DMO	10.306
		İbni Sina ve Cebeci Has. (3 adet Hastabaşı Mönitör)	DMO	DMO	24.747
		İbni Sina ve Cebeci Has.(3 adet İlaç Arabası)	DMO	DMO	13.124
		İbni Sina ve Cebeci Has.(30 adet Serum Askısı)	DMO	DMO	4.519
		İbni Sina ve Cebeci Has.(30 adet Tıbbi Atık Kovası)	DMO	DMO	3.116
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(300 adet Lastikli Çarşaf)	DMO	DMO	8.703
		İbni Sina ve Cebeci Has.(300 adet Yatak Alezi)	DMO	DMO	7.659
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(3150 adet Tek Kişilik Nevresim Takımı)	DMO	DMO	186.532
		İbni Sina ve Cebeci Has.(3500 adet Çarşaf)	DMO	DMO	69.439
		İbni Sina ve Cebeci Has.(36 adet Çöp Arabası)	DMO	DMO	11.933
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(385 Adet Çift Kovalı Döner Pres)	DMO	DMO	63.593
		İbni Sina ve Cebeci Has.(4 adet Acil Arabası)	DMO	DMO	12.505
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(4 adet Ameliyathane Dolabı)	DMO	DMO	9.206
		İbni Sina ve Cebeci Has.(4 adet Buzdolabı)	DMO	DMO	4.428
		İbni Sina ve Cebeci Has.(4 adet LED Tv)	DMO	DMO	11.043
		İbni Sina ve Cebeci Has.(400 adet Yastık Kılıfı)	DMO	DMO	2.769
		İbni Sina ve Cebeci Has.(400 adet Yastık)	DMO	DMO	7.443
		İbni Sina ve Cebeci Has.(5 adet Çamaşır Arabası)	DMO	DMO	2.628
		İbni Sina ve Cebeci Has.(5 adet Çift Kapılı Buzdolabı)	DMO	DMO	10.899
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(5 Adet Islak Kuru Vakum (32 Lt))	DMO	DMO	3.043
		İbni Sina ve Cebeci Has.(5 adet Mayo Masa)	DMO	DMO	12.309
		İbni Sina ve Cebeci Has.(5 adet Pansuman Arabası)	DMO	DMO	16.143
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(5 adet Yarı Otomatik Eksternal Defibrilatör)	DMO	DMO	59.430
		İbni Sina ve Cebeci Has. (50 Mini Buzdolabı)	DMO	DMO	29.441
		İbni Sina ve Cebeci Has.(50 Yemek Masası)	DMO	DMO	14.659
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(500 adet Çarşaf)	DMO	DMO	12.226
		İbni Sina ve Cebeci Has.(500 adet Yastık Kılıfı)	DMO	DMO	2.295
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(55 Adet Islak Kuru Vakum (60 Lt))	DMO	DMO	55.891
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(57 Adet Çok Amaçlı Kar Arabası (Press ve Kovalı))	DMO	DMO	29.471
		İbni Sina ve Cebeci Has.(6 Adet EKG Cihazı)	DMO	DMO	42.182
		İbni Sina ve Cebeci Has.(6 Adet Hasta Ventilatorü)	DMO	DMO	317.683
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(600 adet Zebra Stor Perde)	DMO	DMO	39.333
İbni Sina ve Cebeci Ha.(65 Eysel Atık Kovası)	DMO	DMO	6.087		
İbni Sina ve Cebeci Has.(65 adet Refakatçi Koltuğu)	DMO	DMO	44.278		
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>6.286.984</b>

Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet ve Yapım İş	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>6.286.984</b>
20171000090	Muhtelif İşler Projesi	İbni Sina-Cebeci Has.(7 adet Hasta Transfer Sedyesi)	DMO	DMO	31.371
		İbni Sina-Cebeci Has.(7 adet Mayo Masası)	DMO	DMO	16.929
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(7 adet Muayene Arabası)	DMO	DMO	4.531
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(70 adet Bekleme Koltuğu)	DMO	DMO	33.125
		İbni Sina ve Cebeci Has.(70 adet Çelik Raf)	DMO	DMO	19.247
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(8 adet Hasta Servis Arabası)	DMO	DMO	6.257
		İbni Sina Ve Cebeci Hastaneleri(8 adet Klima)	DMO	DMO	18.224
		İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri(8 Adet Kuru Tıp Elektrikli Süpürge)	DMO	DMO	2.967
		İbni Sina-Cebeci Has.(9 adet Fetal Mönitör)	DMO	DMO	75.132
		İbni Sina ve Cebeci Has.(1 Ad. VLS Cihazı)	Açık İhale	Gentek Med. Ltd.Şti.	82.080
		İbni Sina-Cebeci(1 adet Hasta Monitörü % 20 İş Artışı)	Açık İhale	GMS Medikal	15.660
		İbni Sina-Cebeci(12 A. Cerrahi Alet Alımı)	Doğrudan T.	B.Braun Med. Ltd.Şti.	71.730
		İbni Sina-Cebeci(8 adet Hasta Monitörü)	Açık İhale	GMS Medikal	125.280
		Kulak Burun Boğaz(1 Adet Klinik Tıp Yüksek Frekanslı Timpanometre Cihazı)	Doğrudan T.	Ear Teknik Tic.A.Ş.	36.072
		Kulak Burun Boğaz(1 adet Ultrasonik Cerrahi Aspiratör (Tip 1))	Açık İhale	Medel Tıp Med.Ürn.Ltd.Şti.	52.920
		Tıbbi Patoloji ABD Rutin Patoloji Laboratuvarı(1 Adet Otomatik Slide/Lam Kapama Cihazı)	Açık İhale	Ser-Med Tıbbi Cih.İhr.Paz.San. Tic.A.Ş.	152.810
		Tıbbi Patoloji ABD Rutin Patoloji LaB.(Tam Otomatik Doku Takip Cihazı)	Açık İhale	Deksan Lab.Sist. Ltd.Şti.	203.196
		Tıp Fakültesi Patoloji ABD(Yazılım güncelleme)	Doğrudan T.	GMK Tıbbi Ürn.Toptan Satış	253.700
		Tıp Fakültesi(1 Adet Disk Genişleme Ünitesi ve Diski)	DMO	DMO	76.700
		Tıp Fakültesi(1 Adet Görüntüleme ve Dinlenme Sistemi)	Doğrudan Temin	Saray Elektronik	32.379
		Tıp Fakültesi(1 Adet Masaüstü Bilgisayar)	Doğrudan Temin	Yönsis Bilgisayar	18.674
		Tıp Fakültesi(1 Adet Projeksiyon Cihazı)	Doğrudan Temin	Desibel İletişim	79.060
		Tıp Fakültesi(1 Adet Projeksiyon Lensi)	Doğrudan Temin	Desibel İletişim	21.240
		Tıp Fakültesi(1 Adet Yürüyüş Test Cihazı)	Doğrudan Temin	Elsa Ortopedi	42.091
		Tıp FaK. (23 Kalem Mobilya Mefruşat Alımı)	DMO	DMO	422.798
		Tıp Fakültesi(5 Adet Spirometre)	Doğrudan Temin	Elsa Ortopedi	60.610
		Tıp Fakültesi(6 Kalem Mobilya)	DMO	DMO	7.916
		Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD(1 Adet Robotik Rehabilitasyon Sis.)	Açık İhale	Elsa Ortopedi	1.792.476
		Üroloji (Ultrasonik Mesane Ölçüm Sis.)	Açık İhale	ADS Elektronik Tıbbi Cih. Tic.Ltd.Şti.	41.553
		Üroloji ABD(1 Adet Üroloji Hibrit Cerrahi Tanı ve Girişim Seti)	Açık İhale	Gentek Medikal Ltd.Şti.	685.800
		Üroloji(1 Adet Taşınabilir 38 Kanallı Dijital Video EEG Cihazı)	Açık İhale	Esaote Bimedikal Sist.Ltd.Şti.	77.058
		Üroloji(1 Adet Üroflowmetre Sistemi)	Açık İhale	Oruba Med.Tek Arge Tic.Ltd.Şti.	25.901
320 Adet Separatörlü Klinik Dolap	Açık İhale	Ermetal Tıbbi Cih.Paz.İm.San.Ltd.Şti.	4.814.400		
Koltuk,Sehpa ve Sandalye	DMO	DMO	275.058		
21 Kalem Mobilya Mefruşat	DMO	DMO	529.681		
<b>TOPLAM</b>					<b>16.491.610</b>

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

## 2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-40 Eğitim Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2018H050910	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	2018-2018	Bakım Onarım, Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)	2.000.000	600.000	552.805	A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi 2.Etap Spor Kompleksi Projelerin Hazırlanması, Olimpik Yüzme Havuzu Soyunma Odaları Yapımı ile A.Ü. Didim Yerleşkesine Voleybol Sahası Yapılması İçin Montajlı Malzeme Alımı işleri için toplam 552.804,83 TL harcanmıştır. 1.400.000,00 TL tutarında proje ödeneği ihtiyaç kapsamında başka projelere aktarılmıştır.
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	1994-2019	Eğitim (2.300 m <sup>2</sup> ), Toplantı ve Konferans (13.500 m <sup>2</sup> ),	6.000.000	11.907.451	11.906.901	A.Ü. Didim Örsem Uluslararası Gençlik Merkezi Binası (2014-2015-2016-2017 Yıllarına Sari) Yapım İşinin Namı Hesabına Yapılması Ve İlave İşler Yapım İş, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kazan Uygulama Ve Araştırma Çiftliği 2-6 Aylık Buzağı Ahır Yapım Ve Muhtelif Mahaller Tadilat İş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mimari Rölöve Projeleri Hazırlanması İşleri yapılmıştır. Önceki yıldan devreden taahhüt artığı karşılığı ve likit karşılığı ödenek kayıtları proje ihtiyacına gerçekleştirilmiştir.
2018H032390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2018-2018	Etüd Proje	500.000	1.035.000	1.034.227	Bağlıca Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Etüd ve Proje Hizmet Alımı İşinin ait 1.Etap projeler tamamlanmıştır. Ayrıca 11 adet muhtelif etüd projeler yapılmıştır.
2013H030660	Büyük Onarım	2013-2020	Büyük Onarım	20.484.000	27.530.000	27.529.310	Proje kapsamında 64 Adet Bakım Onarım İş Gerçekleştirilmiştir. Projeye yıl içerisinde bakım onarım ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ödenek ekleme ve aktarma işlemleri ile desteklenmiş olup toplam 27.529.310,00 TL tutarında harcama yapılmıştır. %99,9 oranında harcama gerçekleşmesi olmuştur.
2016H032420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	2016-2020	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	4.000.000	6.650.000	4.648.457	Proje kapsamında mevcut bilgisayarların bakım onarım ve iyileştirme işlemleri tamamlanmış olup; ihtiyaca binaen yerleşkelerin donanım ve bağlantı hızları geliştirilmiş ve gerekli bilgisayar, yedek parça alımları yapılmıştır. Proje ihtiyacına kullanılmak üzere yıl içerisinde 2.000.000,00 TL yedek ödenekten aktarma ve 650.000,00 TL tutarında likit ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Tablo-40 Eğitim Sektörü Proje Açıklamaları (Devamı)

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2018H032410	Yayın Alımı	2018-2018	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	6.500.000	7.500.000	7.227.891	Proje ödeneği yıl içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarılan 1.000.000,00 TL ile birlikte 7.500.000,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir ve ödeneğin 7.227.890,90 TL'si süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliğinde ve kitap alımında kullanılmıştır.
2018H030290	Muhtelif İşler	2018-2018	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap, Taşıt T-2 (1 Adet),	7.568.000	9.447.500	9.317.788	Proje kapsamında muhtelif birimlerin ihtiyacına makine-teçhizat alımları, tefriş ve bilişim teknolojileri alımları gerçekleştirilmiştir. Ödeneğin 7.319.906,99 TL'si muhtelif makine-teçhizat alımları ve tefriş alımlarında, 1.997.880,68 TL'si ise bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır.
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2014-2020	Etüt Proje	1.000.000	800.000	743.040	Üniversitemizde yer alan Tescilli Binalarımız için Etüt Proje Hizmeti Alınmıştır. Proje kapsamında 743.040,00 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2014-2020	Restorasyon	18.000.000	18.710.000	18.673.631	Proje kapsamında 10 Adet Restorasyon uygulama ve 2 adet proje işi gerçekleştirilmiştir. Proje ödeneğinin 18.673.630,53 TL'si harcanmıştır.
2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler	2018-2021	Bakım onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri	1.000.000	1.000.000	559.680	Üniversitemizde yer alan yazma ve nadir eserlerin korunması kapsamında yürütülen projede gerekli bakım onarım çalışmaları ve iklimlendirme çalışmaları yapılmıştır. 2019 yılında kataloglama çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Toplam 559.679,90 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo-41 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2018H050910	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	A.Ü.OLİMPİK YÜZME HAVUZU SOYUNMA ODALARI YAPILMASI İŞİ (D.T)	DOĞRUDAN TEMİN	LOGO ASANSÖR	76.700
		A.Ü.GÖLBAŞI YERLEŞKESİ 2.ETAP KAPALI SPOR KOMPLEKSİ MİMARİ VE MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT HİZMET ALIM İŞİ (PAZARLIK USULÜ 21-f)	PAZARLIK	AYE MİMARLIK	234.187
		A.Ü.DİDİM YERLEŞKESİ PLAJ VELETBOL SAHASI MALZEME ALIM İŞİ (PAZARLIK USULU 21-f)	PAZARLIK	MET-SEN MAL.İNŞ.TURZ.	241.918
<b>TOPLAM</b>					<b>552.805</b>

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-42 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2018H050910	-
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	-
Proje Amacı	Proje kapsamında ihtiyaca binaen açık ve kapalı spor tesislerinin yapılması ve bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018	-
Proje Tutarı (maliyeti)	2.000 (Hazine Yardımı)	600(Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		553

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



Tablo-43 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	A.Ü.DİDİM ÖRSEM ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ BİNASI (2014-2015-2016-2017 YILLARINA SARI) YAPIM İŞİNİN NAMI HESABINA YAPILMASI VE İLAVE İŞLER YAPIM İŞİ (PAZARLIK USULÜ 21-b) çift bütçe	PAZARLIK	KOÇOĞLU ELKTROMEKANİK ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	9.671.270
		ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAZAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA ÇİFTLİĞİ 2-6 AYLIK BUZAĞI AHIRI YAPIM VE MUHTELİF MAHALLER TADİLAT İŞİ (PAZARLIK USULU 21-b)	PAZARLIK	SERKAN KARADAĞ	486.380
<b>TOPLAM</b>					<b>10.157.650</b>

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Şekil-1 Didim Uluslararası Gençlik Merkezi



Tablo-44 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2018H032390	-
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Etüd Proje Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Etüd-Proje	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018	-
Proje Tutarı (maliyeti)	500 (Hazine Yardımı)	500 (Hazine Yardımı) 535 (Öz Gelir)
Yapılan Harcama		1.034

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-45 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2018H032390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Yüzme Havuzu Ve Günübürlük Alan Proje Ve İhale Dokümanlarının Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım	Doğrudan Temin	Ebc Mimarlık	76.818
		Ankev Binası Tadilat Projeleri Ve İhale Dokümanlarının Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım	Doğrudan Temin	Ebc Mimarlık	76.346
		Bağlıca Kök Hücre, Onkoloji Araştırma Ve Uygulamaları Mükemmeliyet Merkezi Lab. Binasına Ait Proje ve İhale Dokümanlarında Revizyon Yapılmasına Ait Hizmet Alım İşİ	Doğrudan Temin	Altu Mimarlık	76.346
		Tıp Fak. Cebeci Kalp Merkezi Yangın Merdiveni Ve Asansör Proje ve İhale Dok. Haz. Ait Hizmet Alım	Doğrudan Temin	Altu Mimarlık	73.396
		Cebeci Tıp Yer. D Blok Deprem Performans Analizi Yapılması ve Kadın Hastalıkları, Doğum A.B.D. Binası Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşİ	Doğrudan Temin	Kare	59.826
		Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Eczacılık Fak. Binalarına Ait Mimari Rölöve Planlarının Hazırlanması İşİ	Doğrudan Temin	Ndt Mimarlık	70.800
		Fen Fakültesi C Blok Mimari Rölöve Planlarının Hazırlanması İşİ	Doğrudan Temin	Ndt Mimarlık	17.700
		Cumhuriyet Öğrenci Evi Deprem Dayanımının Değerlendirilmesi İşİ	Doğrudan Temin	Grup Tekel	61.360
		Beypazarı, Keçiören, Vehbi Koç, Yıldırım Beyazıt Öğrenci Yurtları Deprem Dayanımının Değer. İşİ	Doğrudan Temin	Grup Tekel	70.800
		Cebeci Yerleşkesi Milli Piyango Öğrenci Evi Deprem Dayanımının Değerlendirilmesi İşİ	Doğrudan Temin	Grup Tekel	68.440
		Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Ve Sağlık Teknopark 1.Etap Binaları Uygulama Projeleri Ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşİ	Belli İstekliler	Altu-Mimarlık Ve Müh. Ltd.Şti.	280.325
		Yapı İşleri ve Teknik Dai. Baş. Iso9001, Iso14001, Iso45001, Iso50001 Eğitim, Belgelendirme Hizmet Alım İşİ	Doğrudan Temin	Progel Eğitim Danışmanlık	78.352
		Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mimari Rölöve Projeleri Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım	Doğrudan Temin	Sedat Dulkadiroğlu	23.600
		<b>TOPLAM</b>			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-46 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Muhtelif Tadilatı	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	74.045
		A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü İlave Kat Yapılması İşİ (2017-2018 Yıllarına Sari) Yapım İşİ	Açık İhale	Yapıtem	3.071.571
		Ankara Üniversitesi Keçiören Yerleşkesi Eski Gama M.T.O. Binasının Sağlık Bilimleri Fakültesine Dönüştürülmesi İşİ	Açık İhale	Naliya Müh.-Kaptan İş Ortaklığı	6.934.387
		A.Ü.Gümüşdere Ziraat Yerleşkesi Gama M.Y.O. 2 Nolu Bina Onarım İşİ	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	76.700
		Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Ek Bina Yapım Ve Mevcut Tarbiyotek Binası Tadilat İşİ (2017-2018 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Elay İnş.	7.441.613
		Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kazan Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Onarım İşİ Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi	Açık İhale	Hasan Harman-Harman İnşaat	14.825
		Eczacılık Fakültesi Serum Çözelti Merkezi Yapım İşİ	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	76.700
		Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası Muhtelif Mahaller Tadilat Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Mg2a İnş.Tic.Ltd.Şti.	77.585
		Cebeci Yerleşkesi Yemekhane Ek Binası Alüminyum Doğrama İmalatları İşİ	Doğrudan Temin	Flz Grup	72.570
		Anküsev Kültür Ve Sanat Evi Binası Sergi Salonu Yapımı Ve Tadilatı İşİ	Doğrudan Temin	Yaylaönü İnş.	76.700
		A.Ü. Ziraat Fakültesi Keçiören Yerleşkesi Altyapı İyileştirme İşİ	Doğrudan Temin	Doğan Karaca İnş.	37.760
		Sihhiye Yerleşkesi Orta Bahçe Beton Zemin Yapım İşİ	Doğrudan Temin	Metzan	57.230
		Hukuk Fakültesi Tescilsiz D Blok Amfi Binası Çatı Onarımı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Demirler İnş.	76.700
		2018/76201ankara Üniversitesi Jeoloji Ve YEBİM Binası Eksik Ve Kusurlu İşlerin Tamamlanması İşİ	Pazarlık	Yetiş İş Ortaklığı	348.100
		Ankara Üniversitesi Gümüşdere Ziraat Yerleşkesi Depo Alanı Yapım İşİ	Açık İhale	Hasan Harman	336.825
		A.Ü. Muhtelif Binaların Data Altyapı Revizyon İşİ	Doğrudan Temin	Fts Bilişim	28.320
		A.Ü.Adalet M.Y.O.Altıyapı İyileştirme İşİ	Doğrudan Temin	Güncel İnşaat	23.010
<b>SAYFA TOPLAMI</b>				<b>18.824.641</b>	

Tablo-46 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>18.824.641</b>
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	Veteriner Fakültesi Beyaz Bina Dış Cephe Onarım İşİ	Açık İhale	Deko Dekorasyon	580.757
		A.Ü.Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu, Beyas Koordinatörlüğü Ve Akkem Binaların Mevcut Yangın İhbar Sistemleri Panellerinin Revizyonu İşİ	Doğrudan Temin	İba Proje İnşaat	77.585
		Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi L Blok İle Cebeci Yerleşkesi Ataum Binalarına Yangın İhbar Sistemi Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	İba Proje İnşaat	77.880
		Gümüşdere 60.Yıl Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Wc Onarım İşİ	Doğrudan Temin	Hsy Proje Müh.İnş.	76.700
		Ankara Üniversitesi Ankev Binası Onarım İşİ	Açık İhale	Esha Yap. Tic. Ve San.Ltd.Gir.İnş.Elk. Otm. Em.Med.Sg. A.Nk.H.S.Ltd.	1.203.734
		2018/214541 İhale Kayıt Numaralı Ve 0271 Barkod Nolu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kazan Araştırma Uygulama Çiftliği Tavukçuluk Ünitesi,İdari Bina Onarımı İle Çevre Duvarı Yapım İşİ	Açık İhale	Serkan Karadağ	1.276.513
		A.Ü. Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Yabancı Diller Y.O. İle Fkm (Felaketten Kurtarma Merkezi ) Ve Sosyal Tesisler Arası Alt Yapı Ve Fiber Kablolama İşİ	Doğrudan Temin	Fts Bilişim	76.700
		Sınav Yönetim Merkezi Drenaj Ve Onarım İşleri Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Doğan Karaca İnş.	76.464
		A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Sundurma Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Yaylaönü İnş.	77.290
		A.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası 100 Kg.3 Duraklı 1 Adet Asansörün Mavi Etiket Alınabilmesi İçin Eksikliklerinin Tamamlanması İşİ	Doğrudan Temin	Rabalift	7.080
		50.Yıl Gölbaşı Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi H,I,K,L Blokları (4 Adet Asansör),Super İletken Teknolojileri Araştırma Ve Uygulama Merkezi (1 Adet Asansör) Ve Cebeci Yerleşkesi Avrupa Toplulukları Araştırma Ve Uygulama Merkezi (1 Adet Asansör) Asansörlerinin Bakım Onarımlarının Yapılmasına Ait Hizmet Alım İşİ	Doğrudan Temin	Logo Asansör	19.765
		Gölbaşı Yer. H Blok Ve Cebeci Yerleşkesi İletişim Fakültesi Binaları Drenaj Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Güncel İnşaat Sezai Eliaçık	64.782
		Muhtelif Çatılara Ait Onarım Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Demirler İnş.	43.070
		Sınav Yönetim Merkezi Kazan Dairesi Yenileme Ve Kullanma Suyu Deposu Ve Hidroforu Değişim İşİ	Doğrudan Temin	Yetiş İş Ortaklığı	77.349
		Milli Piyango Öğrenci Yurdu Onarım İşİ Yapılması	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	72.275
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>22.632.585</b>

Tablo-46 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>22.632.585</b>
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü. Tandoğan Kampüsü Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası 2. Kat Taşınmaz Geliştirme Birimi Ofisleri Ve Basımevi Binası Öğrenci Mescidi Havalandırma İşİ	Doğrudan Temin	Yetiş Yangın Cihazları İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	29.500
		A.Ü. Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Jenaratörüne Ses İzalasyon Kabini Ve Otomatik Transfer Panosu Yapım İşİ	Doğrudan Temin	Ck Elktromekanik Ve Elektrik	60.121
		Cebeci ve Tandoğan Yerleşkeleri Muhtelif Mahaller Onarım İşleri	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	71.980
		Cebeci 30.Yıl Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Çevre Aydınlatma İşİ	Doğrudan Temin	Kuba İnş.	79.060
		A.Ü. Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Hızlandırıcı Laboratuvarı (Tarla) Dan 1 Adet 1000 Kva Prima Jenaratörün Sökülerek Tıp Fakültesi Dekanlık Binasına Taşınması Ve Ses İzalasyon Kabini Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Info Power	76.641
		A.Ü.Gölbaşı Yerleşkesi K-H-I Bloklarının Yangın İhbar Sistemlerinin Devreye Alınması Ve Süper İletken Laboratuvarı Yangın İhbar Sistemlerinin Entegrasyonu Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	İba Proje İnşaat	38.940
		Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Ve Biyoloji Bölümü Muhtelif Laboratuvarlara Ait Restorasyon İşİ Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi İçin	Açık İhale	İşsan İnş.Tic.Ve San.Ltd.Şti.	252.702
		Gümüşdere Yerleşkesi Bildiricilik Kümesinin Çalışma Ofislerine Dönüştürülmesi İşİ	Doğrudan Temin	Saraçoğlu İnş.Turz.San. Tic.Ltd.Şti.	76.405
		Ord.Prf.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası Çatı Ve Muhtelif Mahallerde Onarım Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Zaloğlu Müh.	67.260
		A.Ü.10.Yıl Yerleşkesi Heykel Kaideleri Ve Muhtelif Mahaller Onarım Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Dönmez Altyapı İnş.	62.540
		Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bünzen Beki Yapım İşİ	Doğrudan Temin	Sc Eğitim Araçları	70.800
		Ankara Üniversitesi Milli Piyango Yurdu Büyük Onarım İşİ Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi İçin	Açık İhale	Zvz Yapı İnşaat A.Ş.	40.039
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 Ve 7 Numaralı Amfilerin Birleştirilmesi Ve Onarım Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	76.995
		Ankara Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Mg2a İnş.Tic.Ltd.Şti.	76.464
		Sihhiye Tıp Yerleşkesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Fiber Optik Kablo Çekilmesi İşİ	Doğrudan Temin	Ck Elktromekanik Ve Elektrik	6.195
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>23.718.226</b>

Tablo-46 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar					
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti		
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>23.718.226</b>		
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	A.Ü.Beyazırma Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm İşİ	Açık ihale	Abduhrahman Sağlam	381.444		
		Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Sulama Havuzu İzolasyonu İşİ	Doğrudan Temin	Yapı Bims.	57.820		
		Muhtelif Binaların Elektrik Tablolarının Yenilenmesi Ve Gölbaşı Gıda Mühendisliği Binası Jeneratörüne Yedek Yakıt Tankı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Mp System Pano Elektrik	25.960		
		A.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Amfi Onarım İşİ	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	68.440		
		A.Ü.Nallıhan Meslek Yüksekokuluna Stand-By 70 Kva Ses İzalasyon Kabinli Jeneratör Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Jen Tek Jeneratör	73.042		
		Rektörlük Ek Hizmet Binası Kapalı Otopark Tadilat Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Doğan Karaca İnş.	47.200		
		A.Ü.Cebeci Yerleşkesi Ataum Binası Tesisat Boru Değişimi ve Wc Tadilatı	Doğrudan Temin	Vsg İnşaat	50.032		
		Sınav Yönetim Merkezine Ait Doğalgaz Bacası Değişimi Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Emdc Elektrik Mekanik	33.040		
		Dışkapı Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Genetik, Zootekni, Hayvancılık İşletme A.B.D.Binası Teras, Çatı ve Yağmur Olukları Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Sezai Eliaçık	74.635		
		Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Binasının Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Çevrilmesi İşİ (2013-2014 Yıllarına Sari ) Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi	Açık ihale	Sıla İnş.Dekorasyon Turz.San.Paz.Ve Tic.Ltd.Şti.	219		
		Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalına Görüntülü Konuşma Sistemi Kurulması Yapım İşİ	Doğrudan Temin	Kopi- Market Büro Makinaları San.Ve Tic.Ltd.Şti.	18.644		
		A.Ü.10.Yıl Yerleşkesi D Ve E Blok Arası Geçiş Koridoru Yapılması Ve Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	76.700		
		Cebeci Yerleşkesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kütüphane Ve Derslik Tadilat İşİ	Açık ihale	Erkan Keleş	583.955		
		A.Ü.D.T.C.F. D Blok Doğrama Değişimi Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	Güvem Proje	77.644		
		A.Ü.Cebeci Tıp Yerleşkesi Üreme Sağlığı Binası Yemekhane Tadilatı Ve K.L.P. Bilim Dalı Tecrit Odaları Yapımı	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	77.290		
		Yükseköğretim Mekanlarının Kalite Değerlendirmesi Yapılarak Veri Girişlerinin Sağlanması İçin Hiz. Alımı	Doğrudan Temin	Sedat Dulkadiroğlu	76.700		
		Tandoğan Kampüsü Tören Alanı Tribün Altı Mahallere Ait Isıtma Ve Doğalgaz Tesisatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	Ahmet Ceyhan Mühendislik	21.240		
		<b>TOPLAM</b>					<b>25.462.232</b>

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

**Tablo-47 Yayın Alımı Projesi Proje Tamamlama Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2018H032410	-
Proje Adı	Yayın Alımı	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018	-
Proje Tutarı (maliyeti)	6.500 (Hazine Yardımı)	7.500 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		7.228

*Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı*

**Tablo-48 Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları**

Proje No	Proje Adı	Alım Usulü	Alımı Yapılan Mallar	Alımın Toplam Maliyeti
2017H032410	Yayın Alımı	4734 Sayılı Kanununun 22/a maddesi	Sürelî Yayın Aboneliği Veri Tabanı Aboneliği Kitap Alımı	7.227.891
<b>TOPLAM</b>				<b>7.227.891</b>

*Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı*

**Şekil-3 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi**

Tablo-49 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2018H030290	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-teçhizat, T-2 (1 adet)	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018	-
Proje Tutarı (maliyeti)	7.568 (Hazine Yardımı) 516 (Öz Gelir) 54 (Hibe)	7.683 (Hazine Yardımı) 1.711 (Öz Gelir) 54 (Hibe)
Yapılan Harcama		9.318

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Bilgi Teknolojileri) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2018H030290	MUHTELİF İŞLER (Bilgi Teknolojileri)	22 adet tip 1 laptop 56 adet tip 2 Laptop 54 adet tip 1 monitör 66 adet tip 2 monitör 20 adet tip 1 kasa 30 adet tip 2 kasa	DMO	DMO	759.383
		136 adet tip 1 yazıcı 11 adet tip 2 yazıcı 108 adet projeksiyon c.	DMO	DMO	738.713
		44 adet 3 farklı tip erişim noktası 10 adet tip 1 monitör 54 adet tip 2 monitör 10 adet tip 1 kasa 15 adet tip 2 kasa 75 adet tip 3 kasa	DMO	DMO	499.784
<b>TOPLAM</b>					<b>1.997.881</b>

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı



Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Makine Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2018H030290	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	Ortopedik Yatak Baza Kanguru Yatak	Pazarlık	Mu-Ka Mutfak Banyo Dekorasyon/ Kamber Billik	212.274
		Komodin Yatak Başlığı Etajer	Pazarlık	Murat TAŞKIN Fuba Mutfak Mobilya	212.170
		Çalışma Tezgahı taban raflı 160*70*85 cm Demonte Tel Raflar 4 katlı Kepçe Askı Borusu 1m. Bıçak Sterilizasyon Dolabı 10 bıçaklı Duvar Rafı 160*30*3 cm Çalışma Tezgahı Dolaplı 140*70*85 cm Duvar Rafı140*30*3 cm Çalışma Tezgahı Taban Raflı 190*70*85 cm Çalışma Tezgahı Taban Raflı 190*70*85 cm İstifa Rafları, Düz Tablalı 4katlı Çöp Arabası 50*50 cm Kazan Taşıma Arabası 90*70*50 cm Paslanmaz Kıyma Makinesi 600 kg Çalışma Tazgahı Taban Rafı 100*70*85 cm Köfte Yoğurma Makinası 20 kg El Yıkama Evyesi Dizden kumandalı, Çift su girişli Bulaşık Toplama Arabası 90*60*85 cm Çalışma Tezgahı Taban Rafı 180*70*85 cm Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg Un, Şeker Arabası 70*50*50 Bar Buzdolabı+2/+12C3 kapılı 310 lt Çalışma Tezgahı Taban Rafı 140*60*85 cm Tezgah Tipi Buzdolabı -2/+8 OC 3 kapılı Bulaşık Yıkama Makinası 500 tabak/saat Tek Evyeli Damlalıksız Tezgah 40*40*25 evyE Çalışma Tezgahı Dolaplı Ara Rafı 190*70*85 cm Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu 15 metre Malzeme Taşıma Arabası 80*60*70 cm Duvar Tipi Davlumbaz, filtreli 400*147*50 cm Makine Pişirici, Dolaplı, elektrikli 40* 90*85 cm Patates Dinlendirme, Elektrikli 40*90*85 cm Fritöz Dolaplı, Elektrikli 40*90*85 cm Izgara Dolaplı, Gazlı Düz 80*90*85 cm Kuzine Fırınlı Gazlı 120*90*85 cm Ara/Nötr Tezgah, Dolaplı 40*90*85 cm Soğuk Banket Arabası 11xGN 2/1 Tepsi Dik Tip Buzdolabı -2/+8 C tek kapılı Servis Tipi Buzdolabı -2/+8 C3 Kapılı Servis Rafı 190*40*3 cm 6 lt Chafing Dish 2/3 Kare ayaklı Cam Kapaklı GN 2/3 Soğuk Servis Ünitesi 180*90*90 cm Dik Tip Derin Dondurucu -10/-25 C tek Kapılı	Pazarlık	Kromlüks Mutfak Cih. İmalat ve Tic. A.Ş.	224.000
		15lt lik Tavan Boyası 15lt lik duvar plastik boyası 2,5lt lik Yağlı Boya	Pazarlık	İba Proje İnş. Taah. Mek. Tesisat Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	183.820
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>832.264</b>

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Makine Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar					
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti		
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>832.264</b>		
2018H030290	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	Plastik Sandalye Masa 80x80 Masa 80x140	22/D	Toraman oğulları	69.360		
		Yangın Pompası	22/D	Kpam Ltd.Şti	42.480		
		Mini Bar	22/D	MCY Ltd. Şti	25.903		
		Bench Orta Sehpa Ahşap Koltuk Masa 60 Cm Koltuk Tek Koltuk İkili	22/D	AZİM HAN LTD.ŞTİ	25.130		
		Bulaşık Yıkama Mak. Makine Giriş Eviyesi Makine Giriş Çıkış Tez. Bulaşık Yıkama Mak. Makine Giriş Eviyesi Bulaşık Yıkama Mak. Makine Çıkış Tez.	22/D	İNOKSAN A.Ş.	74.913		
		LED TV Yaylı Yatak Makam Koltuğu Çalışma Koltuğu Okuma Masası Sandıklı Baza ve Başlığı Tek Kişilik Elbise Dolabı Sabit Kes on Çalışma Masası	DMO	DMO	182.245		
		Koşu Bandı	22/D	FİNSPOR LTD ŞTİ	58.664		
		Havuz Tem.Robotu	22/D	BEYAZ KİMYA A.Ş.	39.353		
		Soyunma Dolabı	22/D	İBA PROJE LTD.ŞTİ.	78.470		
		Kanal Kayıt Cihazı Kamera Kamera dış ortam Yazıcı Kayıt Cihazı Telefon Modem Cep Tel Kayıt Çubuğu Gece görüş kamera	22/D	NBS TİC.	28.518		
		Resim Mi ker Kayıt Cihazı Yayın çevirme cihazı	22/D	PROVA LTD ŞTİ	33.040		
		Tül Perde Fon Perde İtalyan Dilim Fon Perde Mat pol.Stor Perde	22/D	VİP KOLLEKSİYON	71.202		
		Masa Kitaplık	22/D	MU-KA TİC	54.266		
		<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>1.615.809</b>

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Makine Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			Alımın Toplam Maliyeti
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>1.615.809</b>
2018H030290	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	Mikser DVP player Rack Kabin Kamera, Hoparlör	22/D	ADEN PRO TİC.	25.134
		Budama Makası Tırpan Çim Biçme Mak. Vantilatör Atlas Palet Calasko	22/D	YENİYOL TİC.	30.450
		Güveç, Cam Kare Füme Meyve Tabağı (Odalar İçin) Çelik Tencereler, Küvetler, Tava Çorbalık, Çelik Saplı Tencereler, Mayonez Tenceresi Kızartma Tavaları, İlistirler, Baklava Tepsileri Çelik Küvetler, Fırın Tepsi65*53*20lik Krom Karbon Küvetler, Muhtelif Renkte Kesim Tahtası Pohaça Tepsi, Krem Karamel, Fırın Tepsileri Pandispanya Çemberi, Yemek Kaşığı Büfe Yemek Keççeleri ve Kevgirleri, Çırpma Telleri (Büyük-Küçük-Orta), 25cmliktabak RESTAURANT TABAKLARI)800, Çorba Kasesi ( F&B Restaurant Tabakları), Çorba Kasesi Altlığı ( F&B Restaurant Tabakları), Desert Tabağı 17 Cm,Personel Yemekhane Çatalı, Kaşığı, Bıçağı,Tabldot Tepsisi, Tuzluk Metal, Karabiberlik Metal, ANA YEMEK ÇATAL-Bıçak, DESSERT ÇATAL-Bıçak-Kaşık, ÇAY-çorba KAŞIK, Metal Küllük, Su Bardağı, Casablanka Bardak, çay Bardak Lobi Çay Bardak Altlık, Sürahi, Sütlük Porselen No.2, Yumurtalık Porselen, Tuzluk Porselen, Karabiberlik Porselen, Peçetelik Porselen, Vazo Porselen Buz Makinası 30 Kğ 50,Portakal S.Makina Mekanik Nes Kahve Fincanı 180 Cl,Nes Fincan Altlığı, Türk Kahve Fincan, T.Kahve Fin.Altlık, Şekerlik, Ekmek Sepeti, Ekmek Kızartma Makinası Sanayi Tıpi, Tost Makinası, Çay Semaver + Demlik, Karaf, Bar Kesim Tahtası, Buz Kovası, Juice Bardak, Tepsi Dikdörtgen Yuvarlak Tepsi, Kırılmaz Tabaklar,Karışık Sosluk Kırılmaz Tabak, Kare Melamin Teşhir Melamin Teşhir Büyük, Üçgen Melamin Teşhir, Sunum Tepsi, S.Model Melamin Teşhir, Külsan Uzun Oval Melamin Teşhir,Melamin Teşhir Küçük Külsan 2314 Gastro Butik Kare Kase Melamin Büyük Tepsi, Sosluk Reçellik Standı Dönerli 3'lü Dönerli,3'lü Dönerli Polycarbonat Sosluk Reçellik Standı, Aynalı Teşhirler Şerbetlik 2'li Şerbet, Türk Kahve Makinası 2 Li Sıcak Taşıma Arabası 2/1-12	22/D	ANKARA DİZAYN MUTFAK LTD.ŞTİ.	77.821
<b>TOPLAM</b>					<b>1.749.214</b>

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-51 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti	
2018H030290	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	5 kal. Güvenlik Görevlilerine ait Teç. Alımı	Doğrudan Temin	Trafik Giy. Ltd.Şti.	62.521	
		17 adet Yer Yıkama Makinası	DMO	DMO	242.588	
		60 adet Elektrik Süpürgesi Islak Kuru	DMO	DMO	38.478	
		65 adet Elektrik Süpürgesi -Kuru	DMO	DMO	40.155	
		270 adet Kat Temizlik Arabası	DMO	DMO	32.026	
		20 adet Cila Makinası	Doğrudan Temin	Karcher Servis	70.800	
		1 adet Çim Biçme Traktörü	Doğrudan Temin	Akyol El Aletleri	19.870	
		190 adet Çalışma Koltuğu	Doğrudan Temin	Dream Ofis/Selçuk Salur	78.470	
		Makama yapt. Bayrak ve Muh.Tabela bed.	D. Temin	SEM Reklam	10.245	
		5 kalem Mobilya Mefruşat Alımı	DMO	DMO	230.000	
		2018 ve 2019 yılları için maaş yazılım bedeli	D. Temin	Kamuteck Yazılım	118.982	
		150 adet Çelik Raf	Doğrudan Temin	Dream Ofis/Selçuk Salur	55.890	
		7 Kalem Mobilya Alımı	DMO	DMO	52.569	
		Analitik Kimya ABD(1 adet Karıştırıcı – Vorteks, 4 adet Karıştırıcı Manyetik Isıtıcı, 1 adet Rekraktometre ve 3 adet Hassas Terazi	Açık ihale	İnterlab Medikal	24.984	
		Biyokimya ABD(1 adet Dik Tip Otoklav)	Açık ihale	Ankyra Ltd.Şti.	29.382	
		Farmasotik Botanik ABD(1 adet Manuel Rotary Mikrotom Cihazı)	Açık ihale	Biogen	37.288	
		Farmakognozi ABD(10 ad. Öğr. Mikroskopu)	Açık ihale	Bab Yazılım	35.100	
		Farmasotik Toksiloloji ABD(1 adet UV Visible Spektrofotometre ve 1 adet - 20 C Derin Dondurucu)	Açık ihale	Tetra Ankyra	40.557	
		Mikrobiyoloji ABD(1 adet MC Farland Densitometre, 1 adet Class II Biyogüvenlik Kabini ve 1 adet Laboratuvar Tipi Buzdolabı)	Açık ihale	Ongen Medikal Fen-Med	32.450	
		Farmasotik Teknoloji ABD(1 adet UV Visible Spektrofotometre)	Açık ihale	Ankyra Ltd.Şti.	10.974	
		Kütüphane(60 ad. Yemek Ms.12 ad. Sandal.)	DMO	DMO	30.456	
		Biyoloji(1 ad. Portatif Ph Metre, 2 adet Hassas Terazi (Tip 1), 1 ad. Pipet Seti, 1 ad. Su Banyosu, 1 ad. Etüv,1 ad.Multiparameter Ph Metre ve 1 ad. Hassas Terazi (Tip 3)))	Açık ihale	Ongen Medikal	25.752	
		Fizik(1 adet Milikan Yağ Damlası Deney Seti)	Açık ihale	Nel Elekt.Cih. İmlt.Tic.A.Ş.	24.780	
		Analitik Kimya(3 adet Masaüstü Ph Metre ve 1 adet Analitik Terazi)	Açık ihale	Ankyra Temel ve End.Ltd.Şti.	31.140	
		Anorganik Kimya(1 adet UV-VİS Spektrofotometre ve 6 adet Manyetik Karıştırıcı (Tip 1))	Açık ihale	Ongen Medikal	42.312	
		Kimya Ana Dep. (4 ad. Asit-Baz Sak. Dolabı)	Açık ihale	Ongen Medikal	84.488	
		Biyokimya(1 adet Su Banyosu (Tip 2) ve 1 adet Spektrofotometre (Tip 2))	Açık ihale	Ongen Medikal	98.412	
		Fizikokimya(2 ad. Isıtıcı many. Karıştırıcı, 2 ad. Ceketli Balon Isıtıcı, 6 ad. Isıtıcı Man. Karış. (Tip 1) ve 1 ad. Vakup Pompası)	Açık ihale	Ongen Medikal	23.151	
		<b>SAYFA TOPLAMI</b>				<b>1.623.821</b>

Tablo-51 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>1.623.821</b>
2018H030290	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	12 adet Kitaplık	DMO	DMO	6.397
		Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü(1 adet Ozon Sterilizasyon)	Doğrudan Temin	AZT Bilgi İletişim Tekn.Tic.A.Ş.	28.674
		(85 adet Sandalye, 2 ad. Lazer Yazıcı,200 ad. Tansiyon Aleti, 1 ad. Bebek Hemşire Eğitim ve 7 kalem Eğitimde Kullanılan Modeller)	Açık İhale	Selimkonya Ertunç ÖZCAN Keklikoğlu	183.608
		Radio Verici İstasyonu(9 Ka. Mak-Teçh. alımı)	Açık İhale	İdil Produksiyon	200.482
		(5 ad. Ses Kayıt Cih., 3 ad.Dijital Fotoğraf Mak, 2 Ad. Büyük Hoparlör, 2 ad. Küçük Hoparlör, 1 ad. Yaka Mikrofonu, 4 ad. Video Monitör, 4 ad. Video Tripod, 2 ad. Kamera Hareket Sabitleyici 3 Eksenli Cihaz, 4 ad. Boom Sopası, 4 ad. Fotoğraf Mak. Tripod ve 3 ad. Shoulder Mount)	Doğrudan Temin	Desibel İletişim Org.	59.000
		(52 Kalem Mobilya Mefruşat Alımı, 18 ad. Teknik Servis Masası ve 36 ad. Tabure)	DMO	DMO	398.490
		Enerji Müh.(1 adt Bilgi. Kontrollü Rüzgar Enerjisi Den. Seti)	Açık İhale	Zara Test Cih.İnş.	210.040
		GPSS Sistemi	D. Temin	Bravomed Med.	59.000
		43 kal. Mobilya Teçhiz., 14 ka. Mobilya Teçz. ve Perde	DMO	DMO	402.342
		Dekanlık(250 ad. Sandalye ve 45 adt Kitaplık)	DMO	DMO	67.468
		1 adet Lazer Yazıcı	DMO	DMO	20.512
		Dekanlık(1 adet Mobil Römork Alımı)	D. Temin	Başoğlu Karavan	24.190
		Mikrobiyoloji ABD(1 adet Veri Kayıt Sistemi)	Açık İhale	Nitta Lab.	37.760
		Histoloji-Embriyoloji ABD(1 a. Doku Tak. Cih.)	Açık İhale	Biogen Medikal	140.832
		Doğ. ve Jine. ABD(1 ad. Mob. Dij. R. Doppler Ultrasonog.)	Açık İhale	İnovet	103.805
		Mikrobiyoloji ABD(1 adet Güç Kaynağı)	Açık İhale	KMD Elektronik	5.782
		Su Ürünleri Mühendisliği(1 adet Pulsator Test Cihazı, 1 adet Sterezoom Mikroskop ,1 adet Portatif Oksijenmetre ve 1 adet Blower)	Doğrudan Temin	Lakto Hay. Leica Tekn Bül. Ser. Yıldırım	78.206
		Araştırma Uygulama Çiftliği(1 adet 22 Diskli Çekilir V Tipli Goble Diskaro, 1 adet Beşli Ot Toplama Tırnığı, 1 adet Kazayağı Tipi Kültüvator ve Dişli Tırnık Kombinasyonu ve 7 Ton Tek Dingil Römork)	Doğrudan Temin	Er Yıldırım Tar.Mak. Elvan Soylu	77.652
		Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği(1 adet Frekans Konvektörü ve 1 adet Toprak Penetrometresi)	Doğrudan Temin	Nasyonel Tekn Parsros Makine	37.052
		Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü(3 ad. Reçine Tankı)	D. Temin	Medikal End	5.664
		1 adet Otoklav Alımı	D. Temin	Prizma Lab.	54.280
		1 adet Lazer Yazıcı (DMO)	DMO	DMO	27.522
		13 Kalem Kamera ve Ekipmanları	D. Temin	Grup Atılım	36.650
		1 adet Güvenlik Kamera Sistemi	D. Temin	CNM Güvenlik	35.400
		8 kalem Mobilya Mefruşat (DMO)	DMO	DMO	44.099
		2 kalem Malz.(Kamera ve ekipmanları) ve 7 kalem Mefruşat Alımı	Doğrudan Temin	CNM Güvenlik Mehmet ÇAKIR	34.585
		2 adet Taşınabilir Teleskop	D. Temin	Astromed	58.000
		4 adet Uzun ve 1 adet Orta Vitrin Alımı	D. Temin	Karataş Ayna	73.750
		1 adet Buzdolabı, 2 adet Bulaşık Makinası, 1 adet Çamaşır Yıkama Makinası ve 1 adet GNSS Cihazı	Doğrudan Temin	Sistem Bilgisayar	84.656
		3 KaL. Dijital İçerik Geliştirme Araçları Yazılımı	DMO	DMO	22.950
		Kamera Sistemleri, 1 adet Klima ve 4 kalem Görüntüleme Malz. Alımı	Açık İhale	C.O Gürsoy Güv.SisLtd.Şti.	1.060.024
		1 adet Fotoğraf Makinası ve Ekipmanları	D. Temin	Desibel İle. Org.	32.875
		1 adet Digital Fotokopi Makinası	Doğrudan Temin	Canan Eurasra Gür. Ve Oto A.Ş.	79.060
10 kalem Makine Teçhz. ve 1 ad. Fotokopi Makinası	DMO	DMO	46.141		
Protokol otoparkına(1 Adet Bariyer)	D. Temin	Dizdarlar Turizm	5.605		
Makam,Sistem Odası ve Hukuk Müşavirliği(3 Adet Klima)	D. Temin	Surol Elektromekanik	13.399		
Kamera sistemi(7 Kalem)	D. Temin	CNM Güvenlik	50.056		
Tandoğan Yerleşkesi(33 Adet Aydınlatma Direği)	D. Temin	Elinsa Otomasyon	79.675		
<b>TOPLAM</b>					<b>5.609.503</b>

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-52 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	23 adet projeksiyon c. 21 adet lazer yazıcı 25 adet tip 1 kasa 241 adet tip 2 kasa 221 adet tip monitör 40 adet tip 1 laptop	DMO	DMO	775.846
		14 adet tip 1 switch 21 adet tip 2 switch 104 adet tip 1 monitör 73 adet tip 1 kasa 27 adet tip 2 kasa	DMO	DMO	908.945
		10 adet tip 1 kasa 157 adet tip 2 kasa 10 adet tip 1 monitör 224 adet tip 2 monitör 1 adet tip 1 switch 3 adet tip 2 switch	DMO	DMO	615.127
		8 Kalem muhtelif cins ve adet y.parça	Doğrudan Temin	Bilgibim Bilgisayar	271
		1 adet tablet	Doğrudan Temin	Bilgibim Bilgisayar	7.670
		1 adet yazılım lisansı	Açık İhale	İnnovera Bilgisayar	272.580
		1 adet paket yazılım	Açık İhale	Teknoser Bilgisayar	253.700
		Muhtelif Yazılımlar Yenileme ve Kapasite Arttırımı 1 paket yazılım	Açık İhale	Profelis Bilişim	157.117
		1 paket sanallaştırma yazılımı	Açık İhale	Koç sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri	74.216
		1 adet Infoblox lisans yenileme	Açık İhale	İnfrasis Bilgi TeknolojileriTic.Ltd. Şti.	278.362
		1 adet F5 Lisans yenileme	Açık İhale	İnfrasis Bilgi TeknolojileriTic.Ltd. Şti.	182.664
		1 adet fortinet lisans yenileme	Açık İhale	İnfrasis Bilgi TeknolojileriTic.Ltd. Şti.	641.448
		1 adet lisans yenileme	Doğrudan Temin	İnnovera Bilişim	77.880
		Mal Alımı/ Lisans	Doğrudan Temin	Pofelisi Bilişim	13.676
		Y.Söndürme ve Parmak İzi Sistemlerine 3 adet 3 tip klima 12 adet bakım	Doğrudan Temin	Altay Mekanik	29.913
		90 adet 120 gb harici disk 85 adet 240 gb harici disk 115 adet ram	Doğrudan Temin	Yönsis Bilgisayar	79.408
		Muhtelif cins ve adet yedek parça	Doğrudan Temin	Bilgibim Bilgisayar	78.475
		Ups Sisteminin parçalı ve parçasız yıllık bakımı	Doğrudan Temin	Vertiv Güç Sistemleri	29.500
		1 adet Dış ünite Tamir	Doğrudan Temin	M.T. Isıtma Soğutma	15.977
		8 Kalem muhtelif cins ve adet y.parça	Doğrudan Temin	Bilgibim Bilgisayar	78.907
55 kalem muhtelif cins ve adet y.parça	Doğrudan Temin	İnfobim Bilişim	76.776		
<b>TOPLAM</b>				<b>4.648.457</b>	

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-53 Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi Kapsamında Yapılan Bakım Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	A.Ü. 2027 Ada 84 Parsel Tescilli Ziraat/Veteriner Fakültesi Dışkapı Yerleşkesi 1.Etap Yapısal Çevre Düzenlemesi, Restorasyon, Uygulama İşi(2018-2019 Yıllarına Sari)	Belli İstekliler	Doğuş 2000	10.044.038
		A.Ü.Ziraat Fakültesi Tescilli Yemler Ve Hayvan Besleme Binası Restorasyon Ve Uygulama İşi (2017-2018 Yıllarına Sari)	Belli İstekliler	Saraçoğlu İnş.Turz.San. Tic.Ltd.Şti.	3.318.511
		Ankara Üniversitesi Tescilli Onkoloji Binası Onarım İşi Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi İçin	Belli İstekliler	Taşyapı Restorasyon Mimarlık İnşaat Tic.Ve San.Ltd.Şti.	3.126
		Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tescilli Hayvan Hastanesi Ve Bağlı Birimlerine Ait Büyük Onarım, Restorasyon, Teşhir Tanzim Ve Uygulama İşi (2014-2015 Yıllarına Sari) Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi İçin	Belli İstekliler	Doğuş 2000	668
		A.Ü.Cebeci Tıp Fakültesi Tescilli Başhekimlik Binası Havuz Tadilatı Ve Çevre Tanzim İşi	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	171.000
		A.Ü.Tescilli Genel Cerrahi Binası Soğuk,Sıcak Su Borularının Değişimi,Isıtma Ana Hat Borusunun Değişimi Ve Asma Tavan Yapılması İşi	Doğrudan Temin	Dirioğlu Mekanik Tesisat	220.660
		Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi Galeri Hatları Yapım İşi	Belli İstekliler	Taşyapı Restorasyon Mimarlık İnşaat Tic.Ve San.Ltd.Şti.	4.134.193
		A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Küçük Amfi Onarım İşi	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	233.640
		Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tescilli Hayvan Hastanesi 2.Kısım (2016-2017 Yıllarına Sari ) Restorasyon Uygulama İşi Kesin Hesap Hakediş Bedelinin Ödenmesi İçin	Belli İstekliler	Doğuş 2000	22.308
<b>Toplam</b>				<b>18.148.143</b>	

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-54 Tarihi Yapıların Etüd Projesi Kapsamında Yapılan Proje Çalışmaları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	A.Ü. Keçiören Tescilli Atatürk Evine Ait Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerine Ait Hizmet Alım İşi	DOĞRUDAN TEMİN	AST MİMARLIK	33.040
		A.Ü. Tescilli Fen Fakültesi A-B Blok Cephelerine Ait Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi	BELLİ İSTEKLİLER	KATRE PROJE	127.500
		Ankara Üniversitesi Tescilli Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası Rölöve, Restitüsyon Projeleri İle Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Tescilli Genel Cerrahi Binası Ve Veteriner Fakültesi Tescilli Zootehni anabilim Dalı Binası Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi (2018-2019 Yıllarına Sari)	AÇIK İHALE	KATRE PROJE	346.500
		A.Ü. Veteriner Fakültesi Ve Tescilli Anatomi Ve Patoloji Anabilim Dallarına Ait Binanın Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi	AÇIK İHALE	AHMET SONER TOĞANAŞ	236.000
		<b>TOPLAM</b>			<b>743.040</b>

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



### 3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

**Tablo-55 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	2010-2018	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (5.930 m <sup>2</sup> )	300.000	300.000	299.749	Proje kapsamında ihtiyaca binaen mal alımı ve personel alımları gerçekleştirilmiş olup; 299.749,09 TL tutarındaki harcamanın 206.647,09 TL tutarındaki kısmı personel giderlerinden oluşmaktadır.
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Lab.	2012-2018	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (2.500 m <sup>2</sup> )	300.000	300.000	3.414.864	Proje kapsamında ihtiyaç duyulan cihazlardan kur artışı ve mevcut bütçe kaynaklarının yetersizliği sebebi ile yalnızca bir tanesi alınabilmiş ve toplam 3.414.863,54 TL tutarında harcama özel hesaptan gerçekleştirilmiştir. Proje bütçesinin artırılması ve projede sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme	2016-2018	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (200 m <sup>2</sup> )	1.065.000	1.065.000	859.882	2018 yılı hedefleri doğrultusunda Kordon Kanı Bankası laboratuvar tadilatı ve deney hayvanları laboratuvarının hazırlıkları tamamlanmış olup hayvan deneyi çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk sonuçlarımız Haziran 2019'da Avrupa Hematoloji Kongresinde sunulacaktır. Otomatize kök hücre ekspansiyon cihazı temin edilmiştir ve projede görevli personel cihaz uygulama eğitimini tamamlamıştır.
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	2016-2018	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (700 m <sup>2</sup> )	2.374.000	7.374.000	15.246.249	Klinik uygulamalar alanında ve araştırma hedefine gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2018 yılında büyük oranda ulaşılmıştır. Yapılması planlanan hayvan evi inşaatına başlanılamamıştır. Araştırma alt yapısı ile çeşitli Üniversitelere hizmet vermeye başlanılmıştır. Hayvan evi inşaatı için alınması gereken izinlerin gecikmesi nedeniyle inşaat 2019 yılına kalmıştır.

\*Projelerin özel hesabına 2017 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.

Tablo-55 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu (Devamı)

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	2006-2020	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (5.148 m <sup>2</sup> )	29.990.000	29.990.000	6.392.917	Tarla için temin edilecek malzemelerin çoğunun tasarımı TARLA ekibi tarafından yapılmakta ve şartnameleri ekip elemanları tarafından hazırlanmaktadır. Kalifiye personel yetersizliği projenin hedeflerini ötelemektedir. Hızlandırıcı tesislerini kurup işletmek için ileri mühendislik bilgisi ve uzun süreli deneyim gerekmektedir. Ülkemizde benzer nitelikte personelin yetersiz olmasının yanı sıra, personel eğitime stratejisi nedeni ile hızlandırıcı teknolojilerinde halihazırda istenilen sayıda insan gücü oluşturulamamıştır. Projede mevcut satın alma mevzuatı ile teminlerde yaşanan gecikmeler iş paketlerinin dolayısıyla da hedeflerin ötelenmesine neden olmaktadır.
2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	2017-2019	Etüt-Proje	1.000.000	3.000.000	6.992.270	Proje kapsamında inşaat ihalesi yapılmış ve I. Etap Kök Hücre Araştırma Laboratuvarı Binası yapım işine başlanmıştır. Projede 6.992.270,06 TL tutarında harcama özel hesaptan gerçekleştirilmiştir.
2017K120770	Kolorektal Kanseri İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	2017-2019	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	10.000	10.000	775.574	Proje kapsamında proje ihtiyacına mal alımları gerçekleştirilmiş olup; proje özel hesabından toplam 775.574.03 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2018K120720	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2018-2018	Proje Desteği	9.010.000	9.010.000	14.841.712	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 14.841.712,11 TL tutarında özel hesaptan yapılan harcamalar ile toplam 527 adet proje desteklenmiştir.

\*Projelerin özel hesabına 2017 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır

Tablo-56 Süperiletkenlik Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Mal Alımı	Doğrudan Temin	Eti Bilgisayar Dan. ve Dış Tic. Ltd. Şti.	35.400	
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Annifer Turizm Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	15.340	
		Hizmet Yapım İşi	Doğrudan Temin	Meeting Extra NNG Turizm Organizasyon İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.	42.362	
		Proje kapsamında çalışan personel ücret ödemeleri				206.647
<b>TOPLAM</b>					<b>299.749</b>	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Tablo-57 Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı	LA-LIBS-ICP-MS	İhale	Redoks	3.414.864	
<b>TOPLAM</b>					<b>3.414.864</b>	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Tablo-58 Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	İş İstasyonu	İhale	Csıt Bilişim A.Ş.	64.900	
		Pulser	İhale	Lauring AG	83.666	
		5 Kalem makine teçhizat (video konferans sistemi, video konferans sistemi modüler tip, monitör tip 1, monitör tip 2, masaüstü bilgisayar)	İhale	Teknopark Proje Yazılım Ve Donanım HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.	74.930	
		CNC Torna Tezgahı	İhale	Tezmaksan Mak.San.Tic.A.Ş.	234.900	
		Baskı Devre Makinesi	İhale	GZ Elektronik Yönetim Sis. Müş. Ve Vet. Hiz. San. Ve Tic. LTD.ŞTİ.	279.424	
		Tekerlekli Sıvı Azot Taşıma Tankı	İhale	CRYOCAN Basınçlı Kaplar, Endüstriyel Tesisler SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ.	75.000	
		Mig/mag kaynak makinesi	İhale	Şimşekgrup Hırdavat Metal Yapı PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	59.000	
		optik mikroskop	İhale	İncekaralar Tıbbi Cihazlar Tic.A.Ş.	49.842	
		Tig kaynak makinesi	İhale	Şimşekgrup Hırdavat Metal Yapı PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	31.499	
		<b>SAYFA TOPLAMI</b>				

Tablo-58 Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Projesi Kapsamında Muhtelif Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				Alımın Toplam Maliyeti
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı		
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>953.161</b>	
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	UPS altyapı-otomasyon kurulum hizmeti	ihale	Aken elektrik mak. İnsan kay. Danş. Enej. Bilişim sosyal hiz. Em.inş.ith.ihr.san.tic.ltd.şti.	757.088	
		11 kalem malzeme (3*2,5 mm2 PVC izoleli,halojen-free kablo, 3*1,5 mm2 Pvc izoleli, halojen-free kablo, 4*16 mm2 PVC izoleli halojen-free kablo, 4*25 mm2 PVC izoleli halojen-free kablo, 1*25 mm2 pvc izoleli, sarı-yeşil, halojen-free kablo, 2*6 mm2 zırhlı bükülmüş çift kablo, 2*25 mm2 zırhlı bükülmüş çift kablo, BNC RG58 50 OHM Koaksiyel kablo, 4*26 AWG şeritlenmiş zırhlı kablo, 50 ohm RG174/U yağinsal koaksiyel kablo	ihale	YGÖ TASARIM MİMARLIK inşaat taahhüt limited şirketi	65.490	
		Bina dış cephe tadilat ve boyama hizmeti	ihale	Yılmaz açığıöz inş. Tat tic.	562.650	
		jeneratör odası düzenleme ve kurulum hizmeti	ihale	Yılmaz açığıöz inşaat taahhüt tic.	675.550	
		2 kalem malzeme (5000 A Termik Manyetik Şalter, (80kA), 4000 A Termik Manyetik şalter (80kA)	ihale	Aken elektrik mak. İnsan kay. Danş. Enej. Bilişim sosyal hiz. Emlak inş.ith.ihr.san.tic.ltd.şti.	70.800	
		2 kalem malzeme (4000 A Termik Manyetik Şalter, (80kA), 2000 A Termik Manyetik şalter (80kA)	ihale	ATS Kablo elektronik inş. Mak. San. Ve tic. Ltd. şti.	70.999	
		Mekanik İmalat Destek Hizmeti	ihale	ADESİS MÜHENDİSLİK arş. Gel. Proje danş. Hiz. Elek. Ve elek. San. Ve tic. Ltd.şti.	69.620	
		Sarf Malzeme (Elektronik Kondansatör, Taş direnç, varistör, işlemsel yükselteç, dijital-analog dönüştürücü, akım kaynağı, voltage referans, bipolar transistör, p kanal mosfet, karşılaştırmacı entegre, yükseltici entegre, diyot, AND Kapısı entegresi, mikrokontrolcü, yükselteç entegresi, akım monitör entegresi, anahtarlı kondansatör, akım monitör entegresi, bipolar transistör, cmos lojik 8li buffer entegresi, bobin, trafo, fotoflaş kondansatör şarj entegresi, akım voltaj entegresi, tssop to dip adaptör, micromax to dip adaptör, bipolar transistör, IGBT transistör, mosfet)	ihale	Yıldırım eletronik tic. Ve san. Ltd. şti.	59.000	
		56 kalem malzeme	ihale	TCS Makine Hırdavat San. Tic. Ltd. Şti.	57.631	
		5 kalem malzeme	ihale	RATEST MÜH. Tic. Ltd.şti.	52.864	
		muhtelif destek hizmeti	ihale	ADESİS MÜ. arş. Gel. Proje danş. Hiz. Elek. Ve elek.San. tic. Ltd.şti.	68.287	
		mekanik imalat teknik destek hizmeti	ihale	Ares analitik elektronik bilişim medikal imalat san. tic. Ltd. şti.	64.999	
<b>SAYFA TOPLAMI</b>					<b>3.528.139</b>	

**Tablo-58 Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı)**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
<b>DEVİR TOPLAMI</b>					<b>3.528.139</b>
2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	muhtelif destek hizmeti	ihale	Zenotek ith. pazarlama ve ticaret yüksel özkan	70.800
		Gaz helyum tank ve kurulum hizmeti	ihale	Hür Şimşek tıbbi cih. ith. ihr. San.tic. Ltd. Şti.	725.700
		mekanik imalat hizmeti tip 1	ihale	Haktan grup havalandırma sistemleri İsmail Koç	71.980
		Laboratuvar Binası Genel Temizlik Hizmeti	ihale	KUBA Petrol inş. Tem. Gıda pey. Bilg. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.	41.996
		muhtelif destek hizmeti	ihale	ADESİS MÜH. arş. Gel. Pro. danş. Hiz. Elek. Ve elek. San. Ve tic. Ltd.Şti.	60.180
		Kontrol yazılım hizmeti	ihale	ADESİS MÜHENDİSLİK arş. Gel. Proje danş. Hiz. Elek. Ve elek. San. Ve tic. Ltd.Şti.	64.900
		Mekanik İmalat Destek Hizmeti	ihale	Zenotek ith. pazarlama ve ticaret yüksel özkan	62.900
		mekanik imalat hizmeti tip 2	ihale	Hür Şimşek tıbbi cih. ith. ihr. San.tic. Ltd. Şti.	280.840
		Su soğutma sistemi ısıtıcı kazan imalat hizmeti	ihale	ADESİS MÜH. arş. Gel. Pro. danş. Hiz. Elek. Ve elek. San. tic. Ltd.Şti.	64.900
		Kablo fonksiyon test hizmeti	ihale	RATEST MÜH. Tic. Ltd.Şti.	64.900
		1*50 mm2 pvc izoleli, sarı-yeşil, halojen-free kablo	ihale	Aken elektrik mak. İnsan kay. Danş. Enej. Bilişim sosyal hiz. Emlak inş.ith.ihr.san.tic.ltd.Şti.	40.000
		Elektrik tesisat revizyon hizmeti	ihale	RATEST MÜH. Tic. Ltd.Şti.	74.989
		sarf malzeme	ihale	Yıldırım elektronik tic. san. Ltd. Şti.	75.520
		mekanik imalat teknik destek hizmeti	ihale	ADESİS MÜHENDİSLİK arş. Gel. Proje danş. Hiz. Elek. Ve elek. San. Ve tic. Ltd.Şti.	71.390
		Dizel yakıt (jeneratör için)	ihale	Gönülşan NAK.İNŞ.MAD.LTD. ŞTİ.	68.381
		muhtelif destek hizmeti	ihale	Creworker Bilal Tonga Bilgisayar Programları faaliyetleri	19.470
		Mekanik İmalat Destek Hizmeti	ihale	ADESİS MÜHENDİSLİK arş. Gel. Proje danş. Hiz. Elek. Ve elek. San. Ve tic. Ltd.Şti.	62.540
		muhtelif destek hizmeti	ihale	ADESİS MÜHENDİSLİK arş. Gel. Proje danş. Hiz. Elek. Ve elek. San. Ve tic. Ltd.Şti.	61.360
		RF Odası nem kontrolü kurulum hizmeti	ihale	Haktan grup havalandırma sistemleri İsmail Koç	69.000
		General Particle Tracer	ihale	Pulsar Physics	28.946
		Optilayer Thin Film Software	ihale	Optilayer GmbH	49.653
Vienna ab-initio Simulation Package (VASP)	ihale	University of Wien Faculty of Physics	27.454		
Kompanzasyon sistemi bakımı	ihale	ERBAYGES Energy Elektronik Bilişim Elektrik Taah. İthl. ihr. San. Ve Tic. Ltd.Şti.	15.000		
Isıtma soğutma ve iklimlendirme sistemi bakım hizmeti	ihale	ICS ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİS. VE MÜH. HİZ. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.	27.140		
<b>TOPLAM</b>					<b>5.728.078</b>

**Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü**

**\*Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir.**

Tablo-59 Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme	Kryojenik Tüp	Doğrudan Temin	Laborildam	12.685
		Steril Pipet ucu Filtreli 10-100-200-1000 UL	Doğrudan Temin	Taykim Ltd. Şti.	6.992
		HLA-A-B-C-DR-B1 (Yüksek çözünürlü doku tiplendirmesi)ileri düzey dizi analizi temelli -NGS (Tüm sarflar)	Doğrudan Temin	Gensutek Ltd. Şti.	63.180
		Klima santrali (Bakım onarımı)	Doğrudan Temin	Çınar Soğutma	14.160
		-187° C Derece Hücre saklama tankı (Bakım onarımı)	Doğrudan Temin	Teknis Ltd. Şti.	40.391
		Kordon Kanı Bankası Cihaz Bakım ve onarımı	Diğer ihale usulleri	Anka Kalibrasyon Ltd. Şti.	82.600
		Sepax seti	Diğer ihale usulleri	Meray Sağlık Ltd. Şti.	226.800
		DMSO Dextran 40 (Solüsyon)	Doğrudan Temin	Taykim Ltd. Şti.	20.061
		NETCORD akredite) Üyelik ücreti	Doğrudan Temin	Ankara Üniversitesi Rektörlüğü	38.234
		Bilişim bakım (Hizmet alımı)	Doğrudan Temin	Hemosoft Bilişim Bakım Ltd. Şti	34.220
		Klima santrali (Bakım onarımı)	Doğrudan Temin	Çınar soğutma Ltd. Şti.	14.160
		Personel giderleri			305.399
		<b>TOPLAM</b>			

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

**Tablo-60 Kök Hücre Enstitüsü GMP Doku ve Hücre Üretim Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	Mimarlık Mühendislik Projelendirme Hizmeti	Doğrudan Temin	46.610
		14 Kalem malzeme	Doğrudan Temin	65.888
		GMP kullanım sarfı	Doğrudan Temin	59.000
		Besiyeri	Doğrudan Temin	45.360
		Mycoplasma test kiti	Doğrudan Temin	4.482
		GMP kullanım sarfı	Doğrudan Temin	46.964
		GMP kullanım sarfı	Doğrudan Temin	2.832
		GMP kullanım sarfı	Doğrudan Temin	30.000
		Partikül ölçüm cihazı	Doğrudan Temin	28.910
		Hibrid dijital anjiyografi sistemi	Diğer İhale Usulleri	4.899.960
		Mikrotabak okuyucu	Diğer İhale Usulleri	627.500
		Buzdolabı	Doğrudan Temin	9.239
		Biyolojik Baskılama Sistemi	Diğer İhale Usulleri	1.850.000
		3B- Biyoluminans/Floresans Canlı Görüntüleme Sistemi, 1 adet Mikrokomputerize Tomograf sistemi	Diğer İhale Usulleri	4.850.000
		Akım Sitometri Sistemi	Diğer İhale Usulleri	2.650.000
		İlan Hizmet Bedeli	Doğrudan Temin	1.180
		İlan Hizmet Bedeli	Doğrudan Temin	1.250
		Yolluk Ödemesi		
<b>TOPLAM</b>			<b>15.246.249</b>	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

**Tablo-61 Kök Hücre Araştırma Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşi**

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	I. Etap Kök Hücre Araştırma Laboratuvar Binası Yapım İşi	Açık İhale	Aslanlar İnş. Teks. A.Ş. – Dağdemir İnş. Tic. San.A.Ş.	6.992.270
<b>TOPLAM</b>				<b>6.992.270</b>	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Tablo-62 Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti	
2017K120770	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	MAMUL MAL ALIMLARI	Diğer İhale Usulleri	DUGAN BİLGİSAYAR ELEKTRONİK HİZM. KIRT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	604.632	
		Yolluk ve kongre katılım				1.258
		MAMUL MAL ALIMLARI	Doğrudan Temin	Zemin Bilgisayar	18.526	
		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	Doğrudan Temin	itserv Teknoloji Hizmetleri	4.720	
		MAMUL MAL ALIMLARI	Doğrudan Temin	Zemin Bilgisayar	58.764	
		MAMUL MAL ALIMLARI	Doğrudan Temin	itserv Teknoloji Hizmetleri	73.986	
		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	Doğrudan Temin	Zemin Bilgisayar	13.688	
<b>TOPLAM</b>					<b>775.574</b>	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü



## 7. ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların artırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının artması anlamına gelecektir.

Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinliği artıracaktır.

Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet içi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve değerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım - enerji gibi diğer sektörlerde de Üniversitelerin proje sunmasına imkân tanınmasının bu sektörlerde gerekli uzman personeli çağın gereklerine göre yetiştirmekle görevli üniversitelerdeki sunulan eğitimlerde etkinliği arttıracığı değerlendirilmektedir.

## 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Tablo-63 Ankara Üniversitesi 2018 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	10		231.135			118.567			66.482			85.126			82.194
Sağlık	3		165.241			73.798			67.978			91.887			60.618
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	8		333.363			136.818			44.049			65.406			65.406
<b>TOPLAM</b>	<b>21</b>		<b>729.739</b>			<b>329.183</b>			<b>178.509</b>			<b>242.419</b>			<b>208.218</b>

**Tablo-64 Ankara Üniversitesi 2018 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem**

**Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık	1		5.820			0			5.820			5.820			0
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>		<b>5.820</b>			<b>0</b>			<b>5.820</b>			<b>5.820</b>			<b>0</b>

**Tablo-65 Ankara Üniversitesi 2018 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem**  
Bütçe Türü: HİBE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	1		54			-			54			54			-
Sağlık	1		351			-			351			351			-
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	-		-			-			-			-			-
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>		<b>405</b>			<b>-</b>			<b>405</b>			<b>405</b>			<b>-</b>

**Tablo-66 Ankara Üniversitesi 2018 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem****Bütçe Türü: İCMAL**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	10		231.135			118.567			66.536			85.180		82.194	
Sağlık	3		165.241			73.798			74.149			98.058		60.618	
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	8		333.363			136.818			44.049			65.406		65.406	
<b>TOPLAM</b>	<b>21</b>		<b>729.739</b>			<b>329.183</b>			<b>184.734</b>			<b>248.644</b>		<b>208.218</b>	

## 2018 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablo-67 Sektör Adı: Eğitim

2018 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	20.500	11.500	11.907	+	1.582 4.500 175	11.907
408	2013H030660	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	118.000	95.500	27.530	+	1.400 3.000 3.000 6 360	27.529
408	2014H040020	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	4.495	1.495	800	-	200	743
408	2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	53.072	3.072	18.710	+	510 200	18.674
408	2018H040240	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	3.500	0	1.000			560
408	2018H050910	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	2.000	0	600	-	1.400	553
408	2018H032390	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	500	0	1.035	+	360 175	1.034
408	2018H030290	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	6.998	0	9.448	+	1.880	9.318
408		Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR		Ankara	0	516					
		Muhtelif İşler	HİBE		Ankara	0	54					
408	2016H031420	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	15.000	7.000	6.650	+	2.000 650	4.648
408	2018H032410	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	6.500	0	7.500	+	1.000	7.228
<b>TOPLAM</b>						<b>0</b>	<b>231.135</b>	<b>118.567</b>	<b>85.180</b>			<b>82.194</b>

**Tablo-68 Sektör Adı: Sağlık**

**2018 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2011I000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	10.000	0	0	-	500	0
408	2017I000090	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	66.421	34.570	39.285	+	1.800 2.000 3.000 485	39.138
408		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE		Ankara	0	5.820		5.820			
		Muhtelif İşler	HİBE				351		351			
408	2014I000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	83.000	40.000	52.601	+	17.109 485	21.480
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	63.000	40.000	39.623	+	17.109 485	8.502
408		Makine ve Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	20.000	0	12.978	-		12.978
<b>TOPLAM</b>						<b>0</b>	<b>165.592</b>	<b>74.570</b>	<b>98.057</b>			<b>60.618</b>

**Tablo-69 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)**  
**2018 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mik.	Harcama Toplam
408	2006K120470	Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	211.972	67.194	29.990			6.393
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	14.806	14.806				
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ankara	0	197.166	52.388				
408	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	18.549	18.249	300			300
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	8.307	8.307				
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	10.242	9.942				
408	2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. Ve Ar.Merke.	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	12.115	11.815	300			3.415
408	2018K120720	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2018	Ankara	0	9.010	0	23.367	+	2.576 2.336 2.356 1.450 5.639	14.842
408	2016K121120	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hüresel Ürün Geliştirme Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	3.460	2.395	1.065			860
408	2016K121130	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ankara	0	19.609	17.235	7.374	+	5.000	15.246
408	2017K120760	Kök Hücre Araştırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	30.000	6.000	3.000	+	2.000	6.992
408	2017K120770	Kolorektal Kanseri Erken Tanı Araş. Pro.	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ankara	0	28.648	13.930	10			776
<b>TOPLAM</b>						<b>0</b>	<b>333.363</b>	<b>136.818</b>	<b>65.406</b>			<b>48.824</b>
