



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2024





ANKARA ÜNİVERSİTESİ

**2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2024



Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ.....	7
1.GENEL DEĞERLENDİRME.....	9
1.MİSYON.....	9
2.VİZYON.....	9
3.İLKELER.....	9
4.AMAÇ VE HEDEFLER.....	10
2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	10
3.MEVcut HİZMET KAPASİTESİ.....	13
a) İnsan Kaynakları.....	13
b) Fiziksel Kaynaklar.....	15
4.2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	27
5. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	29
a) Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	29
b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	34
6. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	36
1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	36
2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	41
3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	60
7. ÖNERİLER.....	62
2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	63
2022 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU.....	67

YÖNETİCİ ÖZETİ

Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, toplam 91.201 öğrencisi, 3.941 akademik personeli (kadrolu, şahsa bağlı kadro, yabancı uyruklu, sözleşmeli öğretici ve Üniversitemizde 2547/35 ile görevlendirilen), 5.171 idari, 696 sözleşmeli ve 2.253 işçi olmak üzere toplam 12.061 personeli ile 19 fakülte, 15 enstitü, 1 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 46 araştırma-uygulama merkezi ile sürekli eğitim merkezi, Cebeci ve İbni Sina olmak üzere 2 araştırma ve uygulama hastanesi, 1 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve 1 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, kültür, spor, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2023 yılı yatırımları için toplam 399.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 231.578.000,00 TL ekleme işlemi ile toplam 631.078.000,00 TL'ye çıkmıştır.

Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %67,03 bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %61,89 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo-1 2023 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)

Sektör	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Gerçekleşme	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	151.500	227.893	198.603	87,15
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	2.000	2.000	1.519	75,95
Kültür	35.000	53.000	48.046	90,65
Sağlık	171.000	263.057	89.709	34,10
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar	40.000	85.128	85.128	100,00
TOPLAM	399.500	631.078	423.005	67,03
TOPLAM (BAP Hariç)	359.500	545.950	337.877	61,89

Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir. BAP harcamaları özel hesaba aktarılan tutarı ifade etmektedir. Ayrıca Eğitim Büyük Onarım Projesinde 6.250.000,00 TL ve İbni Sina Hastanesi Deprem Güçlendirme Projesinde ise 77.326.016,64 TL bütçe dışı avans kullanılmış olup, bu tutarlar da harcamaya dahil edilmemiştir.

2023 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 198.603.439,04 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda kampüslerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak birçok binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, kitap alımı, bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %87,15 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Beden Eğitimi ve spor sektöründe ise 1.518.960,00 TL harcama gerçekleşmiş olup; 10.Yıl Yerleşkesi Açık Kaplı Tenis Kortları Yanı Tesis Tadilatı Yapım İş, Piri Reis Spor Salonu Pis Su Hattı Tadilatı İle Bilimsel Yayılar Koordinatörlüğü Binası Isıtma Sisteme ve Çatı Tadilatı Yapılması İş ile Olimpik Havuz Pis Su Hattı Tadilatı İle Nallıhan MYO Çevre Düzenlemesi işleri yapılmıştır. Beden eğitimi ve spor sektöründe gerçekleşme %75,95 oranında olmuştur.

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Diğer taraftan kültür sektöründe 48.045.718,30 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda etüt proje işleri ve Veteriner Fakültesi Tescilli Anatomi Patoloji Binası Restorasyonu Uygulama İşi ile diğer restorasyon işleri ve Yazma ve Nadir Eserler Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alımlar gerçekleştirilmiştir. Kültür sektöründe %90,65 oranında bir gerçekleşme olduğu görülmektedir.

Sağlık Sektöründe 89.709.026,28 TL kaynak kullanımı kapsamında hastane binalarımızın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, hastanelerimizin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleşme oranı %34,10' olup, İbni Sina Hastanesi Deprem Güçlendirme Projesi, İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı Projesi ve Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi-Onarım işlerine ilişkin yapım işlerinde kullanılmıştır.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 85.128.000,00 TL ödenek bütçeden özel hesaba aktarılarak bilimsel araştırma projeleri desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere proje özel hesaplarına aktarılmıştır.

2023 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.MİSYON

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

- Eleştirel düşünebilen ve çözüm odaklı, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, yaratıcı ve farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi,
- Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, disiplinlerarası ve etik değerleri gözetilen araştırmalar yapmayı,
- Sosyal sorumluluk bilinci ile dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözetilen ve bulunduğu bölgenin kalkınmasına-gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı, görev edinmiştir.

2.VİZYON

Nitelikli araştırmalar yapan, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi araştırma üniversitesi olmaktır.

3.İLKELER

- Akademik özgürlüğe öncelik verme
- Etik değerlere bağlılık
- Liyakat
- Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Kültür öğelerine ve tarihine bağlılık
- Saydamlık
- Öğrenci merkezlilik
- Kaliteyi içselleştirme
- Katılımcılık
- Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı

4.AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2024-2028 dönemi stratejik planında 5 adet stratejik amaç altında 20 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir.


Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç 1. Ulusal ve uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapmak ve araştırma çıktılarının değere dönüştürülmesini sağlamak	Hedef 1.1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayan katma değeri yüksek araştırma çıktılarının artırılması
	Hedef 1.2. Araştırmacı niteliğinin artırılması ve teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi
	Hedef 1.3. Araştırma altyapısı ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması
	Hedef 1.4. Araştırma süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması
Amaç 2. Ulusal/uluslararası alanda kendini ifade edebilen, çağın gerektirdiği bilgi okur-yazarlığı becerileri ve alanında sorun çözüme yetkinliklerine sahip bireyler yetiştirmek ve öğretim elemanlarının üretkenliğini artırmak	Hedef 2.1. Eğitim-öğretim programlarında “yenilik” ve “kalite” sağlayarak öğrencilere çağın gerektirdiği becerilerin kazandırılması
	Hedef 2.2. Öğretim elemanlarının üretkenliğinin ve yetkinliğinin artırılması
	Hedef 2.3. Uluslararası akademik iş birliklerinin ve yararlanıcı sayısının artırılması
	Hedef 2.4. Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması
	Hedef 2.5. Lisansüstü eğitimin niteliğinin artırılması
Amaç 3. Üniversitenin sahip olduğu bilimsel kapasiteyi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmak	Hedef 3.1. Toplumun ihtiyaçlarına ve gelişimine yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerinin artırılması
	Hedef 3.2. Sunulan sağlık hizmetinin kalitesi, kapasitesi ve teknolojisinin artırılması
	Hedef 3.3. Üniversitemiz tarafından toplum yararına sunulan hizmetlerin artırılması
Amaç 4. Kurumun girişimcilik kapasitesini artırmak ve kurumsal iş birliklerini zenginleştirmek	Hedef 4.1. Girişimciliği teşvik edici eğitim faaliyetlerinin artırılması
	Hedef 4.2. Kamu-üniversite-sanayi iş birliği ve girişimcilik ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğinin artırılması.
	Hedef 4.3. Fikri mülkiyet havuzu kapasitesinin geliştirilmesi
	Hedef 4.4. Kurum içi girişimciliğin teşvik edilmesi
Amaç 5. Veri yönetimi ve öz değerlendirme süreçlerini etkin kılarak kurumsal yapıyı güçlendirmek	Hedef 5.1. Kurum genelinde öz değerlendirme çalışmalarının geliştirilmesi
	Hedef 5.2. Veri yönetimi konusunda farkındalık oluşturma
	Hedef 5.3. Kurumsal aidiyetin ve memnuniyetin artırılması
	Hedef 5.4. Teknolojik ve fiziksel altyapının iyileştirilmesi ve yararlanıcı sayısının artırılması

2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ankara Üniversitesi'nin 2023 Yılı Yatırım Programında toplam 19 adet proje için 401.500.000,00 TL kaynak öngörülmüş olup, yıl içerisinde Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesinin yeni proje olarak eklenmesi ile birlikte toplam proje sayısı 20 olmuştur. Diğer taraftan gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu toplam ödeneği 648.578.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 902.000,00 TL'si öz gelir 49.224.000,00 TL'si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 17.500.000,00 TL'si döner sermaye ve 580.952.000,00 TL'si hazine yardımı olarak finanse edilmiştir.

Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılım

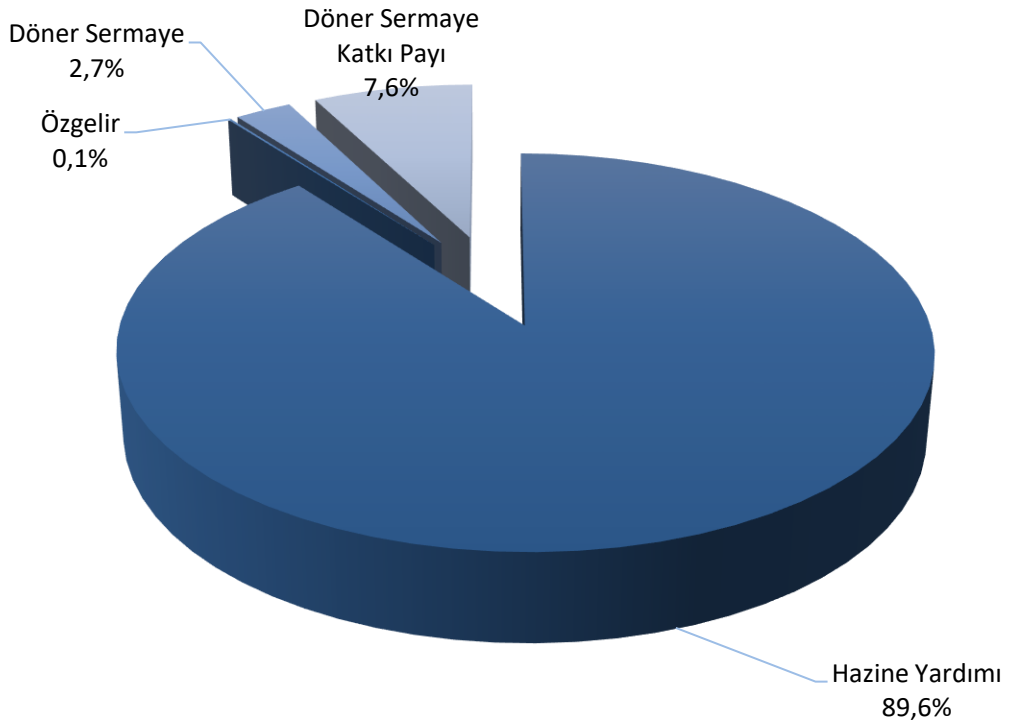

2023 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 5 adet proje için 151.500.000,00 TL kaynak ayrılmış olup 902.000,00 TL'sinin öz gelirlerle, 150.598.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kültür sektörü kapsamında ise biri etüt proje olmak üzere 3 adet projeye yer verilmiştir ve projeler için toplam 35.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sağlık Sektöründe ise 3 adet proje için toplam 173.000.000,00 TL kaynak tahsis edilmiş olup; 2.000.000,00 TL'sinin döner sermaye kaynakları ve 171.000.000 TL'sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 7 adet proje için 40.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; 15.958.000,00 TL'sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereği

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

kaydedilen ödeneklerle ve 24.042.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-3 2023 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)

PROJE NO	PROJE ADI	2023 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI				
			ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE	DÖNER SERMAYE KATKI PAYI	HAZİNE YARDIMI	HİBE/DIŞ ÖZKAYNAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM		401.500	902	2.000	15.958	382.640	2.316
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR		40.000	0	0	15.958	24.042	0
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	1.000				1.000	
2023K12-213154	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	6.868				6.868	
2023K12-213153	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	6.170				6.170	
2022K12-184727	AB-IPA - Yenilikçi Kanser Teranostik GMP	2				2	
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	10.000				10.000	
2017K12-21024	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	2				2	
2023K12-213155	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	15.958			15.958		
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM		151.500	902	0	0	150.598	0
2023H03-212119	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500				500	
2023H03-212121	Muhtelif İşler	55.000	902			54.098	0
2020H03-150547	Büyük Onarım	61.000				61.000	
2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	15.000				15.000	
2023H03-212113	Yayın Alımı	20.000				20.000	
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		2.000	0	0	0	2.000	0
2023H05-212633	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000				2.000	
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR		35.000	0	0	0	35.000	0
2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	5.500				5.500	
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	28.500				28.500	
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	1.000				1.000	
SAĞLIK		173.000	0	2.000	0	171.000	2.316
2011I00-1432	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	84.000				84.000	
2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	34.000				34.000	
2023I00-206147	Muhtelif İşler	55.000		2.000		53.000	2.316

3.MEV CUT HİZMET KAPASİTESİ

a) İnsan Kaynakları


Ankara Üniversitesinde 2023 yıl sonu itibarıyla 3.646 kadrolu akademik, 2547/30 madde kapsamında 1 sözleşmeli akademik, 51 yabancı uyruklu akademik, 78 sözleşmeli öğretici, Üniversitemize 2547/35 madde ile görevlendirilen 165 akademik personel, 5.171 kadrolu idari, 696 sözleşmeli idari ile 2.253 (2.332'si sürekli, 21,1'i geçici) işçi olmak üzere toplamda 12.061 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %32,7'sini akademik, %67,3'ünü idari personel ve işçiler oluşturmaktadır.

Tablo-4 2021-2023 Yılları Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2021 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2023 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Akademik Personel	3.828	3.698	3.646	-1,4
2547/30 Md. Kapsamında Sözleşmeli Akademik Personel	1	2	1	-50,0
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	52	58	51	-12,1
Sözleşmeli Öğretici Personel	95	92	78	-15,2
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2547/35)	342	285	165	-42,1
İdari Personel	4.254	4.157	5.171	24,4
Sözleşmeli İdari Personel	1.122	1.392	696	-50,0
İşçi	2.409	2.331	2.253	-3,3
Toplam	12.103	12.015	12.061	0,4

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-2 2023 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2023 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %1,4 oranında azalış göstermiştir. Doktor öğretim üyesi kadrosunda %25,8, doçent kadrosunda %8,5 ve profesör kadrosunda %3,5 artış yaşanırken; araştırma görevlisi kadrosunda %13,2 ve öğretim görevlisi kadrosunda %8,8 oranında azalma yaşanmıştır.


2023 yılsonu 2.017 öğretim üyesinin, %49,4'ü kadın, %50,6'sı erkek, toplam akademik personelin ise %53,1'i kadın, %46,9'u erkek akademik personel oluşturmaktadır.

Tablo-5 2021-2023 Yılları Akademik Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2021 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2023 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Profesör	1.127	1.138	1.178	3,5
Doçent	359	342	371	8,5
Doktor Öğretim Üyesi	287	372	468	25,8
Öğretim Görevlisi	638	612	558	-8,8
Araştırma Görevlisi	1.417	1.234	1.071	-13,2
Toplam	3.828	3.698	3.646	-1,4

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-3 2023 Yılı Akademik Personel Kadro Dağılımı




Tablo-6 2021-2023 Yılları İdari Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2021 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı
Genel İdari	1.930	1.871	1.848
Teknik	444	434	506
Sağlık	1.432	1.415	2.400
Eğitim-Öğretim	1	1	0
Avukatlık	7	8	9
Din	0	0	2
Yardımcı	440	428	406
Toplam	4.254	4.157	5.171

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-4 2023 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı



b) Fiziksel Kaynaklar

b.1) Taşınmazlar

Ankara Üniversitesi mülkiyet durumuna göre arsa/arazi alanı toplam 13.941.759,53 m² alanda hizmetlerini sürdürmekte olup, bina/tesis yerleşim alanı toplam 1.129.225,59 m² dir.

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-7 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m ²)	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)
Ahlatlıbel 20. Yıl	122.908,00	16.381,34
Altındağ Konak-Özgen	1.688,80	382,00
Ayaş (Diğer)	149.576,41	0,00
Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu Yerleşkesi (Ziraat Fakültesi)	416.144,50	2.255,33
Ayaş Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	6.297,08	1.279,18
Bağlıca 70. Yıl Yerleşkesi	2.430.125,00	23.149,17
Beşevler 10. Yıl	230.449,00	123.042,73
Beşevler Dış Hekimliği Yerleşkesi	17.505,00	51.288,17
Beşevler İlahiyat Yerleşkesi	12.020,00	18.445,50
Beypazarı (Diğer)	484.738,00	0,00
Beypazarı Uygulamalı Bilimler Oteli	680,00	484,00
Beypazarı Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	16.258,00	8.658,10
Bursa Gemlik Zeytinlik	9.901,00	0,00
Cebeci 30. Yıl Yerleşkesi	5.010,00	2.999,79
Cebeci Tıp Yerleşkesi	188.583,00	127.789,58
Cebeci Yerleşkesi	97.580,00	79.418,77
Cevizlidere Kök Hücre Yerleşkesi	4.474,00	3.284,27
Çankaya Ankara Üniversitesi Evi	505,00	714,45
Çankaya ANKÜSEV	651,00	899,58
Çankaya Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM)	0,00	325,88
Çankaya Konut/Kongre Arsası	48.223,00	0,00
Çankaya Korkutreis ASYM	0,00	392,00
Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İşletmesi Yerleşkesi (Ziraat Fakültesi)	108.985,00	2.131,83
Demirlibahçe Beyin Araştırmaları Merkezi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi	4.752,00	4.676,50
Dışkapı Yerleşkesi	100.606,00	54.769,60
Didim ÖRSEM Yerleşkesi	36.977,00	12.295,10
Elmadağ Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	6.422,00	3.607,82

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Elmadağ ÖRSEM Yerleşkesi	10.838,00	673,56
Gölbaşı (Diğer)	45.752,00	0,00
Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi	712.923,00	130.017,67
Gölbaşı Ballıkpınar	1.587.697,00	0,00
Gölbaşı ÖRSEM Yerleşkesi	45.600,00	1.864,29
Gölbaşı Teknokent	115.103,00	19.849,00
Gölbaşı Yurtlar Bölgesi	251.313,00	56.698,59
Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi	139.547,00	11.735,29
Gümüşdere Ziraat Yerleşkesi	285.092,00	56.957,85
Haymana (Gölet)	200.167,00	0,00
Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yerleşkesi (Ziraat Fakültesi)	3.999.507,00	18.940,66
Haymana Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	3.791,48	3.438,80
Ilgaz ÖRSEM Yerleşkesi	3.750,00	5.861,38
İstanbul TÖMER (Beyoğlu)	0,00	1.395,90
Kalecik (Arsa)	22.291,00	0,00
Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İşletmesi Yerleşkesi (Ziraat Fakültesi)	198.816,00	347,50
Kalecik Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	16.147,60	2.955,21
Karakusunlar	5,00	0,00
Kastamonu Göl Emirler Köyü	1.686,00	0,00
Kazan Eğitim ve Uygulama Çiftliği Yerleşkesi (Veteriner Fakültesi)	1.524.193,00	0,00
Kazan Merkez	25.060,00	16.271,55
Keçiören Sağlık Bilimleri Yerleşkesi	24.480,00	15.366,78
Keçiören Şaraphane	0,00	904,90
Keçiören Teknokent	24.126,00	2.042,16
Kızılay TÖMER	-	2.422,90
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	19.453,66	645,11
Maltepe Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Yerleşkesi	600,00	2.132,25
Maltepe Vehbi Koç Yurdu	2.686,00	4.490,16
Manavgat ÖRSEM Yerleşkesi	21.843,00	8.047,36

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Nallıhan Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	20.645,00	2.139,35
Sıhhiye Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yerleşkesi	18.923,00	31.385,68
Sıhhiye Tıp Yerleşkesi	83.581,00	145.191,40
Sıhhiye Yüksek İhtisas Hastanesi Yerleşkesi	23.514,00	47.293,92
Urla Yerleşkesi	11.570,00	1.485,68
Toplam	13.941.759,53	1.129.225,59

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ankara Üniversitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılında, Üniversite bazında toplam 67 amfide eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Toplam amfinin %95,5'i fakültelerde, %4,5'i Devlet Konservatuvarında bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesinde 2023 yılı itibarıyla 835 sınıfta eğitim-öğretim yapılmıştır. Toplam sınıfın %48,4'ü fakültelerde, %22,87'si yüksekokullarda, %15,8'i araştırma ve uygulama merkezlerinde, %2,4'ü Devlet Konservatuvarında, %1,2'si enstitülerde ve geri kalan %9,33'ü de uygulama merkezleri ile eğitim merkezlerinde bulunmaktadır.

Öğrencilerin uygulama yapmak amacıyla kullandığı 56 atölyenin %33,4'ü fakültelerde, %25'i yüksekokullarda, %5,36'sı uygulama merkezlerinde ve geri kalan %36,24'ü de araştırma ve uygulama merkezlerinde bulunmaktadır. Ayrıca, toplam 690 laboratuvarın %59,56'sı araştırma, %38,4'ü eğitim, %2,04'ü ise sağlık laboratuvarlarından oluşmaktadır.

Tablo-8 Eğitim ve Uygulama Alanları

KAPASİTE (m2)	AMFİ	SINIF	ATÖLYE	LABORATVUARLAR	TOPLAM
0-50	8	554	53	637	1.252
51-75	0	150	2	26	178
76-100	3	78	1	23	105
101-150	21	41	0	0	62
151-250	20	12	0	1	33
251-Üzeri	15	0	0	3	19
TOPLAM	67	835	56	690	1.648

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara merkezinde 5 kız, 3 erkek öğrenci evi olmak üzere toplam 8 öğrenci evimiz bulunmaktadır.

Tablo-9 Öğrenci Evleri Kapasiteleri

ÖĞRENCİ EVİ	ALAN (m ²)	KAPASİTE (Kişi)
Cumhuriyet Öğrenci Evi	5.207	260
Cumhuriyet Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası	1.913,97	74
Keçiören Öğrenci Evi	3.018,00	137
Milli Piyango Öğrenci Evi	9.543,52	384
Vehbi Koç Öğrenci Evi	4.698,00	224
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	4.439,00	165
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	5.144,00	236
Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası	1.570,00	47
TOPLAM	35.533,49	1.527

Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Milli Piyango Öğrenci Evi bünyesinde Üniversitemiz misafirlerine hizmet vermek üzere misafir odaları bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşdere Yerleşkesinde yardımcı hizmetli personelin yararlandığı 2 bina olarak, 20 daireden oluşan toplam 1.780 m² alana sahip lojman bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hizmet verilen 38 birim yemekhanesi haricinde kiralık olarak işletmelerce işletilen 5 yemekhane ile toplam 43 kütüphane bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 66 adet kantin/kafeterya ile 2 adet restoran bulunmaktadır.

Tablo-10 Yemekhane, Kantin/Kafeteryalar ve Restoranlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	13.254,00	43	6.769
Kantin / Kafeteryalar	9.133,47	66	5.845
Restoran	601,93	2	200

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-11 Toplantı ve Konferans Salonları

KAPASİTE (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	TOPLAM
0-50	166	9	175
51-75	20	6	26
76-100	3	7	10
101-150	4	7	11
151-250	0	6	6
251-Üzeri	1	12	13
TOPLAM	194	47	241

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesinde 2 adet sinema salonu, Ziraat Fakültesinde 1 adet tiyatro salonu ve Devlet Konservatuvarında 1 adet konser salonu; Rektörlük binasında Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinde Oyuncak Müzesi, Veteriner Fakültesi (Anatomi Müzesi ile Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Sergi Salonu) 2 adet, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sergi Salonu, Eczacılık Fakültesi Müzesi, Hemşirelik Fakültesinde Hemşirelik-Ebelik Sergi Salonu, İlahiyat Fakültesi Sergi Salonu, Tıp Fakültesi 75. Yıl Sergi Salonu, Ziraat Fakültesi Müzesi ve Ankara Üniversitesi BEYAS Arşiv Müzesi ile toplamda 11 adet müze/sergi salonu bulunmaktadır.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde müzik, tiyatro ve sinema gösterimi vb. amaçlar için kullanılan 3 adet, toplam 380 m2, Yabancı Diller Yüksekokulunda 100 m2, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde 21,50 m2, Veteriner Fakültesinde 300 m2, Güzel Sanatlar Fakültesinde de 70 m2 ve Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde 45 lik m2 lik çok amaçlı salon bulunmaktadır.

Eczacılık Fakültesinde 1, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 3 el sanatları salonu bulunmaktadır. Eczacılık Fakültesi ve Elmadağ Meslek Yüksekokulunda birer, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde de 4 olmak üzere toplam 6 müzik salonu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dans atölyesi, drama salonu da Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer almaktadır.

Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde Üniversite amblemi bulunan ürünlerin satışının gerçekleştiği 33 m2 lik ürün satış yeri, Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisi karşısında 18 m2 lik ürün satış ve sunum yeri ile Ziraat Fakültesi Dekanlığında ve Fatih Caddesinde sırasıyla 55 m2 ve 42,8 m2 lik ürün satış yeri bulunmaktadır.

Kitap satış yeri Hukuk Fakültesi Merkez Binasında bulunmaktadır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ana merkez binasında haftanın belirli günlerinde kız, belirli günlerinde erkek öğrencilere hizmet veren kuaför ve berber salonu, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 1 berber, İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 1 kadın kuaförü ve 1 berber bulunmaktadır.

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesinde 1'er market bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra Ayaş, Kalecik ve Haymana'da öğrencilerimizin kullanımına yönelik sosyal tesisler bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli fakülte, enstitü ve yüksekokullarında okuma salonları, öğrenci kulüp odaları, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde de mescit bulunmaktadır.

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-12 Diğer Sosyal Alanlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Sinema Salonu	313	2	240
Tiyatro Salonu	351	1	150
Konser Salonu	557	1	100
Müzik Salonu	227,50	6	149
Müze ve Sergi Salonları	2.727,27	11	-
Okuma Salonu	5.105,16	34	2.348
Çok Amaçlı Salon	987,04	9	571
Dans Atölyesi	55	1	10
Drama Salonu	67,30	1	30
El Sanatları Salonu	132	4	79
İç Bahçe	350	1	150
Öğrenci Sosyal Alanı	282	4	70
Bilgisayar Salonu	64	1	32
Sosyal Tesis (Ayaş, Haymana, Kalecik)	2.329	3	150
Öğrenci Kulüpleri	431	11	-
Kitap Satış Yeri	100	1	-
Ürün Satış Yeri	148,8	4	-
Berber	23,90	2	5
Kuaför	42,45	2	5
Kuaför ve Berber	20	1	2
Market	1.191,83	2	-
Mescit	1.501,96	37	1.395

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine mesleki alanlarına göre araştırma ve uygulama yapma imkânı sunmaya devam etmektedir.

Tablo-13 Araştırma Uygulama Alanları

ALAN ADI	Arsa/Arazi Alanı (m ²)	Kapalı Alan (m ²)	ADET
Araştırma Uygulama Çiftliği	6.247.645,50	23.675,32	5
Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri	119.008,00	28.741,69	5
Kütüphane	-	16.650,92	34

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-14 Spor Alanları

Birim Adı	Kapalı Spor Tesisleri			Açık Spor Tesisleri		
	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)
Beşevler 10. Yıl	Tenis Kortu	3	1.944	Tenis Kortu	3	1.944
	Fitness Egzersiz Salonu	2	370	Basketbol	3	1.826
	Yüzme Havuzu	1	3.510	Voleybol	2	550
	Piri Reis Spor Salonu	1	1.082	Futbol	1	1.152
Beypazarı Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	375
				Voleybol	1	300
Cebeci Yerleşkesi	Cebeci Spor Salonu	1	2.045	Futbol	1	1.152
	Egzersiz Salonu	1	250			
Dışkapı Yerleşkesi	Dışkapı Spor Salonu	1	1.250	Basketbol	1	270
				Futbol	1	2.350
				Halı Saha	1	1.000
	Egzersiz Salonu	1	62	Spor Sahası	1	88
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	Masa Tenisi	1	36	Basketbol	1	230
	Bilardo	1	64			
	Langırt	1	73	Voleybol	1	230
Gölbaşı 50. Yıl	Atış Poligonu	1	100	Basketbol	1	608
	Egzersiz Salonu	1	250			
	Genel Amaçlı Salon	1	2.050			
	Gölbaşı Su Sporları Eğitim Merkezi	1	6.000	Futbol	1	1.151
	Güreş ve Uzakdoğu Sporları	1	206			
	Jimnastik ve Plates Salonu	2	240	Stadyum Kompleksi	1	11.009
	Masa Tenisi	1	100			
	Okçuluk ve Dart Alanı	1	313	Tenis Kortu	1	648
	Ritim Eğitimi	1	100			
Kalecik Meslek Yüksekokulu				Basketbol-Voleybol	1	720
Manavgat ÖRSEM				Plaj Voleybol	2	1.188
Morfoloji	Fitnes Salonu	1	138	Basketbol	1	500
				Tenis Kortu	1	500
Ziraat Uygulama Merkezi				Basketbol-Voleybol	2	700

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-15 Hastane Alanları

Alan Adı	İbn-i Sina Uyg. ve Arş. Hastanesi	Cebeci Uyg. ve Arş. Hastanesi	Diş Hekimliği Fak. ve Diş Hekimliği Uyg. Hastanesi	TOPLAM
Acil Servis	1	1	0	2
Yoğun Bakım	7	6	0	13
Ameliyathane	1	26	3	30
Poliklinik	30	176	1	207
Klinik	22	25	19	66
Laboratuvar	6	6	7	19
Eczane	1	1	1	3
Radyoloji Alanı	1	58	30	89
Nükleer Tıp Alanı	0	16	0	16
Sterilizasyon Alanı	1	5	1	7
Mutfak	1	1	0	2
Çamaşırhane	1	0	1	2
Teknik Servis	9	1	3	13
Adli Tıp	0	1	0	1
Morg	1	0	0	1
Kan Merkezi	0	1	0	1
Kompresör Odası ve Kazan Dairesi	0	6	2	8
Hastane Müdürlüğü	1	0	0	1
Hasta Yatış	1	0	0	1
Bekleme Salonu	0	35	0	35
TOPLAM	84	365	68	517

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Rapor

Tablo-16 Hayvan Sağlığı Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Acil Servis	164,00	1
Ameliyathane	227,00	7
Klinik	293,00	18
Laboratuvar	103,00	1
Radyoloji Alanı	141,00	1
Kompresör Odası ve Kazan Dairesi	150,00	1
TOPLAM	1.078,00	29

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-17 Ambar ve Arşiv Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Ambar Alanı	7.290	91
Arşiv Alanları	9.056	184
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	31.355	677
TOPLAM	47.701	952

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

b.2) Taşınırlar

Aşağıda verilen tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. 2023 yıl sonu itibarıyla, I. düzeyde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda toplam 59.361, 254 Taşıtlar grubunda toplam 512 ve 255 Demirbaşlar grubunda da 324.733 adet taşınır kayıtlıdır.

Tablo-18 2022 Yılı İtibariyle Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayısı

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınırlar	Ölçü Birimi	2023 Yılı
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	59.361
254	Taşıtlar Grubu	Adet	512
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	324.733

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tablo-19 Taşıtlar Grubu

Taşıtların Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Toplam
Otomobiller (Binek)	18	26	44
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs)	16	0	16
Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon)	19	0	19
Hafif Ticari Araç	1	2	3
Arazi Taşıtları	2	0	2
Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler)	8	0	8
Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork)	417	0	417
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)	9	0	9
Botlar	10	0	10
Yelkenliler	3	0	3
Kanolar ve Kayıklar	9	0	9
Toplam	512	28	540

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Üniversitemizin ağ altyapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahiptir. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan tüm toplanma noktalarına fiber optik kablo çekilmiş ve tüm kullanıcılara aktif ağ ucu sağlanmıştır. Üniversitemiz 9,9 Gbps hızında Metro Ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahiptir.

Tablo-20 Teknolojik Kaynaklar (2021-2023)

	2021 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı
Sunucular	340	351	356
Masaüstü Bilgisayar	15.102	14.759	14.789
Taşınabilir Bilgisayar	4.747	4.667	4.580
Tablet Bilgisayar	1.396	1.366	1.347
Cep Bilgisayar	232	223	220

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-21 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2021-2023)

	2021 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı
Projeksiyon	1.891	1.860	1.868
Tepegöz	220	176	155
Barkot Okuyucu	253	287	435
Yazıcı	6.371	6.235	6.273
Baskı Makinesi	27	25	22
Fotokopi Makinesi	241	232	228
Faks	119	107	101
Fotoğraf Makinesi	396	388	379
Kameralar	2.303	2.467	2.485
Televizyonlar	2.418	2.306	2.292
Tarayıcılar	711	705	730
Müzik Setleri	393	361	346
Mikroskoplar	2.463	2.460	2.422
DVD'ler	191	180	157
Yazı Tahtası	1.441	1.425	1.485

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Birim Faaliyet Raporları

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2023 yılında birimlerden ve kullanıcılardan gelen kitap talepleri ile doğrudan temin yöntemiyle 1.886 Türkçe, 169 yabancı olmak üzere toplam 2.055 kitap alınmış olup, dağılımı Tablo 22’de gösterilmiştir.

Tablo-22 Kütüphane Kaynakları

	2023 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	2.055	764.439	766.494	798.284	866.912	1.665.196
Basılı ve Veri Tabanında Yer Alan Süreli Yayın Sayısı	0	54.941	54.941	10.850	54.941	65.791
Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı	23	23	46	23	23	46
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	0	140	140	0	140	140

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-23 Alınan Kitapların Birimler İtibari İle Dağılımı

Birimler	Alınan Kitap Sayısı
Adalet Meslek Yüksekokulu	75
Ayaş Meslek Yüksekokulu	470
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi	130
Eczacılık Fakültesi	25
Eğitim Bilimleri Fakültesi	535
Fen Fakültesi	18
Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi	22
Hemşirelik Fakültesi	269
Hukuk Fakültesi	31
İlahiyat Fakültesi	13
İletişim Fakültesi	1
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	62
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	3
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1
Siyasal Bilgiler Fakültesi	186
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü	60
Veteriner Fakültesi	43
Toplam	2.055

Kaynak: 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

4.2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo-24 Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Yatırımları

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Sağlık	2023I00-206147	Muhtelif İşler	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında büyük onarımının yapılması ve hastanelerin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında büyük bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir ve muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları ödenekler sınırında karşılanmıştır.
Sağlık	2011I00-1432	İbni Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	Ödenek Sınırında Projenin Gerçekleşmesi Planlanmıştır.	Proje devam etmektedir.
Sağlık	2023I00-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi Kapsamında Büyük Onarım İle Makine-Teçhizat İhtiyaçlarının Karşılanması Hedeflenmiştir.	Geçici kabul aşamasındadır.
Sağlık	2021I00-178521	İbn-i Sina Ameliyathane Tadilatı	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Bakım Onarımının Yapılması Planlanmıştır.	Proje devam etmektedir.
Eğitim	2023H03-212119	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1 Adet Etüd Proje Hizmeti Alınması Planlanmıştır.	Hedeflenen Kapasite Gerçekleşmiştir.
Eğitim	2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum Ve Jinekoloji Binası Yapım İşİ Tamamlanması ve Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Seralar Gençlik Merkezi Onarım İşinde Geçici Kabul Aşamasına Geçilmesi Hedeflenmiştir.	Hedeflenen Kapasite Gerçekleşmiştir.
Eğitim	2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Bakım Onarımının Yapılması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Yapım ve Bakım Onarım İşİ Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2023H03-212121	Muhtelif İşler	Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tablet Bilgisayar, Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazları ile Muhtelif Demirbaşların ve Makine Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2023H03-212113	Yayın Alımı	Üniversitemiz kütüphane basılı, elektronik, süreli yayın alımı ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje kapsamında mevcut ödenekleri çerçevesinde süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliği ve kitap alımları gerçekleştirilmiştir.

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-24 Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Kültür	2014H04-2028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	Ödenek Sınırında Projenin Gerçekleşmesi Planlanmıştır.	Proje devam etmektedir.
Kültür	2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Restorasyonlarının Yapılması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Etüd Proje, Restorasyon, Onarım ve Hizmet Alım İşi Gerçekleştirilmiştir.
Kültür	2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	Yazma Eserler Depolama Alanı Alt Yapısı – Yazma Eserler Kataloglama Denetleme İşi	Alt yapı gerçekleşti. Kataloglama devam etmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor	2019H05-15269	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	Çeşitli Bina ve Spor Tesisatlarının Bakım Onarımının Yapılması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirdi.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Proje ihtiyacı makine-teçhizat alımları ve personel giderlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	Ödenek kısıtı altında alımlar kısmen gerçekleştirilmiş olup; personel giderlerine yönelik ödemeler gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2023K12-213154	Yer Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi	Konfokal Raman Spektrometresi Lazerleri, Ergiyik Kapanım Sistemi, TL-OSL Tarihlendirme Sistemi, Duraylı İzotop Analiz Sistemi, Mikro Kimyasal Analiz Sistemi, SEM için Raman Spektroskopisi Sistemi, Yeriçi Görüntüleme Sistemi Alımı Yapılması Planlanmıştır.	TL-OSL Tarihlendirme Sistemi ve Duraylı İzotop Analiz Sistemi alınmıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2023K12-213153	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	Ödenek Sınırında Projenin Gerçekleşmesi Planlanmıştır.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2022K12-184727	AB-IPA - Yenilikçi Kanser Terastonik GMP	Ödenek Sınırında Projenin Gerçekleşmesi Planlanmıştır.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	Kök hücre alanında, klinik uygulamalar ve araştırma çalışmalarında eksikliği doldurmak amaçlanmaktadır.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K12-21024	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	Kanser görüntülemesi için kullanılacak olan radyoaktif madde üretim alt yapısının kapasitesinin artırılması.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2023K12-213155	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Tahsis edilen ödenek ile Üniversitemizde yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.	2023 yılında Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri için özel hesaptan harcama yapılmış olup, ayrıca YÖK Başkanlığının Araştırma Üniversiteleri Destek Programına ilişkin Usul ve Esasları çerçevesinde kullanılmak üzere hazine yardımı karşılığı olarak ödenek tahsis edilmiştir.

5. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. 2023 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 3 adet proje ve yıl içerisinde eklenen 1 adet proje olmak üzere toplam 4 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için 171.000.000,00 TL hazine yardımı ve 2.000.000,00 TL döner sermaye karşılığı olmak üzere toplam 173.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi için hazine 15.000.000,00 TL Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden, 75.000.000,00 TL likit ödenekten ve kurum içi aktarmadan olmak üzere toplam 105.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında büyük onarım giderleri için 2.057.000,00 TL likit karşılığı ve makine teçhizat alımları için döner sermaye karşılığı olarak 15.500.000,00 TL ödenek kaynak aktarılmıştır. Sağlık sektöründe Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi büyük onarım ve makine-teçhizat alımları, İbni Sina Deprem Güçlendirme Projesi büyük bakım onarımları, İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı Projesi büyük onarım giderleri ve Muhatelif İşler Projesi kapsamında hastanelerin büyük bakım onarımları ve makine teçhizat alımları için toplam 89.709.026,28 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. (Ayrıca ilave olarak İbni Sina Hastanesi Deprem Güçlendirme Projesinde 77.326.016,64 TL bütçe dışı avans kullanılmış olup, bu tutar toplam harcamaya dahil edilmemiştir.)

Tablo-25 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2020	55.711	69.606	37.481
2021	103.200	134.150	79.840
2022	94.340	376.640	285.578
2023	173.000	280.557	89.709

Grafik-5 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

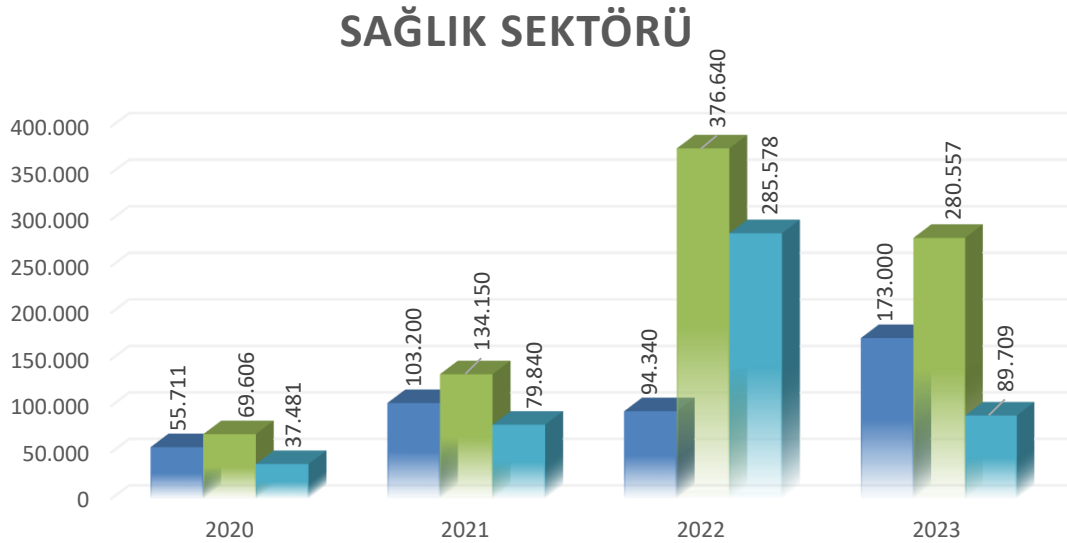


2023 yılında 5 adedi yükseköğretim, 3 adedi kültür sektöründe ve 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 9 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam 188.500.000,00 TL tutarında kaynak tahsis edilmiştir.

Yıl içerisinde 70.500.000,00 TL Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş, 25.950.000,00 TL likit karşılığı ödenek kayıtları ile desteklenmiştir ve revize ödenek toplamı 282.893.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı, çeşitli restorasyon işlerinin yapıldığı görülmektedir. Diğer taraftan birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yayın alımları, bilişim malzemesi alımları ve makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.

Tablo-26 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2020	38.350	40.850	38.072
2021	57.650	67.350	58.014
2022	60.700	114.717	72.206
2023	188.500	282.893	248.168

Grafik-6 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

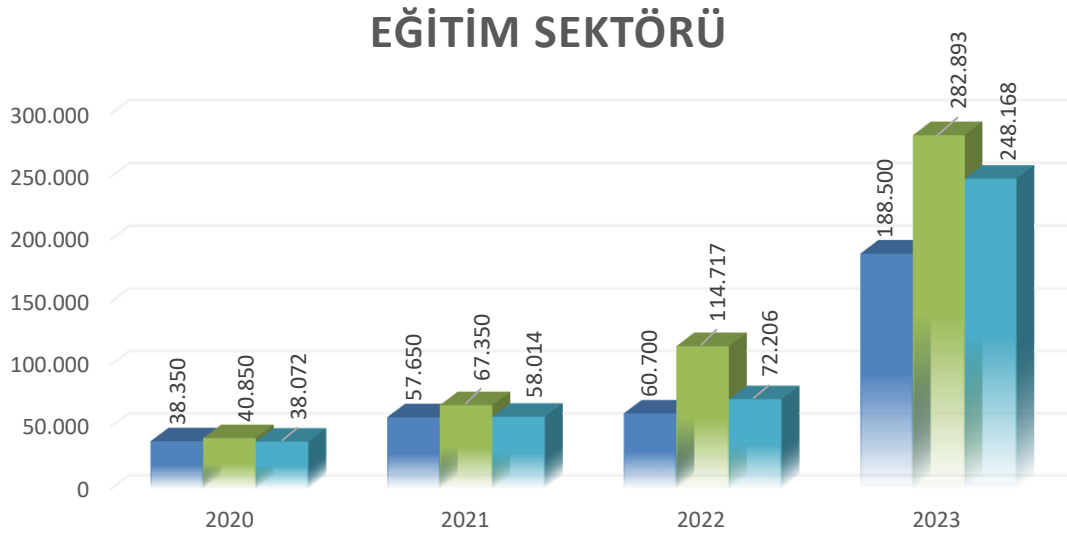

2023 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için toplam 40.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine gelir fazlası karşılığı olarak 33.266.000,00 TL ve YÖK desteği olarak 11.862.000,00 üzere ödenek eklenmiştir.

Bilindiği üzere, söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.


2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-27 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2020	41.388	51.666	51.666
2021	57.383	65.483	65.483
2022	85.304	155.278	155.278
2023	40.000	85.128	85.128

Grafik-7 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

(DKH) SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ

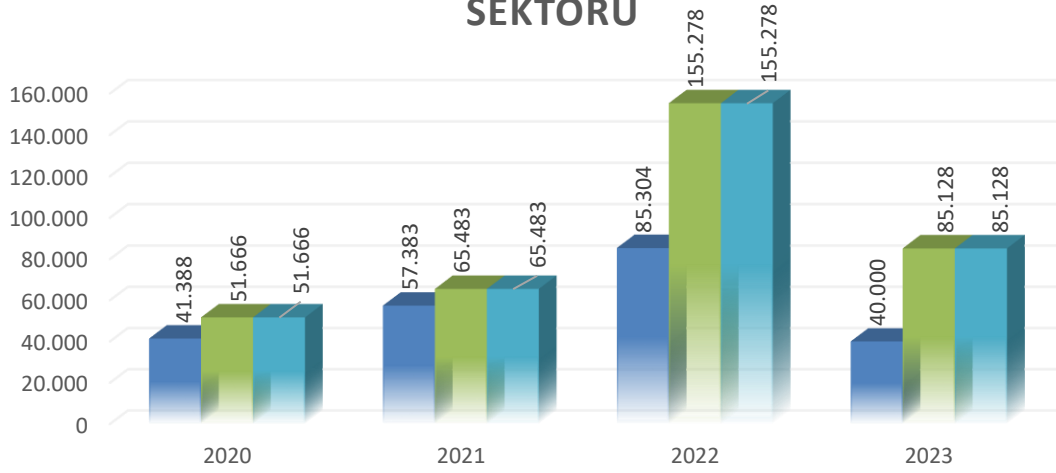

Tablo-28 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2022 Sonu Kümülatif Harcama	2023 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2023 Yılı Harcama
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	40.973	39.973	1.000			1.000	1.002
2023K12-213154	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk.	6.868	0	6.868			6.868	8.660
2023K12-213153	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresele Ürün Geliştirme Altyapısı	6.170	0	6.170			6.170	5.463
2022K12-184727	AB-IPA - Yenilikçi Kanser Teranostik GMP	35.642	35.640	2			2	1.170
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	269.801	259.801	10.000			10.000	35.373
2017K12-21024	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	55.638	55.636	2			2	241
KB Destekli Projeler Toplamı		415.092	391.050	24.042	0	0	24.042	51.909
2023K12-213155	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri*	15.958	0	15.958	45.128		61.086	61.086
GENEL TOPLAM		431.050	391.050	40.000	45.128	0	85.128	112.995

(1) Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır.

(2) Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2023 yılı yatırım programında sosyal teknolojik arařtırmalar sektöründe toplam 7 adet proje için 24.042.000,00 TL hazine yardımı ve 15.958.000,00 TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 40.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Rektörlük Bilimsel Arařtırma Projelerine gelir fazlası karşılığı olarak 33.266.000,00 TL ve YÖK desteđi olarak 11.862.000,00 yapılan işlemlerle birlikte toplam ödenek 85.128.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin tamamı özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 112.994.916,03 TL harcanmıştır.

Tablo-29 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2022 Sonu Kümülatif Harcama	2023 Program Ödeneđi	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2023 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2023H03-2121219	Muhtelif İşler (Mak. Teçhizat) (Eđitim)	45.000	0	45.000	23.075	6.285	61.790	56.514	56.514
2023H03-2121113	Yayın Alımı	20.000	0	20.000	5.000	1.300	23.700	23.659	23.659
2023H03-2121219	Muhtelif İşler (Bil. Teknoloj.)	10.000	0	10.000	5.560	1.050	14.510	14.509	14.509
2023I00-206147	Muhtelif İşler (Mak. Teçhizat) (Sađlık)	25.000	0	25.000			25.000	22.634	22.634
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	7.309	4.000	1.000			1.000	761	4.761
2023I00-217181	Giriřimsel MR Klinik Arř. ve Uygulama Merkezi	0	0	0	75.000	5.000	70.000	0	0
TOPLAM		107.309	4.000	101.000	108.635	13.635	196.000	118.077	122.077

Makine-teçhizat, biliřim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eđitim sektöründe yer alan 4 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sađlık sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 6 adet proje için 2023 yılı programında 101.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sađlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı yatırım hızlandırma ödeneđi kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından makine-teçhizat, yayım alımı ve bilgi teknolojileri projelerinin toplam ödeneđi 196.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin 118.077.316,76 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %60,24'tür.

Tablo-30 Etüt-Proje-İnřaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2022 Sonu Kümülatif Harcama	2023 Program Ödeneđi	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2023 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2023H05-212633	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000	0	2.000			2.000	1.519	1.519
2023H03-2121119	Çeřitli Ünitelerin Etüd Projesi	500	0	500	113		613	101	101
2020H03-150547	Büyük Onarım	145.200	64.200	61.000	36.000		97.000	81.134	145.334
2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	21.000	0	15.000	15.280		30.280	22.687	22.687
2011I00-1432	İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç.	216.798	3.608	84.000			84.000	5.082	8.690
2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	156.441	122.441	34.000		15.000	19.000	2.679	125.120
2023I00-206147	Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	28.000	0	28.000	2.057		30.057	29.638	29.638
2023I00-217181	Giriřimsel MR Klinik Arařtırma ve Uygulama Merkezi	0	0	0	35.000		35.000	29.675	29.675
2014H04-2028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	5.500	0	5.500		5.494	6	0	0
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	127.000	0	28.500	23.494		51.994	47.285	47.285
TOPLAM		702.439	190.249	258.500	111.944	20.494	349.950	219.800	410.049

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 6 adet, sağlık sektöründe 4 adet olmak üzere, toplam 10 adet proje için 2023 yılı programında toplam 258.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından etüt, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği 349.950.000,00 TL olmuştur. Ödeneğin 219.799.826,86 TL'si kullanılmış olup gerçekleştirme oranı %62,81'dir.

Tablo-31 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)

Açıklama	Proje Tutarı	2022 Sonu Kümülatif Harcama	2023 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2023 Yılı Harcama	Toplam Harcama
Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler*	431.050	391.050	40.000	45.128	0	85.128	112.995	504.045
Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım	702.439	190.249	258.500	111.944	20.494	349.950	219.800	410.049
Makine Teçhizat	87.309	4.000	71.000	98.075	11.285	157.790	79.909	83.909
Yayın Alımı	20.000	0	20.000	5.000	1.300	23.700	23.659	23.659
Bilgi Teknolojileri	10.000	0	10.000	5.560	1.050	14.510	14.509	14.509
GENEL TOPLAM	1.250.798	585.299	399.500	265.707	34.129	631.078	450.872	1.036.171

**Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır. Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.*

Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2023 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için (döner sermaye hariç) 399.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 631.078.000, 00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 85.128.000,00 TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2022 yılından devreden tutar ve 2023 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde projeler ihtiyacına toplam 105.950.000,00 TL likit karşılığı olarak ödenek eklenmiştir. Ayrıca Bilimsel Araştırma Projeleri ihtiyacına da gelir fazlası karşılığı toplam 45.128.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında toplamda; 85.500.000,00 TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2023 yılı yatırım programında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından toplam 20 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 248.168.117,34 TL, sağlık sektöründeki projeler için 89.709.026,28 TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 112.994.916,03 TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 450.872.059,65 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-32 2023 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	EKLENEN					DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
		LİKİT	EK BÜTÇE	GELİR FAZLASI	AKTARMA	YEDEK ÖDENEK			
06.1 Mamul Mal Alımları	120.979.000	95.000.000		35.128.000	2.400.000	5.000.000	12.510.000	245.997.000	167.942.775
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	5.936.000			10.000.000				15.936.000	15.936.000
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	10.721.000				4.190.000		1.050.000	13.861.000	13.860.994
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.500.000	3.893.000				11.500.000		30.893.000	22.787.138
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.271.000				3.370.000			5.641.000	5.590.799
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	243.623.000	7.057.000			5.075.000	69.000.000	6.475.000	318.280.000	196.417.439
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	470.000							470.000	470.000
TOPLAM	399.500.000	105.950.000	0	45.128.000	15.035.000	85.500.000	20.035.000	631.078.000	423.005.144

b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeniyle vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.
2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarımı Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda mali bir baskı yaratmaktadır.
6. Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır.
7. Ödenklerin aylık olarak serbest bırakılması nedeniyle hakediş ödemelerinin yapılmasında aksaklıklar meydana gelmekte olup, bu nedenle özellikle yapım işlerinde işlerin bitiş süresi uzamaktadır.

6. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-33 Sağlık Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2023100-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	2023-2024	Makine ve Teçhizat- Büyük Onarım	0	105.000.000,00	29.674.761,11	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi büyük onarım kısmı geçici kabul aşamasında olup, 29.674.761,11TL harcanmıştır.
2011100-1432	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	2011-2025	Büyük Onarım	84.000.000	84.000.000	5.082.401,15	İbni Sina Hastanesi Deprem Güçlendirme Projesinde 77.326.016,64 TL bütçe dışı avans kullanılmış olup, bu tutarlar harcamaya dahil edilmemiştir.
2021100-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	2021-2023	Büyük Onarım	34.000.000	19.000.000	2.679.136,95	Acil büyük bakım onarım ihtiyacı bulunan binaların büyük bakım onarımının yapılması için kullanılmıştır.
2023100-206147	Muhtelif İşler	2023-2023	Makine ve Teçhizat- Büyük Onarım	53.000.000	55.057.000	52.272.727,07	Proje kapsamında büyük bakım onarım işleri yapılmıştır. Diğer taraftan hastanelerin muhtelif makine-teçhizat ihtiyaçları proje kapsamında karşılanmıştır. Yıl içerisinde 2.057.000,00 TL likit ödenekten, ödenek tahsis edilmiştir.

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-34 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023I00-206147	Muhtelif İşler	5 Kalem İnşaat Bakım Onarım Malzemelerinin Satın Alınması Çift Bütçe	Doğrudan Temin	39.600
		100 Kalem İnşaat Elektrik Ve Tesisat Mazemesi Alımı	Doğrudan Temin	492.422
		40 Kalem Malzeme Alımı İnşaat Elektrik Ve Tesisat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	511.342
		Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Radyoloji Bölüm Binası Çatı Yapım İşi	Doğrudan Temin	507.360
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ameliyathanesi Sterilizasyon Ünitesi Gider Tesisatı Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	508.440
		Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Ecza Deposu Alt Yapı Tadilatı Ve Dtcf Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi	Doğrudan Temin	504.000
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Merkezi Binasını Besleyen Ana Temiz Su Hattı Yenilenmesi İle İlahiyat Fakültesi Çatı Ve Çevre Duvar Tadilatı Yapım İşi	Doğrudan Temin	502.800
		Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi İl Sağlık Müdürlüğü Taleplerinin Tamamlanması Yapım İşi	Doğrudan Temin	505.200
		2022/955147 İhale Kayıt Numaralı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Abd Laboratuvar Tadilatı İşi (Çift Bütçe Eğitim Ve Muhtelif İşler Sağlık)	Açık İhale	1.320.000
		2023/540974 Ankara Üniversitesi Balgat Kök Hücre Enstitüsü Binası Çatı Onarım İşi	Açık İhale	1.517.888
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ameliyathane Katı Genel Cerrahi Bölümleri Ameliyathaneleri Yenileme Tadilatı Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	501.600
		Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Hijyenik Ortam Temizleme Kompresörü İle Siber Güvenlik Myo Yapım İşi	Doğrudan Temin	510.000
		Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Elektrofizyoloji Laboratuvarı Zemin Tadilatı İle Ataum Binası Kanalizasyon Hatları Yenileme İşi	Doğrudan Temin	507.960
		2021/474502 İhale Kayıt Numaralı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Laboratuvarı Onarım İşi Kesin Hakediş Ödemesi	Açık İhale	1.701
		2023/176547 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Kafeterya Binası İnşaat İşi (Çift Bütçe)	Açık İhale	701.870
		98 Kalem İnşaat Tesisat Ve Elektrik Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	511.995
		97 Kalem İnşaat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	511.261
		A.Ü.Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisat Onarım Yapılması İşi	Doğrudan Temin	178.770
		Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarı 1 İle Adli Tıp Enstitüsü Tadilat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	509.400
		Ankara Üniversitesi Hayvan Hastanesi Acil Polikliniği İklimlendirme Tesisatı İle Keçiören Kız Öğrenci Evi Pis Su Hattı Tadilatı Yapım İşi	Doğrudan Temin	507.480

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ankara Üniversitesi Nükleer Tıp Abd Binası Drenaj Kuyusu Yapımı İle Veteriner Fakültesi Sosyal Alan Düzenlenmesi Yapım İşi.	Doğrudan Temin	505.200
2021/424900 İhale Kayıt Numaralı Ve 0187 Barkod Numaralı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Uygulama Hastanesi Pdö Binası Onarım İşi Kesin Hakedişi	Açık İhale	3.667
Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Galeri Katı Klima Ve Voltaj Regülatörü Topraklama Kablosu Çekilmesi Yapım İşi.	Doğrudan Temin	68.440
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 7-8. Bloklar Muhtelif Bina Tadilatı İle 10. Yıl Ve 50. Yıl Yerleşkesi Yeni Yaya Giriş Kapısı Düzenlemesi Yapım İşi	Doğrudan Temin	507.000
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Giriş Cephe Kaplaması Ve Devlet Konservatuvarı Boya Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	510.000
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Tuvaletleri Tadilatı Yapım İşi	Doğrudan Temin	509.040
A.Ü.Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Mevcut Çamaşırhane Bölgesinin Sterilizasyon Ve Mr Görüntüleme Merkezine Dönüştürülmesi Tadilatı Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	474.000
Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Yerleşkesi Merkez Laboratuvarı Ve Muhtelif Binaların Elektrik Arızalarının Giderilmesi İşi.	Doğrudan Temin	222.000
2023/1085857 Ankara Üniversitesi Muhtelif Kazan Daireleri Onarım İşi	Pazarlık Usulü	7.000.000
Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastanesi Kalorifer Ve Galeri Tesisatı Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	381.408
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Uygulama Hastanesi Depo Onarım İşi	Açık İhale	4.131.713
Ankara Üniversitesi Keçiören Yerleşkesi İle Cebeci Tıp Yerleşkesi Alt Yapı Tadilatı Yapım İşi	Doğrudan Temin	506.400
Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Dış Cephe Tadilatı Yapım İşi	Doğrudan Temin	508.560
Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama Ve Araştırma Merkezi İle Gıda Güvenliği Enstitü Müdürlüğü Çatı Tadilatları Yapım İşi	Doğrudan Temin	499.200
Ankara Üniversitesi Therahub Binası Muhtelif Mahallerde Onarım Yapılması İşi	Doğrudan Temin	498.000
153 Kalem İnşaat Bakım Onarım Malzemelerinin Satın Alınması	Doğrudan Temin	512.846
Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd. Poliklinik Ve Öğretim Üyeleri Katı Radyatörlerin Değişimi Ve Morfoloji Binası Nemlendirme Cihazı Su Arıtma Sistemi Yapılması İşi	Doğrudan Temin	420.000
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.B.D. Asistan Odası Yapımı Ve Öğretim Üyeleri Odası Bölme Yapım İşi	Doğrudan Temin	507.840
264 Kalem İnşaat Bakım Onarım Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	510.512
178 (Yüzyetmişsekiz) Kalem İnşaat, Bakım Onarım Malzemelerinin Satın Alınması.	Doğrudan Temin	511.544
TOPLAM		29.638.460

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-35 İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşi

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2011I00-1432	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Hastanesi Deprem Performansının İyileştirilmesi Ve Cephe Onarım İşi (2023-2026)	Pazarlık Usulü	5.082.401
TOPLAM				5.082.401

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-36 İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım İşi

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2021I00-178521	İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Kbb, Üroloji Ve Genel Cerrahi Ameliyathaneleri Büyük Onarım İşi (2021-2022 Yıllarına Sari) 9- Ek Hakediş	Pazarlık Usulü	2.679.137
TOPLAM				2.679.137

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-37 Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşi

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023I00-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	Ankara Üniversitesi Girişimsel MR Klinik Araştırma Uygulama Merkezi Tadilat İşi	Pazarlık Usulü	29.674.761
TOPLAM				29.674.761

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-38 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023I00-206147	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	Lastikli Çarşaf (866684 num. Yazı), Çarşaf (866684 num. Yazı), Nevresim Takımı (866684 num. Yazı), Nevresim Takımı Somon (866684 num. Yazı), Pike (866684 num. Yazı), Yastık Kılıfı (866684 num. Yazı), Yastık Kılıfı (866684 num. Yazı), Yatak Alezi (866684 num. Yazı)	DMO	878.482
		Büyük Buzdolabı (866684 num. Yazı)	DMO	15.836
		İbn-i Sina Ve Cebeci Hastanesi Jinekolojik Obstetrik Muayene Masası	DMO	36.690
		Evsel Atık Kovası 40 Lt (866684 num. Yazı), Evsel Atık Kovası 25 Lt (866684 num. Yazı)	DMO	54.500
		Yastık ve Battaniye	DMO	222.746

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İbn-i Sina ve Cebeci Hast. Sabit Renkli Doppler Ultrason Cihazı	DMO	711.995
İbn-i Sina ve Cebeci Hast. Sabit Renkli Doppler Ultrason Cihazı	DMO	904.120
Buzdolabı (866684 num. Yazı)	DMO	52.439
Bilgisayar Kasası (866684 num. Yazı)	DMO	1.497.694
Bilgisayar Monitörü	DMO	348.302
Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı	DMO	787.643
Röntgen Cihazı	DMO	1.996.156
Lazer Yazıcı	DMO	354.128
Lazer Yazıcı	DMO	207.469
Masaüstü Bilgisayar	DMO	422.092
Tarayıcı	DMO	194.592
Monitör	DMO	118.043
5 Kalem Malzeme Alımı	DMO	43.872
Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı	Açık ihale	1.077.840
Tms/Tmu/Rtms (neurosoft marka, neuro ms/x model)	Açık ihale	1.522.400
Tee Probundan	Açık ihale	810.000
10 Kısım Cerrahi Alet Cebeci Kadın Doğum (6 Kalem Cerrahi Alet)	Açık ihale	32.101
10 Kısım Cerrahi Alet Cebeci Çocuk Ameliyat (4 kal. cerrahi alet)	Açık ihale	104.570
10 Kısım Cerrahi Alet İbni Sina Gen. Cer. Ameliy. (8 kal. Cerrahi alet)	Açık ihale	85.184
10 Kalem Tıbbi Cihaz	Açık ihale	2.741.423
86 Derece Derin Dondurucu	Doğrudan Temin	140.400
Ekokardiyografi Cihazı	Doğrudan Temin	290.250
Ultrasonic Kemik Kesici Cihaz Takımı	Doğrudan Temin	132.840
Mini Sütür Geçirici El Aleti	Doğrudan Temin	67.770
El Motoru	Doğrudan Temin	147.420
Tur Motoru	Doğrudan Temin	278.640
Emg Cihazı	Doğrudan Temin	65.890
Cebeci Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Artroskopik Shaver El Motoru	Doğrudan Temin	216.700
Hidrojen Proksit (Göz Hastalıkları-Çocuk Ameliyathane	Pazarlık Usulü	4.202.000
Radyoloji Bölümü Renkli Doblör	Doğrudan Temin	1.573.000
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D Faz Kontrast Cctv Mikroskop	Doğrudan Temin	210.600
Tıbbi Parazitoloji Mikroskopik 4k Çözünürlüklü Kamera Sistemi	Doğrudan Temin	88.440
TOPLAM		22.634.267

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-39 Eğitim Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2023H05-212633	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	2023-2023	Bakım Onarım, Makine-teçhizat	2.000.000	2.000.000	1.518.960	A.Ü çevre ve spor alanları düzenlenmesi işi için kullanılmıştır.
2023H03-212119	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2023-2023	Etüd Proje	500.000	613.000	100.500	1 adet etüd proje hizmeti alınmıştır
2020H03-150547	Büyük Onarım	2020-2024	Büyük Onarım	61.000.000	97.000.000	81.134.089	Proje kapsamında birçok binanın bakım onarım işlemleri gerçekleştirilmiş olup, ayrıca 6.250.000,00 TL bütçe dışı avans olarak kullanılmış ve toplam harcama tutarına dahil edilmemiştir.
2023H03-212113	Yayın Alımı	2023-2023	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	20.000.000	23.700.000	23.658.695	Proje ödeneği süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliğinde ve kitap alımında kullanılmıştır.
2023H03-212121	Muhtelif İşler	2023-2023	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	55.000.000	76.300.000	71.023.518	Proje kapsamında muhtelif birimlerin ihtiyacına makine-teçhizat alımları, tefriş ve bilişim teknolojileri alımları gerçekleştirilmiştir. Ödeneğin 56.514.110,29 TL'si muhtelif makine-teçhizat alımları ve tefriş alımlarında, 14.509.407,42 TL'si ise bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır.
2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	2022-2024	Eğitim	15.000.000	30.280.000	22.686.638	Veteriner Fakültesi Doğum Ve Jinekoloji Binası tamamlanmış olup, . Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Seralar Gençlik Merkezi Onarım işinde geçici kabul aşamasına geçilmiştir.
2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2014-2023	Etüd Proje	5.500.000	6.000	0	Proje devam etmektedir.
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2014-2025	Restorasyon	28.500.000	51.994.000	47.284.881	Ankara Üniversitesi çeşitli yerleşkelere ait restorasyon işi kapsamında kullanılmıştır.
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	2018-2025	Bakım onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri	1.000.000	1.000.000	760.837	Alt yapı gerçekleşti ve kataloglama devam etmekte olup, toplam harcama 760.837,20 TL' dir tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-40 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İş	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023H05-212633	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi Açık Kaplı Tenis Kortları Yanı Tesis Tadilatı Yapım İş	Doğrudan Temin	502.200
		Ankara Üniversitesi Piri Reis Spor Salonu Pis Su Hattı Tadilatı İle Bilimsel Yayılar Koordinatörlüğü Binası Isıtma Sistemine Ve Çatı Tadilatı Yapılması İş	Doğrudan Temin	507.600
		Ankara Üniversitesi Olimpik Havuz Pis Su Hattı Tadilatı İle Nallıhan MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İş	Doğrudan Temin	509.160
TOPLAM			1.518.960	

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-41 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2023H05-212633	-
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	-
Proje Amacı	A.Ü Çevre ve Spor Alanları Düzenlenmesi İş için kullanılmıştır	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Makine-teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	-
Proje Tutarı (maliyeti)	2.000(Hazine Yardımı)	-
Yapılan Harcama		1.519

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-42 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2023H03-212119	-
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Etüt Proje Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Etüd-Proje	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	-
Proje Tutarı (maliyeti)	500 (Hazine Yardımı)	613
Yapılan Harcama		101

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-43 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023H03-212119	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Çankırı İli Şabanözü İlçesi, Çaparkayı Köyünde Bulunan Hazineye Ait, 117 Ada 80 Parsel Nolu Taşınmaz / Taşınmazlar için 2023 yılında yatıracağınız etüt ücreti ödemesi.	Kamu İhale Kanuna Tabi Olmayan Harcamalar	100.500
TOPLAM				100.500

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-44 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi Yazılım Koordinatörlüğü Ve Veri Koordinatörlüğü Yapım	Doğrudan Temin	495.600
		Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Laboratuvarı Bloğu Isıtma Sistemi Ana Hat Değişimi Yapılması İş	Doğrudan Temin	510.000
		Ankara Üniversitesi Nallıhan Kız Öğrenci Lojmanı Muhtelif Tadilatlar Yapılması İş	Doğrudan Temin	502.800
		Ankara Üniversitesi AKKEM Binası İle Piri Reis Spor Salonu Sıcak Su Kazan Değişimi Yapım İş	Doğrudan Temin	507.240
		Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi Teknik İşler Birimi Depo Yapım İş	Doğrudan Temin	510.000
		Ankara Üniversitesi Milli Piyango Öğrenci Evi Kazan Bakımları İle Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Havalandırma Yapım İş	Doğrudan Temin	505.200
		Ankara Üniversitesi Kök Hücre Binası Havalandırma Tadilatı Yapım İş	Doğrudan Temin	420.000
		Ankara Üniversitesi. İletişim Fakültesi Tuvaletleri Yenileme Yapım İş.	Doğrudan Temin	501.500
		Şartnamede Detayları Belirtilen Toplam 12 Adet Modüler Bölme Alımı	Doğrudan Temin	266.680
		Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kütüphane Ve Sınıfları Led Aydınlatma Dönüşümü Ve Boya Tadilatı Yapım İş.	Doğrudan Temin	494.420
		Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Data Sistem Odası Tadilatı Ve Data Hatları Yapım İş	Doğrudan Temin	507.000
		Ankara Üniversitesi Ayaş M.Y.O. Derslik Ve Yönetim Binası Boya Tadilatı İle Çevre Düzenlemesi Yapım İş	Doğrudan Temin	505.800
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Asansörlerin Arızalarının Giderilmesi Ve Fen Fakültesi Polimer Araştırma Laboratuvarı Topraklama Yapım İş	Doğrudan Temin	62.400
		Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Muhtelif Asansörlerin Periyodik Bakımlarının Yapılması İş.	Doğrudan Temin	245.039
		Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Muhtelif Asansörlerin Muayene Eksiklerinin Ve Arızalı Asansörlerin Tamiratının Yapılması İş.	Doğrudan Temin	84.370
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Asansörlerin Muayene Eksiklerinin Tamamlanması Ve Arızalarının Tamiri Yapım İş	Doğrudan Temin	40.200
		Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo İLEF Ups Arızalarının Giderilmesi Ve Akülerin Yenilenmesi İş	Doğrudan Temin	25.200
		Ankara Üniversitesi Haymana M.Y.O. Ve Yabancı Diller Y.O.Kesintisiz Güç Kaynağı Akülerinin Değişimi ve Arızalarının Giderilmesi Yapım İş	Doğrudan Temin	62.400
		Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Keson Kuyu Yapım İş	Doğrudan Temin	67.200
		Ankara Üniversitesi Yağmur Suyu Toplama Kuyusu Ve Hattı Yapım İş.	Doğrudan Temin	110.400
Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğalgaz Kaçaklarının Giderilmesi İş	Doğrudan Temin	30.000		

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ankara Üniversitesi YEBİM Binası Kazan Dairesi Kolektör ve Pompa Değişimi Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	510.000
Ankara Üniversitesi. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Şöforsüz Araç Kiralama Hizmet Alım İşİ.	Doğrudan Temin	114.048
Ankara Üniversitesi.10.Yıl Yerleşkesi Çevre Düzenleme İşİ.	Doğrudan Temin	191.160
Ankara Üniversitesi SKS Binası Kazan Dairesi ve Depo Alanları Sıcak Soğuk Temiz Kullanım Suyu Hatları Yenileme İşİ	Doğrudan Temin	508.800
Ankara Üniversitesi Süt İşletmesi Binası Buhar Kazanı Tadilatı İle Güzel Sanatlar Fakültesi Tuvalet Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	505.200
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülteleri Tarım Makinaları Bölümü İle Bahçe Bitkileri Bölümü Aydınlatma Tadilatları Ve Boya Tadilatı Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	493.830
Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Otomasyon Sulama Sistemi Yapılması Ve Su Yönetimi Enstitüsü Wc Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	268.200
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Açık Besi Ahır Çatı Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	509.760
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mutfak Yenilenmesi İle Islak Hacim Kapıları Yapım İşİ	Doğrudan Temin	508.200
Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Muhtelif Binaların Yangın Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	336.920
Ankara Üniversitesi Rektörlük Senato Odası Endüstriyel Monitör Montajı Ve Kablolama Altyapısı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	155.784
Ankara Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Kız Ve Erkek Öğrenci Evi Yangın Alarm Sisteminin Yapım İşİ.	Doğrudan Temin	301.254
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mantar Üretim Tesisi Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	495.600
Ankara Üniversitesi Ayaş Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Sera Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	333.600
Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Açık Spor Sahaları Zemin Kaplaması Yapım İşİ	Doğrudan Temin	483.000
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Davranış Bilimi Laboratuvarı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	504.840
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Bina Amfileri Boya Tadilatı Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	502.680
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tusaş Laboratuvarı Yapımı İle Hukuk Fakültesi A Blok Amfi Boya Tadilatı Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	495.305
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi Döşeme Boyası Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	507.360
2023/1204851 Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Şevket Aziz Kansu Binası 8.Kat Ofis Tadilatı İşİ	Açık İhale	1.258.576
Ankara Üniversitesinde Adalet M.Y.O. Led Aydınlatma Sistemine Dönüşüm Ve Boya Tadilatları Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	496.780
Ankara Üniversitesi.50.Yıl Yerleşkesi İle Dışkapı Yerleşkesi Muhtelif Birimler Data Hattı Yapım İşİ.	Doğrudan Temin	498.550
Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ofis Tadilatı İle Herbaryum Polen Tuzağı Elektrik Ve Datahattı Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	499.140
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Myo Çatı Ve Boya Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	507.600
SAYFA TOPLAMI		17.439.636

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-44 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI				17.439.636
2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	Ankara Üniversitesi Basım Evi İlahiyat Fakültesi Ve ANKÜSEV Binaları Doğalgaz Tesisatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	504.000
		Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Binası Kalorifer Tesisatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	498.000
		56 Kalem İnşaat Elektrik Ve Tesisat Malzemesi Alımı.	Doğrudan Temin	502.852
		Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kazan Dairesi Doğalgaz Dönüşümü Ve Baca Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	480.000
		Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi Jeneratör Ağır Bakımlarının Yapılması Ve Muhtelif Jeneratörlerin Arızalarının Giderilmesi İşİ	Doğrudan Temin	36.000
		Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Tören Alanının Jeneratör İle Beslenmesi İşİ.	Doğrudan Temin	181.720
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Birimlerin Jeneratörlerinin Ağır Bakımlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi Yapım İşİ	Doğrudan Temin	240.000
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Jeneratörlerin Periyodik Bakımlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi İşİ	Doğrudan Temin	170.542
		Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi Pis Su Ana Hat Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	507.840
		Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Dış Hekimliği Fakültesi Detaylı Etüt Ve Enerji Kimlik Belgesi Hizmet Alım İşİ.	Doğrudan Temin	165.600
		Ankara Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Şöforsüz Araç Kiralama Hizmet Alım İşİ.	Doğrudan Temin	117.493
		Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Y.O. Cephe Tadilatları Ve Bina Girişi Engelli Düzenlenmesi Yapım İşİ.	Doğrudan Temin	434.240
		2023/ 788647 İhale Kayıt Numaralı Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi F Blok Güçlendirme Ve Tadilat İşİ. (2023-2024 Yıllarına Sari)	Pazarlık Usulü	17.755.359
		Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Birimi Ofisleri Yapım İşİ	Doğrudan Temin	509.400
		2022/955147 İhale Kayıt Numaralı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Abd Laboratuvar Tadilatı İşİ. (Çift Bütçe Eğitim Ve Muhtelif İşler Sağlık)	Açık İhale	190.455
		2023/369768 İkn; Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi Öğrenci Sağlık Merkezi Onarım İşİ.	Pazarlık Usulü	1.937.992
		Ankara Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Depo Ve Arşiv Alanlarının Oluşturulması İşİ.	Doğrudan Temin	395.300
		Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Ve Beypazarı Myo Kompanzasyon Panolarının Revizyonlarının Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	192.000
		Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Orta Gerilimaboneliğine Bağlı 2 Adet Trafo Ve 3 Adet Trafo Kompanzasyon Panosunun 2023 Yılı Periyodik Takibinin Ve Bakımının Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	41.391
		2023/1085857 Ankara Üniversitesi Muhtelif Kazan Daireleri Onarım İşİ	Pazarlık Usulü	9.491.330
		Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Klima Santralleri Tadilat Yapım İşİ.	Doğrudan Temin	489.700
		Ankara Üniversitesi Gümüşdere Yerleşkesi Kalorifer Hatları İle Temiz Su Tesisatı Yenileme İşİ.	Doğrudan Temin	252.520
		Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi İle 10. Yıl Yerleşkesi Kazan Dairesi Bakım Ve Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	508.200
		Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Kazan Dairesi Bakım Ve Tadilatlarının Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	509.160
Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphane Binası Cephe Tadilat Yapım İşİ	Doğrudan Temin	509.400		

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2023/1312951 Ankara Üniversitesi Cebeci Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu Cephe Tadilat İşİ (2023-2024 Yıllarına Sari)	Açık İhale	2.909.255
Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Binaları Genleşme Tankları Yenilenmesi İle Ziraat Fakültesi Spor Salonu Klima Santrali Tadilat İşİ.	Doğrudan Temin	493.004
Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi D Blok Makina Dairesi Isıtma Pompası Değişim İşİ.	Doğrudan Temin	500.320
Ankara Üniversitesi 50.Yıl Yerleşkesi Yemekhane Katı Temiz Su Tesisatı Yenilenmesi Ve Bulaşıkhaneye Tadilatı Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	493.240
Ankara Üniversitesi BAP Klima Santrali Tadilatı İle UBF Peyzaj Düzenleme Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	501.000
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Suyu İşletme Binası Buharlı Boyler Sistemi Yenilenmesi İşİ	Doğrudan Temin	508.800
Ankara Üniversitesi 50.Yıl Yerleşkesi,10.Yıl Yerleşkesi, Ziraat Ve Veteriner Fakültesi, Cebeci Yerleşkesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi,60.Yıl Yerleşkesi Isıtma Soğutma Ve İklimlendirme Sistemlerinin 2022 Yılı Periyodik Bakımları Yapılması Hizmet Alım İşİ.	Doğrudan Temin	126.260
Ankara Üniversitesi Senato Salonu Ses Ve Görüntü Alt Yapı Sistemi İle Kontrol Odası Yapım İşİ	Doğrudan Temin	510.000
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi K-J-H Bloklar İle Yabancı Diller Yüksekokulu Boya Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	505.200
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Muhtelif Birimler Wifi Altyapısı Hazırlanması İşİ	Doğrudan Temin	504.000
2023/1120268 Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Myo Binası Tadilatı İşİ (2023-2024 Yıllarına Sari)	Açık İhale	-
Ankara Üniversitesi Keçiören Yerleşkesi Konferans Salonu Binası Çatı Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	513.600
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Ve Hayvan Besleme A.B.D.Binası Eski Yemekhanenin Uygulama Laboratuvarına Dönüştürülmesi İşİ.	Doğrudan Temin	300.900
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çevre Aydınlatma Ve Data Hattı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	516.000
2023/183060 İkn; Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Yerleşkesi Lojman Binasının Depremzede Vatandaşlar İçin Düzenlenmesi İşİ (Çift Bütçe)	Pazarlık Usulü	1.861.771
Ankara Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı E-Hakedişpro Güncel Sürüm Hizmet Alım İşİ.	Doğrudan Temin	43.500
Ankara Üniversitesi 50.Yıl Yerleşkesi Stadyumu Tribün Ve Kapalı Alanlarda Muhtelif Tadilatlar Yapım İşİ	Doğrudan Temin	509.400
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Çatı Tadilatı Ve İç Cephe Boya Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	502.200
SAYFA TOPLAMI		47.918.944

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-44 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI				65.358.580
2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tavşancılık Binası Çatısı ve Muhtelif Çatılar Tadilat Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	508.500
		Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Keçiören Giriş Nizamiyesi Düzenleme İşİ İle Eğitim Bilimleri Fakültesi Çatı Tadilatı Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	497.960
		Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Derslikleri Öğrenci Sıraları Tadilatı Ve Rektörlük Nizamiye Düzenlemesi İşİ.	Doğrudan Temin	496.190
		Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü KMD-1 VE KMD- 2 Dersliklerinin Birleştirilmesi İle Hemşirelik Fakültesi Amfi Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	507.600
		Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İMKB Bilgisayar Laboratuvarı Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	510.000
		Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Derslik Bloğu Kalorifer Ve Temiz Su Hatları Yenilenmesi İşİ	Doğrudan Temin	508.800
		Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Ankamer) Binası Tadilat Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	504.000
		Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası Boya Tadilatı Yapım İşİ.	Doğrudan Temin	492.650
		2023/981844 İKN; Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Seralar Gençlik Merkezi Onarım İşİ (2023-2024 Yıllarına Sari)	Pazarlık Usulü	5.767.395
		Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınıflarının Ve Koridorlarının Boya Tadilatı Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	496.780
		Ankara Üniversitesi Tarımsal Yapılar Ve Sulama Binası Wc Tadilatı İle Uluslararası Merkez Binası Çevre Koordinatörlüğü Tadilatı Yapılması İşİ.	Doğrudan Temin	496.190
		Ankara Üniversitesi Ahlatlıbel Yerleşkesi Altyapı Tesisatı PVC Doğrama ve Muhtelif Tadilat Yapım İşİ	Doğrudan Temin	509.040
		Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yeni Amfi Tadilatları Yapım İşİ	Doğrudan Temin	508.800
		Ankara Üniversitesi Nallıhan MYO. Kazan tadilatı ve Korkuluk Yapım İşİ	Doğrudan Temin	75.600
		Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Telefon Hattı Yapılması ve Santral Arzalarının Giderilmesi İşİ	Doğrudan Temin	174.000
		87 Kalem İnşaat Ve Elektrik Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	502.474
		Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odası 80 KVA UPS Akülerinin Yenilenmesi İşİ	Doğrudan Temin	232.800
		Ankara Üniversitesi ORD.PROF.DR. ŞEVKET AZİZ KANSU Binası Kültür Birimi Yapım İşİ	Doğrudan Temin	507.600
		Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binaları Çatı Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	507.600
		Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binaları Çatı Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	506.280
Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Çatı Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	504.000		
Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi Öğrenci Çözüm Merkezi İle SKS Ofisi Yapım İşİ	Doğrudan Temin	231.000		
TOPLAM				80.403.839

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-45 Yayın Alımı Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2023H03-212113	-
Proje Adı	Yayın Alımı	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	-
Proje Tutarı (maliyeti)	20.000 (Hazine Yardımı)	23.700
Yapılan Harcama		23.659

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-46 Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları

Proje No	Proje Adı	Alım Usulü	Alımı Yapılan Mallar	Alımın Toplam Maliyeti
2023H03-212113	Yayın Alımı	4734 Sayılı Kanununun 22/a-22/d maddesi	Sürelili Yayın Aboneliği Veri Tabanı Aboneliği Kitap Alımı Bilişim Malzemesi Alımları	23.658.695
TOPLAM				23.658.695

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tablo-47 Yazma ve Nadir Eserler Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
		MAL ALIMLI	Doğrudan Temin	760.837
TOPLAM				760.837

Kaynak: Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

Tablo-48 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2023H03-212121	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	-
Proje Tutarı (maliyeti)	54.098 (Hazine Yardımı) 902 (Öz Gelir)	75.398 (Hazine Yardımı) 902 (Öz Gelir)
Yapılan Harcama		76.300

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-49 Muhtelif İşler Projesi (Bilgi Teknolojileri) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023H03-212121	MUHTELİF İŞLER (Bilgi Teknolojileri)	Görev Yönetimi ve Sosyal Medya Takip Yazılımı	22/D	460.200
		Veriye Dayalı Der.Sis. Repütasyon Yön. ve Veri Analiz Sis.Yaz	22/D	444.240
		Ağ Yetkilendirme Yazılımı	22/D	213.000
		Redhat Lisans Yenileme	22/D	130.788
		Web Zafiyet Tarama Yazılımı	22/D	239.760
		Veri Sızıntı Önleme ve Engelleme Yazılımı	22/D	238.800
		Oracle Lisans Yenileme ve destek hizmeti	22/D	34.420
		Oracle Veritabanı Lisans yenileme ve destek hizmeti	22/D	29.275
		Jira Lisans Yenileme	22/D	7.782
		Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Lisansı	DMO	2.325.935
		Yedekleme Yazılımı Lisansı	DMO	1.185.733
		Güvenlik Duvarı Lisans Yenileme	DMO	2.387.743
		Microsoft İşletim Sistemi Lisans Güncelleme	22/D	1.325.517
		Sanallaştırma (VMWARE) Yazılımı Lisans	22/D	717.600
		Symantec SPS Uç Kullanıcı Güvenliği Lisansı	22/D	993.600
		Güvenli DNS ve DHCP Sistemi (Infoblox) Lisans Güncelleme	22/D	508.800
		Zafiyet Yönetimi Aracı Yazılımı Lisans Güncelleme	22/D	406.800
		Yangın Söndürme, İklimlendirme Klima bakım	22/D	90.678
		Kesintisiz Güç Kaynağı Yıllık Bakım	22/D	95.914
		Sunucu ve Disk Depolama Sistemi Yıllık Bakımı	22/D	339.150
		Kurumsal Veri Merkezi Yıllık Bakımı	22/D	237.703
		Teknik Servis Muhtelif Yedek Parça Alımı	22/D	318.037
		Network, Sistem Yedek Parça	22/D	247.980
		Network Yedek Parça	22/D	239.916
		Teknik Servis Yedek Parça	22/D	44.177
		Network, Sistem, Teknik Yedek Parça	22/D	225.950
		Ağ Anahtarlama Yedek Parça	22/D	38.520
		Sistem Yedek Parça	22/D	172.534
Teknik Servis Yedek Parça	22/D	509.311		
Teknik Servis ve Sistem Yedek Parça	22/D	299.544		
TOPLAM			14.509.407	

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Makine Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023H03-212121	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	İç Ortam Gece Görüşlü Kamera Gece Görüşlü Dom Kamera Dış Ortam Gece Görüşlü Kamera Barkod Yazıcı Sanal Gerçeklik Gözlüğü	22/D	52.038
		Güneşlik Perde Tül Perde Mescid Halısı Zebra Perde	22/D	64.049
		Soyunma Dolabı Dosya Dolabı Ayakkabılık	22/D	136.762
		Eliptik Bisiklet Koşu Bandı	22/D	479.760
		Verzalit Yemek Masası	22/D	78.540
		Çamaşır Yıkama Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi	22/D	83.214
		TOPLAM		

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-51 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023H03-212121	MUHTELİF İŞLER (Makine Teçhizat)	Görüntü Duvarı Dizüstü Bilgisayar Masaüstü Bilgisayar Monitör Erişim Noktası Erişim Noktası Projeksiyon Cihazı (Genel Sekreterlik) Masaüstü Bilgisayar Monitör Salon Tipi Klima Duvar Tipi Klima Duvar Tipi Klima Projeksiyon Cihazı Erişim Noktası Erişim Noktası Anahtarlama Cihazı Erişim Noktası Barkod Yazıcı Cebeci Öğrencievi Buzdolabı	DMO	6.152.596
		Çelik Raf Projeksiyon Cihazı Barkot Okuyucu	DMO	2.869.011

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	<p>98378-k2667 Dell Precision 3660 Tower Intel İ9 12900 64 Professional Masaüstü İş İstasyonu Masaüstü İş İstasyonu Hastane Otomasyon Sistemi İş İstasyonu Brother Yazıcı Brother Tarayıcı Brother Lazer Yazıcı Brother Lazer Yazıcı Nt 27/1 Adv Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Arçelik a65k 790g led tv, 65"iñ ultra hd led tv Vestel bm 3111 bulaşık makinesi Vestel sc47001 470 l f Çift Kapılı Buzdolabı Vestel nf27001 251 lt no-frost buzdolabı Arçelik 6144 Bulaşık Makinası Vestel cmı 97202 Wifi Çamaşır Yıkama Makinası Arçelik 6144 Bulaşık Makinesi Arçelik d 14790 Mb Büro Tipi Buzdolabı Arçelik a321l690 Vestel cd 6001e 220 Litre Dikey Tip Derin Dondurucu Büro Tipi Buzdolabı Çamaşır Makinesi Arçelik 9100m Led Televizyon Arçelik A50k 790g Derin Dondurucu Bulaşık Makinası Büro Tipi Buzdolabı Buzdolabı Çamaşır Makinesi Bulaşık Makinesi Büro Tipi Buzdolabı İmid Büro Tipi Buzdolabı Beko 870465 mb 465 l f Çift Kapılı Buzdolabı</p>		
	<p>Mikrofon Mikrofon Kitaplık Dosya dolabı Misafir koltuğu İkili koltuk kanepeler Tekli koltuk kanepeler İkili koltuk kanepeler Tekli koltuk kanepeler Sehpa Masa takımı Masa takımı Masa takımı Koltuk kanepeler Çalışma koltuğu Çalışma koltuğu Çalışma koltuğu</p>	DMO	33.806.974

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	Erişim noktası Erişim noktası Arçelik 454270 mb 270 la + çift kapılı buzdolabı Arçelik d154140 mb İmid büro çift kapılı buzdolabı Monitör Taşınabilir bilgisayar Masaüstü iş istasyonu Masaüstü bilgisayar Taşınabilir bilgisayar Taşınabilir bilgisayar Masaüstü iş istasyonu Masaüstü bilgisayar Monitör Kitaplık, Sehpa Sehpa Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Vestel 65u9510 led televizyon Tekli koltuk kanepesi Çalışma taburesi Yemek masası İkili koltuk kanepesi Konferans sandalyesi Projeksiyon cihazı Led monitör Çamaşır kurutma makinesi Masaüstü bilgisayar Yazıcı Alıcı verici 1kwac alıcı verici Anahtarlama cihazı Anahtarlama cihazı Anahtarlama cihazı Alıcı verici Alıcı verici Anahtarlama cihazı Çift kapılı buzdolabı Çamaşır makinesi Lazer yazıcı Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu Sunucu		
	Hassas terazî	Doğrudan Temin	2.378.702

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Otomatik pipet seti (10, 100 ve 1000 mikrolitre hacimleri ile çalışmaya uygun)
Pipetör (pipet tabancası)
Optik okuyucu
Kan örnekleri için soğutmalı santrifüj ve ekipmanları (açılır başlık, gode başlık vb.)
Yastık alezi
Yatak alezi
Nevresim takımı
Komodin
Giysi soyunma dolabı
Ayakkabılık
Su ısıtıcı
Çamaşırılık
Çöp kovası
Bulaşık makinası
Buzdolabı
Çamaşır makinası
Çamaşır kurutma makinası
Kefen
Koli
Streç film
Bant
Tül
Güneşlik
Zebra perde
Stor perde
Jaluzi
Jaluzi zıgıl takım
Ups cihazı (10 kva gücünde)
Zaman ayarlı vana
Plastik kutu
Damlama sulama borusu
Kangal damla sulama
Traktör arkası dal öğütme makinası (gölbaşı 50.yıl yerleşkesi)
Katlanır somya yatak, katlanır yatak, karyola başlık tek kişilik ek yatak
Çift kişilik baza
Çift kişilik yatak
Kombi
Park yasaktır yuvarlak levha
Plastik zincir kırmızı-beyaz 25 metre
Koni kancası
Delinatör lamba ve levha takma aparatı
Klasik hız kesici siyah
Klasik hız kesici sarı
Klasik hız kesici kapağı siyah
Klasik hız kesici kapağı sarı
Delinatörlü şerit düzenleme butonu (1000x200x455 mm)
Delinatörlü şerit düzenleme butonu (1000x220x755 mm)
Delinatör (75x8)
Delinatör (30x8)

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

		<p>(çevre ekibi) benzinli motorlu testere Cebeci öğrencievi çalışma masası Cebeci öğrencievi tül Cebeci öğrencievi güneşlik Cebeci öğrencievi korniş Dijital sayah beyaz fotokopi makinası Çocuk odası halı / mat (200x200) Duvar saati (yuvarlak) Lambader Zebra stor perde Kamera Kayıt cihazı Harddisk Switch Kamera batı Data kablosu Duvar tipi rack dolabı Güvenlik amiriliği mikro dalga fırın Güvenlik amiriliği mikro çay makinası Güvenlik amiriliği elektrikli yağlı petek ısıtıcısı Güvenlik amiriliği şerit bariyer ledi Güvenlik amiriliği bariyer sistemi Güvenlik amiriliği ikili elektrikli setüstü ocak Özel kalem ciltleme makinası Özel kalem araç invertörü Cep telefonu Bariyer sistemi Cep telefonu 9 v pil Kalem pil aa Kalem pil aaa Cr 123a pil Şarjlı aaa 650 mah Webcam logitech c310 hd Güvenlik amiriliği cat 6 data kablosu Güvenlik amiriliği 2mp ır mını bullet ip kamera Güvenlik amiriliği 8 port 10/100 megabit poe switch Özel kalem usb ayak pedalı Özel kalem usb çoklayıcı adaptör Mikrofon verici ünitesi Çaycı Elektrikli petekli yağlı radyatör ısıtıcı, Çiftli elektrikli ocak Adaptör 49" led tv 1kw ups güç kaynağı, 3kw ups güç kaynağı,</p>	
--	--	---	--

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

		Devriye okuyucu kalemi Devriye personeli tanıtım çipi Kontrol noktası tanımlama çipi Isıtıcı		
		Kabin hoparlör Duvar tipi hoparlör askı aparatı Çiftli el telsiz mikrofon seti Hoparlör kablosu (100 metre) 32 kanal hybrid kayıt cihazı Fiber media converter Fiberoptik patch kablo 8 port poe switch Ip bullet kamera Cat6 data kablosu Kamera baatı Plastik pano Kablo kanalı 25x16 mm ebat.2 m 2mp ip dome kamera Vga birleş aparat Vga görüntü kablosu Hdmı görüntü kablosu Günvenlik kilitli yatar kalkar otopark bariyeri Vga görüntü kablosu Hdmı görüntü kablosu Kablo kanalı 40x25 mm Balıksırtı kablo kanalı Bahçe armatürü Dijital zaman ayarlı piriz Headset aparatı Mikrofon taşıma hard case İmid storlu projeksiyon perd. Pc webcam Pc webcam Webcam (logitech bcc950 konferans kamerası) Usb kamera (everest 1080p) Kulaklıklılı mikrofon Kürsü mikrofonu Yaka mikrofonu Bilişim malzemesi v.b. 8 tb sabit disk 8 gb ekran kartı Toplama bilgisayar 27" monitör All in one bilgisayar Fotokopi makinası Işıkli kurum tabelası Engelli vip turnike Buton Kontrol kartı Kumanda Seperatör Tripod turnike Kart okuyucu Pleksiglas manyetik zeminli kapı isimliği Pleksiglas kat levhası Cam üzeri logo Ayaklı totem Nizamiye giriş tabela	Doğrudan Temin	3.006.034

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	<p>Kat giriş tabela Engelli hissedebilir yüzey uyarı nokta Engelli hissedebilir yüzey kılavuz Bay bayan engelli wc tabela Diş dekanlık tabela Poliklinik giriş tabela Engelli otopark levhası Ayaklı sokak tabelası Giriş tabelası Cenaze metal çelenk 18 parça perde Lav su bardağı kadeh Nescafe fincan takımı Sekizgen fincan takımı Türk kahvesi fincan takımı Su bardağı Su bardağı altlığı Kapodokya fincan takımı Çay bardağı Çay tabağı Ana yemek tabağı 30 cm Ana yemek tabağı 28 cm Tatlı çatalı Tatlı bıçağı Tatlı kasesi Çay kazanı 3 demlikli 250 bardak çay kazanı Türk kahvesi makinası Ekmek sepeti Menejer seti Makam çay bardağı takım 2 demlik çay kazanı Termos Çay kaşığı Meyve suyu bardağı 54.5*95.5 cm plicell perde 100*107 cm plicell perde 54.5*95.5 cm plicell perde 116*106.5 cm plicell perde 80*97 cm plicell perde 80*75.5 cm plicell perde 39.5*107 cm plicell perde 160*200 cm plicell perde Klima Klima Termosifon Kangal boru 32 lik te 32 lik dirsek 32 lik kör tapa 32 lik et maşon 32 lik kangal boru 20 lik deliksiz damlama borusu 33 cm damlatıcı aralıklı Fen fakültesi ve eczacılık fakültesi gölbaşı rektörlük giriş turnike Cam saklama cam vazo Kuru hava sessiz komprosör</p>	
--	---	--

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	Komproşör dış cephe koruma kabini Tırnak tozu emici vakum cihazı Dolap Masa Oturma grubu Malzeme dolabı Sandalye		
	Set üstü ocak Çamaşır makinesi Çamaşır kurutma makinesi Ütü Ütü masası Saç kurutma makinesi Tost makinesi Vestiyer Buzdolabı Çöp kovası Banyo çöp kovası Banyo dolabı Silikon yastık Tek kişilik nevresim takımı Yastık alezi Tek kişilik yastık alezi Yangın söndürme tüpü Şofben Televizyon Çalışma masası Konferans sandalye Yıldız ofis koltuğu Yıldız laboratuvar sandalyesi Yazı tahtası Klasör dolabı Kahve makinesi Çay makinesi Su arıtma cihazı Bilgisayar koltuğu Çalışma koltuğu Metal askılık Yg yatak Mikro dalga fırın Çift gözlü ocak Elektrik süpürgesi Saç kurutma makinesi Bulaşık makinesi Konveksiyonlu fırın	Pazarlık	2.542.030
	Motorlu tırpan benzinli Yaprak toplama yelpazesi Küreme küreği Çalı süperge Su hortumu Ayarlı kelepçe Bağlantı aparatı Üfleme makinesi Dal budama testeresi Çim biçme makinesi Çim kesme makası Budama el makası Uzun kol budama makası Çatal Budama testeresi Otomatik tırpan başlığı	Doğrudan Temin	2.914.015

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

		<p>Çöp konteyneri Saplı faraş Çöp kovası Çift taraflı merdiven Optik okuyucu Optik okuyucu Yağlı petek ısıtıcı Çay makinası El feneri Projeksiyon cihazı Duvara monte beyaz tahta 50x70 pano düz Mikro dalga fırın Tost makinesi Kettle Tatlı kaşığı Tatlı çatalı Peçetelik Pasta tabağı Yuvarlak tepsi Kavanoz Sunum fanusu 70 dahil abone kapasiteli telefon santarlı alımı 48 kalem malzeme Projeksiyon cihazı Dizüstü bilgisayar Tümleşik bilgisayar tip-1 Tümleşik bilgisayar tip-2 Tümleşik bilgisayar tip-3 Toplama bilgisayar Monitör Kenar anahtar (aruba jl322a 2930m 48g poe+1-slot switch) Kolçaklı sandalye Atık kutusu Masa örtüsü Klima Klima Ups akü değişimi Perde Müzik çalar Atatürk heykeli Metal küre Ahşap askılık Halı Orta sehpa Kare sehpa Yuvarlak sehpa Komodin Radyo Gramafon Gaz lambası Telefon Bakır ev eşyası Terazi Duvar saati Masa Lambader 10. Yıl yerleşkesi tabela Perde Perde</p>	
--	--	--	--

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

		_86 C Derin Dondurucunun Bakım Ve Onarımı Baskı makinası (öğrenci işleri) drum d01 black Baskı makinası (Öğrenci İşleri) DRUM UNIT D01 COLOR Güneş Teleskopu Tamir Bakım Bahçe Ekibi Traktör Bakım Onarım 06 AU 0533 Bakım Onarım 17 Adet Aracın Bakım Onarımı 06 AU 0533 Bakım Onarım Klima Oto bakım onarım Araç bakım Araç bakım Projeksiyon cihazı tamir ve bakım Lazer yazıcı tamir ve bakım Araç bakım _860 Derin Dondurucu Bakım Onarım _860 Derin Dondurucu Bakım Onarım	Doğrudan Temin	1.950.385
TOPLAM				55.619.747

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-52 Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi Kapsamında Yapılan Bakım Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2023/300671 İkn; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tescilli Anatomi Patoloji Binası Restorasyonu Uygulama İşi	Belli İstekliler	37.243.649
		Ankara Üniversitesi Tescilli Beypazarı Uygulama Oteli Çatı Tadilatı Ve Mutfak Yapım İşi	Doğrudan Temin	566.400
		Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Fen Fakültesi Tescilli A Ve B Bloklara Ait Restorasyon İşi (2018-2019-2020 Yıllarına Sari) 16 Nolu Ek Hakediş	Belli İstekliler	7.437.232
		Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Engelli Wc Ve Mescit İle Fizget Öğrenci Topluluğu Odası Düzenlemesi Yapım İşi	Doğrudan Temin	507.600
		Ankara Üniversitesi Tescilli Fen Fakültesi Telefon Santrali Ve Telefon Hatlarının Yapım İşi	Doğrudan Temin	1.530.000
		Toplam		47.284.881

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-53 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA *	AÇIKLAMA
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	2010- 2023	Makine- Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (5.930 m ²)	1.000.000	1.000.000	1.002.355	Proje kapsamında ihtiyaca binaen mal alımı ve personel almaları olmak üzere toplam 1.002.355,36 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2023K12-213154	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Lab.	2023- 2023	Bakım Onarım, Teknolojik Araştırma	6.868.000	6.868.000	8.659.481	Proje kapsamında ihtiyaca binaen mal alımı için 8.659.481,20 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2023K12- 213153	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücreyel Ürün Geliştirme	2023- 2023	Bakım Onarım, Teknolojik Araştırma	6.170.000	6.170.000	5.463.300	Proje kapsamında personel ödemeleri ve sar malzemesi giderleri için toplam 5.463.300,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2022K12- 184727	AB-IPA - Yenilikçi Kanser Teranostik GMP	2022- 2023	Büyük Onarım	2.000	2.000	1.170.166	Proje kapsamında ihtiyaca binaen mal alımı için 1.170.165,55 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

*Projelerin özel hesabına 2022 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-54 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu (Devamı)

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTER İSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	2017-2023	Etüt-Proje	10.000.000	10.000.000	35.372.563	Proje kapsamında 35.372.562,50 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, Kök Hücre Araştırma Merkezi inşaatı tamamlanmıştır.
2017K12-21024	Kolorektal Kanseri İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	2017-2023	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2.000	2.000	241.051	Proje kapsamında proje ihtiyacına mal alımları gerçekleştirilmiş olup; proje özel hesabından toplam 241.051.42 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2023K12-213155	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2023-2023	Proje Desteği	15.958.000	61.086.000	27.689.000	. Yıl içerisinde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine gelir fazlası karşılığı olarak 33.266.000,00 TL ve YÖK desteği olarak 11.862.000,00 yapılan işlemlerle birlikte toplam ödenek 61.086.000,00 TL'ye ulaşmıştır toplam 61.086.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

*Projelerin özel hesabına 2022 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.

Tablo-55 Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab. Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	Doğrudan Temin	658.828
			İhale	343.527
TOPLAM				1.002.355

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Tablo-56 Kök Hücre Araştırma Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	Mal Alımı	Belli İstekliler Arasında	7.175.880
			Pazarlık Usulü	28.196.683
TOPLAM				35.372.563

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

7. ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik arařtırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerekleřtirilmesinde başarı saęlayıcı unsurların bařında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu erevede Üniversitemiz her geen yıl deęiřen öncelik ve ihtiyalar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik alıřmalarını sürdürmektedir. Dięer taraftan üniversitenin ihtiyalarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların arttırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel arařtırma ve bařta saęlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduęu katkının artması anlamına gelecektir.

Yılı Büte Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereęince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüęü ereve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynaęın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı aısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karřılařılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluęu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta eřitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geirilmesine yardımcı olacağı düşünölmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari büte ile yatırım bütesinin iliřkilendirilmesi ve e-büte sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinlięi arttıracaktır.

Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduęu ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayıřının zaman içinde deęiřtirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet ii eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Dięer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve deęerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlıęının öncülüęünde geliřtirilecek hizmet ii eğitim programlarının Üniversitemiz aısından oldukça faydalı olacağı düşünölmektedir.

Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakölteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniř tarım arazileri ve büyük ahır, aęıl ve haraların modern tarım teknikleri ile iřletilmesi gerekmekte olup modernleřtirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduęu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlıęı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluřturmaktadır. Bu nedenle tarım - enerji gibi dięer sektörlerde de Üniversitelerin proje sunmasına imkân tanınmasının bu sektörlerde gerekli uzman personeli aęın gereklerine göre yetiřtirmekle görevli üniversitelerdeki sunulan eğitimlerde etkinlięi arttıracacağı deęerlendirilmektedir.

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Tablo-57 Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	9		477.902			68.200			188.500			282.893			248.168
Sağlık	4		518.296			126.049			171.000			263.057			89.709
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	7		476.178			391.050			40.000			85.128			85.128
TOPLAM	20		1.472.376			585.299			399.500			631.078			423.005

Tablo-58 Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık	1		2.000			0			2.000			2.000			0
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		2.000			0			2.000			2.000			0

Tablo-59 Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: HİBE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	-		-			-			-			-			-
Sağlık	1		2.316			-			2.316			2.316			-
Diğer Kamu Hizmetleri	-		-			-			-			-			-
-İktisadi															
-Sosyal	-		-			-			-			-			-
TOPLAM	1		2.316			0			2.316			2.316			0

Tablo-60 Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: İCMAL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	9		477.902			68.200			188.500			282.893			248.168
Sağlık	4		522.612			126.049			175.316			267.373			89.709
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	7		476.178			391.050			40.000			85.128			79.596
TOPLAM	20		1.476.692			585.299			403.816			635.394			417.473

2023 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablo-61 Sektör Adı: Eğitim

2023 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2022 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2020H03-150547	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	181.200	64.200	97.000	+	36.000	81.134
408	2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	6	0	6	-	5.494	0
408	2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ankara	150.494	0	51.994	+	23.494	47.285
408	2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ankara	7.309	4.000	1.000			761
408	2023H05-212633	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	2.000	0	2.000			1.519
408	2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	36.280	0	30.280	+	15.280	22.687
408	2023H03-212119	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	613	0	613	+	113	100
408	2023H03-212119	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	75.398	0	75.398	+	21.300	70.129
408		Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR		Ankara	902	0	902			894
408	2023H03-212113	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	23.700	0	23.700	+	3.700	23.659
TOPLAM						477.902	68.200	282.893		94.394	248.168

Tablo-62 Sektör Adı: Sağlık**2023 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2022 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mik.	Harcama Toplam
408	2011I00-1432	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ankara	0	216.798	3.608	84.000			5.082
408	2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	141.441	122.441	19.000			2.679
408	2023I00-206147	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	57.373		57.373	+	2.057	52.273
408		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE		Ankara	0	2.000		2.000			
408	2023I00-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	105.000		105.000			29.675
TOPLAM						0	522.612	126.049	267.373		2.057	89.709

Tablo-63 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)**2023 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2022 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	40.973	39.973	1.000			1.002
408	2023K12-213154	Yer Bilimleri Uyg. Ve Ar. Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	6.868	0	6.868			8.659
408	2023K12-213155	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2023	Ankara	0	61.086	0	61.086	+	45.128	27.689
408	2023K12-213153	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	6.170	0	6.170			5.463
408	2022K12-184727	AB-IPA - Yenilikçi Kanser Teranostik GMP	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	35.642	35.640	2			1.170
408	2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	269.801	259.801	10.000			35.372
408	2017K12-21024	Kolorektal Kanser Erken Tanı Araş. Pro.	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	55.638	55.636	2			241
TOPLAM						0	476.178	391.050	85.128		45.128	79.596
