



**2015 YILI
YATIRIM
PROGRAMI İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**



MART 2016



ANKARA ÜNİVERSİTESİ

**2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2016



Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

I.	YÖNETİCİ ÖZETİ	7
II.	GENEL DEĞERLENDİRME	9
1.	MİSYON	9
2.	VİZYON.....	9
3.	İLKELER	9
4.	AMAÇ VE HEDEFLER	10
5.	YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	12
6.	MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ.....	14
a)	İnsan Kaynakları	14
b)	Fiziksel Kaynaklar	17
b.1)	Taşınmazlar	17
b.2)	Taşınırlar.....	23
7.	2015 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	26
8.	2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	29
a)	Genel Yatırım Uygulama Durumu	29
b)	Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	34
III.	2015 YILI PROJE UYGULAMALARI	36
1.	Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu	36
2.	Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	40
3.	Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu	56
IV.	ÖNERİLER	60
V.	2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	61
VI.	2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU	65

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde toplam 65.703 öğrencisi, 3.622 akademik personeli, 66 yabancı uyruklu akademik personeli, 5.115 idari personeli, 453 sözleşmeli 183 işçi olmak üzere toplam 9.439 personeli ile 17 fakülte, 13 enstitü, 1 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 40 araştırma uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, uzaktan eğitim merkezi, Rektörlüğe bağlı 1 bölüm, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 2 araştırma uygulama hastanesi ve 1 dış hekimliği uygulama hastanesi ile 14 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, kültür, spor, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2015 yılı yatırımları için toplam 86.808.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 29.971.223,24 TL ekleme işlemi ile toplam 116.779.223,24 TL'ye çıkmıştır.

Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %84,64, bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %77,27 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo-1 2015 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)

Sektör	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Gerçekleşme	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	31.998	43.807	40.472	92,39
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1.800	2.450	1.648	67,27
Kültür	4.000	4.429	4.404	99,44
Sağlık	21.000	28.242	14.466	51,22
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar	28.010	37.852	37.852	100,00
TOPLAM	86.808	116.780	98.842	84,64
TOPLAM (BAP Hariç)	58.798	78.928	60.990	77,27

Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir.

2015 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 40.471.598,25 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Binası İnşaatına, Gıda Mühendisliği Binası İkmal İnşaatına ve Gölbaşı Kampüsü Mühendislik Binası Jeoloji Mühendisliği ve YEBİM Binası İnşaatlarına yılları sari olarak başlanmış ve devam etmektedir. Diğer taraftan kampüslerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 68 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, 381 adet süreli yayın ve 92 adet veri tabanı aboneliği, 5.361 adet kitap alımı, bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %92,39 ile yüksek oranda bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Beden Eğitimi ve spor sektöründe ise 1.648.015,99 TL harcama gerçekleşmiş olup; proje kapsamında Tandoğan Açık Spor Alanı Tribünlerinin Kapatılması ve muhtelif bakım onarım işleri yapılmış ve Gölbaşı Yerleşkesi Spor Tesisleri (Atletizm pisti) İşine yıllarına sari olarak başlanılmıştır. Beden eğitimi ve spor sektöründe gerçekleşme %67,27 oranında olmuştur.

Diğer taraftan kültür sektöründe 4.403.526,38 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda etüt proje işleri ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Restorasyon işi tamamlanmıştır. Kültür sektöründe %99,44 oranında yüksek bir gerçekleşme olduğu görülmektedir.

Sağlık Sektöründe 14.466.130,50 TL kaynak kullanımı ile 21 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, hastanelerimizin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmış ve Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesinin yapım işi tamamlanmıştır. Dış Hekimliği Fakültesi İnşaatı İşisi ise yıllara sari olarak ihale edilmiştir. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleşme oranı %51,22'dir.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 37.852.032,45 TL ödenek bütçeden özel hesaba aktarılarak 549 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere emanet hesaplara aktarılmıştır.

2015 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof.Dr.Erkan İBİŞ
Rektör

II. GENEL DEĞERLENDİRME

1. MİSYON

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

- Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi,
- Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözetten, disiplinler arası araştırmalar yapmayı,
- Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözetten yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir.

2. VİZYON

Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır.

3. İLKELER

- Akademik özgürlüğe öncelik verme
- Etik değerlere bağlılık
- Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Tarihine sahip çıkma
- Kentle bütünleşme
- Saydamlık
- Katılımcılık
- Çalışana ve öğrenciyeye güven duyma
- Öğrenci merkezlilik
- Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı
- Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı

4. AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2014-2018 dönemi stratejik planında 6 adet stratejik amaç altında 31 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir.

Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler


Amaç-1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.1. Üniversitenin Araştırmaya Yönelik Öz Kaynaklarının Arttırılması, Etkin Yönetilmesi ve Dış Kaynaklardan Azami Düzeyde Yararlanılarak Daha Çok Araştırmanın Destek Bulmasını Sağlamak
Hedef 1.2. Araştırmaya İlişkin Kurumsal Yapıyı, Araştırma Sayısını ve Niteliğini Artıracak Şekilde Geliştirmek
Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak
Hedef 1.4. Doktora Öğrenci Sayısını ve Eğitimin Niteliğini Arttırmak
Hedef 1.5. Araştırmaların Öncelikli Alanlara ve Disiplinler Arası Çalışmalara Yönlenmesini Sağlamak
Hedef 1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek ve etkin kullanmak
Amaç-2. Eğitimin Niteliğini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek
Hedef 2.1. Nitelikli Öğrencileri Üniversitemize Çekmek
Hedef 2.2. Gerekşinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliği Geliştirmek
Hedef 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek
Hedef 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak
Hedef 2.5. Öğrencilerin Akademik ve Bireysel Gelişimini Desteklemek
Hedef 2.6. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Değişim Programlarını Destekleyerek Eğitimde Birbirinden Öğrenme Sürecini Hızlandırmak
Hedef 2.7. Örgün Öğretimi Uzaktan Öğretim İle Desteklemek
Amaç-3. Toplumun Farklı Kesimleriyle İşbirliği İçinde Toplumsal Sorunlara Çözüm Üretmek
Hedef 3.1. Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirerek Ülke Kalkınmasına Hizmet Etmek ve Ankara İle Çevresinin Ekonomik Gelişimini Desteklemek
Hedef 3.2. Farklı İletişim Kanalları Kullanılarak Üniversitenin Ürettiği Bilgiyi Topluma Yayımak
Hedef 3.3. Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kültürel/Sanatsal ve Sportif Etkinliklerle Ankara'nın Sosyal Yaşamına Katkıda Bulunmak
Hedef 3.4. Üniversitenin Eğitim ve Mal/Hizmet Üretme Potansiyelini Ekonominin ve Toplumun Yararına Sunmak
Amaç-4. Ulusal ve Uluslararası Yeterliliğini Sağlamış Kurumsal Yapılanması İle Hasta Memnuniyetini Öne Çıkaran ve Üçüncü Basamak Üst Düzey Merkezler Kurarak Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak
Hedef 4.1. Sağlık Hizmetleri Sunumunda Değişen Talep Koşulları Çerçevesinde Ulusal ve Uluslar Arası Yeterliklere Sahip, Hasta Memnuniyetini Ön Plana Alan Sağlık Kurumu Kimliğini Sürdürmek
Hedef 4.2. Demografik Yapıdaki Değişimle Birlikte, Teknolojideki Değişimleri De Kavrayacak Şekilde Gelişmelere Uygun Yeni Üst Düzey Merkezler Kurmak ve Mevcut Merkezleri İyileştirmek
Hedef 4.3. Kurumsal Yapılanmayı Güçlendirip Çeşitli Ülkelerde Yapılacak İşbirlikleri İle Sağlık Turizmini Geliştirmek
Hedef 4.4. Dış Hekimliği Fakültesini Hastanesi ile birlikte tam teşekküllü bir yapıya ulaştırmak
Hedef 4.5. Hastanelerin Hizmet Sunumunda Yönetimsel Etkinliği Sağlamaya Yönelik Olarak Kurumsal Altyapıyı Güçlendirmek

Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler (Devamı)**Amaç -5. Üniversitenin Bütün Yerleşkelerinde Öğrenci, Çalışan ve Diğer Paydaşların Gereksinimlerini Karşılama ve Yaşam Kalitelerini Yükseltmek****Hedef 5.1.** Yerleşkelerin Fiziksel, Mekansal, Teknolojik Altyapı ve Güvenlik Eksikliklerini Gidermek**Hedef 5.2.** Yerleşkelerde Öğrencilerin Temel Gereksinimlerinin (Barınma, Beslenme, Sağlık, Ulaşım vb.) Giderilmesine Katkıda Bulunmak**Hedef 5.3.** Yerleşkelerdeki Sosyal Yaşam Olanaklarını Geliştirmek**Hedef 5.4.** Bütün Yerleşkelerde Öğrenci, Akademisyen ve Diğer Yararlanıcıların Akademik Yayınlarına Erişimini Sağlamak**Hedef 5.5.** Çevreye Duyarlı Yerleşkeler Oluşturmak**Amaç-6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Yaşama Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek****Hedef 6.1.** Bilgi Sistemlerini Öğrenci/Çalışana Sunulan Bütün Elektronik Hizmetleri İçerecek Şekilde Geliştirmek**Hedef 6.2.** Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkararak Bir Kurumsal Altyapıya Sahip Olmak**Hedef 6.3.** Fakültelerde Ayrı Ayrı Oluşmuş Kimliklere Çatı Oluşturan ve Üniversite Aidiyetini Güçlendiren Ankara Üniversitesi Kurumsal Kimliğini Geliştirmek ve Mezunların Aidiyet Hissini Geliştirmek**Hedef 6.4.** Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini Artırmak

5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ankara Üniversitesi'nin 2015 Yılı Yatırım Programında toplam 19 adet proje için 92.219.000,00 TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde gerçekleştirilen eklemeye işlemleri ile yılsonu itibariyle 122.190.223,24 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 950.000,00 TL'si öz gelir, 18.852.032,45 TL'si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 5.000.000,00 TL'si döner sermaye, 96.977.190,79 TL'si hazine yardımı ve 411.000,00 TL'si hibe olarak finanse edilmiştir.

Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılımı

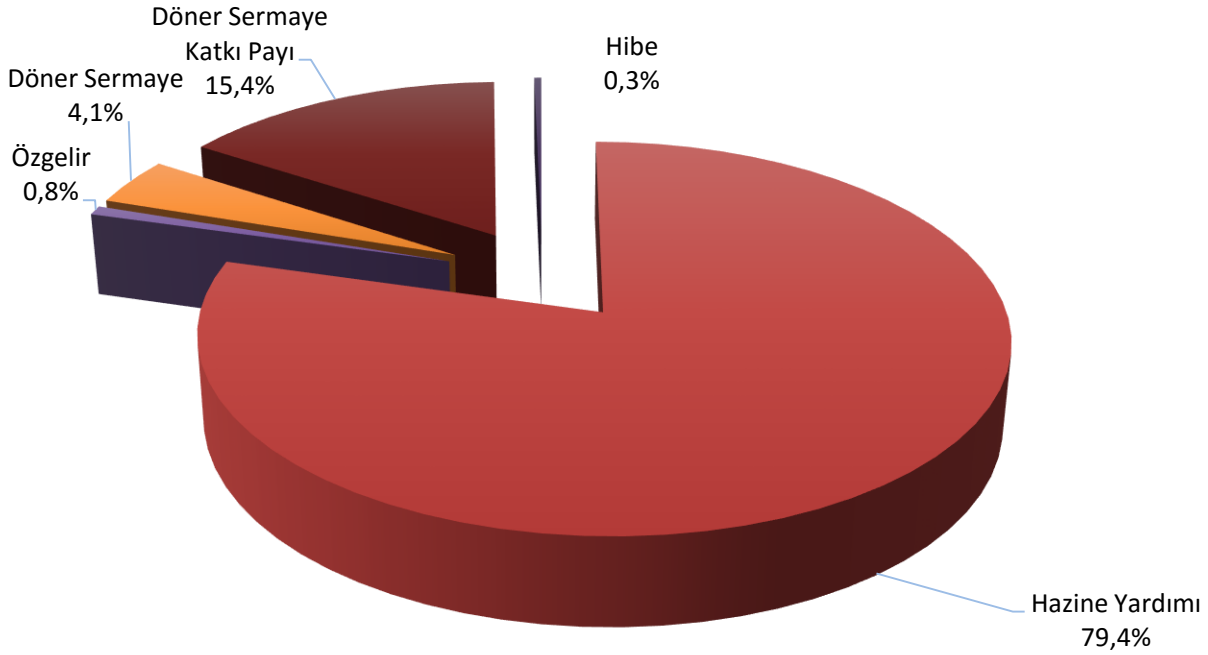

2015 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 5 adet proje için 32.409.000,00 TL kaynak ayrılmış olup 950.000,00 TL'sinin öz gelirlerle, 31.048.000,00 TL'sinin hazine yardımıyla ve 411.000,00 TL'sinin hibe yolu ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 1.800.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kültür sektörü kapsamında ise biri etüt proje olmak üzere 2 adet projeye yer verilmiştir ve projeler için toplam 4.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sağlık Sektöründe ise 5 adet proje için toplam 26.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; 5.000.000,00 TL'sinin döner sermaye kaynakları ve 21.000.000,00 TL'sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 6 adet proje için 28.010.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; 9.010.000,00 TL'sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 19.000.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-3 2015 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)

PROJE NO	PROJE ADI	2015 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI				
			ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE	DÖNER SERMAYE KATKI PAYI	HAZİNE YARDIMI	HİBE/DIŞ ÖZKAYNAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM		92.219	950	5.000	9.010	76.848	411
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR		28.010	0	0	9.010	19.000	0
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab.	500				500	
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	500				500	
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	10.000				10.000	
2012K120430	Parçacık Hızlandırma Merkezi	6.000				6.000	
2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	2.000				2.000	
2015K120160	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	9.010			9.010		
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM		32.409	950	0	0	31.048	411
2015H030390	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100				100	
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	14.998				14.998	
2015H030400	Muhtelif İşler	5.061	950			3.700	411
2013H030660	Büyük Onarım	9.000				9.000	
2015H030410	Yayın Alımı	3.250				3.250	
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		1.800	0	0	0	1.800	0
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.800				1.800	
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR		4.000	0	0	0	4.000	0
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	500				500	
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	3.500				3.500	
SAĞLIK		26.000	0	5.000	0	21.000	0
2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnşaatı	100		100			
2011I000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	100				100	
2014I000070	Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi	106		106			
2012I000160	Muhtelif İşler	10.294		4794		5.500	
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	15.400				15.400	

6. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

a) İnsan Kaynakları


Ankara Üniversitesinde 2015 yılsonu itibarıyla 3.622 akademik (3.619 kadrolu, 3 profesör kadrosu şahsa bağlı kadro), 66 yabancı uyruklu akademik, 169 sözleşmeli öğretici, 695 Üniversitemize 2547/35 madde ile görevlendirilen akademik personel, 5.115 idari, 453 sözleşmeli idari ve 183 (159'u sürekli 24'ü geçici) işçi olmak üzere toplam 10.302 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %44'ünü akademik, %56'sını idari personel ve işçiler oluşturmaktadır.

Tablo-4 2013-2015 Yılları Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2013 Yılı	2014 Yılı	2015 Yılı	2015 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Akademik Personel (Kadrolu-Şahsa Bağlı Kadro)	3.578	3.627	3.622	-0,14
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	28	50	66	32,00
Sözleşmeli Öğretici Personel	184	190	169	-11,05
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2547/35)	542	648	694	7,10
İdari Personel (Kadrolu)	5.360	5.230	5.115	-2,20
Sözleşmeli İdari Personel	66	353	453	28,33
İşçi	196	196	183	-6,63
Toplam	9.954	10.294	10.302	0,08

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-2 2015 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı



2015 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %0,2 oranında azalma göstermiştir. En büyük azalma %4,4 ile yardımcı doçent kadrosunda görülmekte olup, diğer akademik personel sayıları karşılaştırıldığında %12,3 ile uzman kadrosunda, %4'lük oranlarla öğretim görevlisi ve okutman sayılarında artış yaşanmıştır.


2015 yılsonu 1.880 öğretim üyelerinin, %44,1'i kadın, %55,9'u erkek, toplam akademik personelin ise %51,6'sı kadın, %48,4'ü erkek akademik personel oluşturmaktadır.

Tablo-5 2012-2014 Yılları Akademik Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2013 Yılı	2014 Yılı	2015 Yılı	2015 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Profesör	1.208	1.250	1.246	-0,32
Doçent	333	309	305	-1,29
Yardımcı Doçent	329	341	326	-4,40
Öğretim Görevlisi	142	151	157	3,97
Okutman	257	253	263	3,95
Araştırma Görevlisi	1.143	1.161	1.140	-1,81
Uzman	166	162	182	12,35
Toplam	3.578	3.627	3.619	-0,22

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-3 2015 Yılı Akademik Personel Kadro Dağılımı




2015 yılı itibarıyla idari personel için tahsis edilen 5.115 adet dolu kadro sayısının %53,1'i kadın, %46,9'u erkek personel oluşturmaktadır. Dolu kadro sayısı bir önceki yıla oranla %2,2 oranında azalma göstermiştir.

Tablo-6 2013-2015 Yılları İdari Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2013 Yılı	2014 Yılı	2015 Yılı	2015 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Genel İdari	2.296	2.235	2.201	-1,52
Teknik	501	523	510	-2,49
Sağlık	1.908	1.830	1.772	-3,17
Eğitim-Öğretim	3	1	1	0,00
Avukatlık	7	7	7	0,00
Din	3	3	3	0,00
Yardımcı	642	631	621	-1,58
Toplam	5.360	5.230	5.115	-2,20

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-4 2015 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı



b) Fiziksel Kaynaklar

b.1) Taşınmazlar

Ankara Üniversitesi Ankara şehir merkezinde 7, ilçelerde 7 olmak üzere toplam 14 yerleşkeye yayılmış; 17 fakülte, 13 enstitü, 1 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 40 araştırma ve uygulama merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 1 bölüm ile eğitim-öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.


Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği Rektörlük binasında, Kütüphane ve Dokümantasyon, Öğrenci İşleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tandoğan Yerleşkesinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ise Gölbaşı Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tablo-7 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m ²)	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)
Tandoğan	260.749	188.152
Cebeci	79.248	75.558
Sıhhiye	123.666	120.179
Dikimevi	125.322	109.500
Dışkapı	540.906	259.990
Keçiören	24.480	22.571
Gölbaşı	1.098.626	103.000
Etimesgut (Bağlıca)	2.405.083	0
Ahlatlıbel	122.908	13.100
Balgat	4.474	3.008
Çankaya	48.247	3.475
Beypazarı	515.093	13.430
Kalecik	207.344	2.889
Haymana-Ayaş	4.973.710	3.900
Kazan	2.397.982	5.000
Elmadağ	17.260	7.222
Nallıhan	2.680	1.902
Antalya	86.000	6.200
Aydın-Didim	36.977	554
Bursa	9.912	0
Kastamonu	5.436	3.750
Eskişehir	108.952	0
İzmir	1.467	1.467
Sivas Gürün	11.001	0
Toplam	13.207.523	944.847

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Grafik-5 Yerleşkeler Bazında Toplam Arsa/Arazi Alanı (m2)

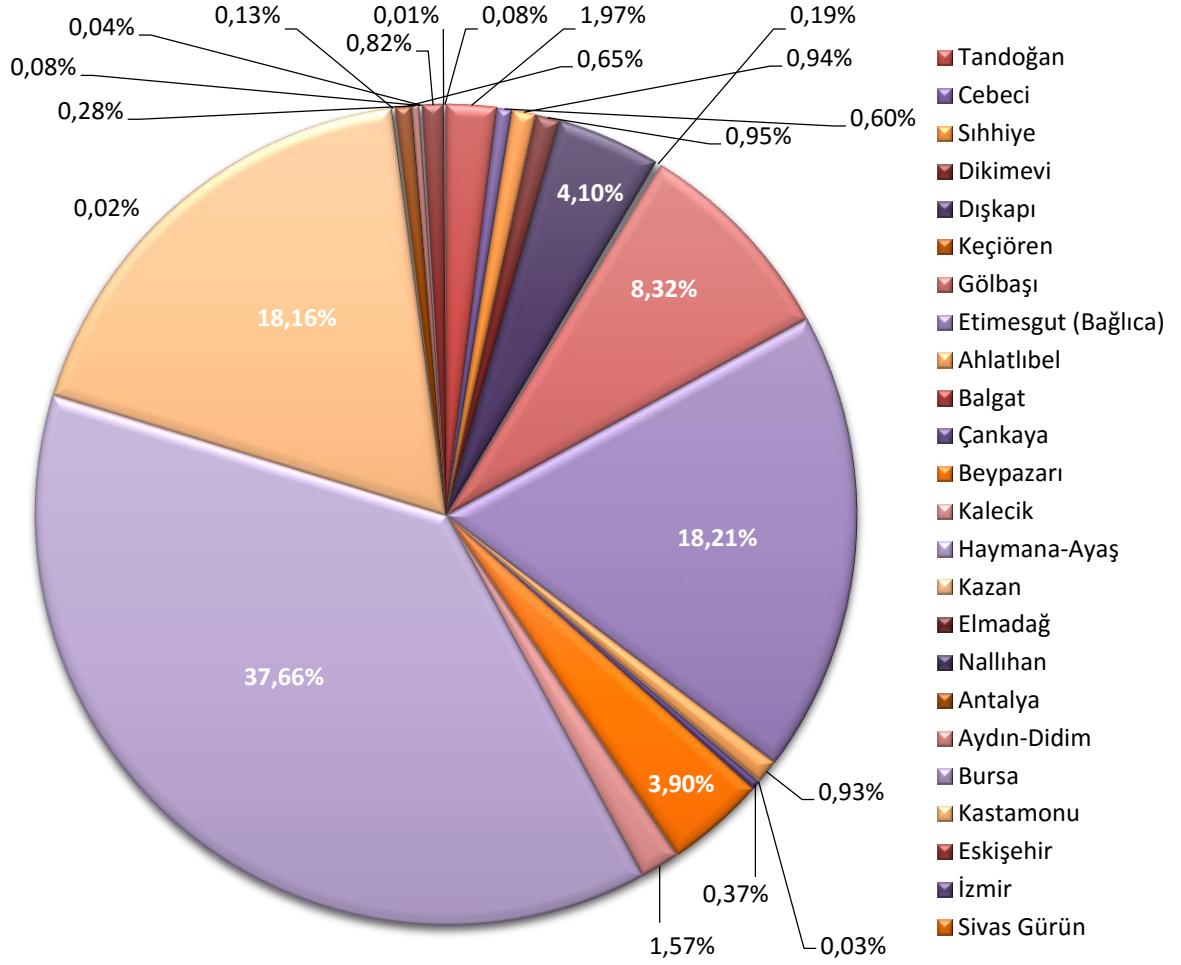

2015 yılında Beypazarı Yerleşkesinde hibe olarak yapılan ve devir alınan 3 yeni bina ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devir alınan binanın alanları ile toplam kapalı hizmet alanı 2014 yılsonu kapalı alana kıyasla %0,86 oranında artmıştır.

Tablo-8 Taşınmazlara 2015 Yılında Yapılan İlaveler

2014 Yıl Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m ²)		936.797
Beypazarı Yerleşkesi	Hibe Olarak Yapılan ve Devir Alınan 3 Yeni Bina	800
	Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Devir Alınan Bina	2.800
2015 Yıl Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m ²)		944.847
Değişim Oranı		0,86%

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2015 yılı itibarıyla teorik eğitimin sunulduğu amfi ve sınıf sayısı toplamı 966, laboratuvar ve atölyelerin toplamı ise 597'dir. Bu çerçevede eğitim ve uygulama alanı sayısı toplamda 1.563'e ulaşmıştır.

Tablo-9 Eğitim ve Uygulama Alanları

KAPASİTE (Kişi)	AMFİ	SINIF	ATÖLYE	LABORATVUARLAR	TOPLAM
0-50	10	662	47	480	1.199
51-75	0	117	1	34	152
76-100	3	63	2	22	90
101-150	20	45	0	9	74
151-250	21	8	0	1	30
251-Üzeri	14	3	0	1	18
TOPLAM	68	898	50	547	1.563

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 7 adet öğrenci evi, ayrıca Gölbaşı Yerleşkesi Milli Piyango Öğrenci Evi ek binasında bulunan 47 kişi kapasiteli misafirhane ile öğrencilerimize barınma hizmeti sunulmaktadır.

Tablo-10 Öğrenci Evleri Kapasiteleri

ÖĞRENCİ EVİ	ALAN (m ²)	KAPASİTE (Kişi)	2015 Yılında Yararlanan Kişi Sayısı
Cumhuriyet Öğrenci Evi	5.972	172	170
Fahriye Özaka Öğrenci Evi	1.680	100	98
Keçiören Öğrenci Evi	2.676	100	133
Milli Piyango Öğrenci Evi	10.700	336	484
Vehbi Koç Öğrenci Evi	4.698	200	215
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	12.874	244	492
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	8.058	178	510
Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası	1.055	47	39
TOPLAM	47.713	1.377	2.141

Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Cebeci Yerleşkesinde yer alan Milli Piyango Öğrenci Evinde bulunan misafirhane 458 m² kapalı alana sahip olup, 36 kişilik kapasite ile hizmet vermektedir. Ayrıca Gümüşdere Yerleşkesinde yardımcı hizmetli personelin yararlandığı lojmanlar bulunmaktadır.

Tablo-11 Misafirhane ve Lojmanlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Misafirhaneler	458	1	36
Lojmanlar	1.780	20	-
TOPLAM	2.238	21	36

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere toplam 49 adet yemekhane, bunun yanı sıra 63 adet kantin/kafeterya ile 6 adet restoran bulunmaktadır.

Tablo-12 Yemekhane, Kantin/Kafeteryalar ve Restoranlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	15.510	49	10.623
Kantin / Kafeteryalar	8.485	63	7.025
Restoran	1.986	6	800
TOPLAM	25.981	118	18.448

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-13 Toplantı ve Konferans Salonları

KAPASİTE (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	TOPLAM
0-50	94	10	104
51-75	20	6	26
76-100	2	7	9
101-150	3	6	9
151-250	1	6	7
251-Üzeri	1	11	12
TOPLAM	121	46	167

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesinde 2, Yabancı Diller Yüksekokulunda da 1 adet olmak üzere toplam 3 sinema salonu, Ziraat Fakültesinde 1 adet tiyatro salonu, Devlet Konservatuvarında da 1 adet konser salonu bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi amblemi bulunan ürünlerin satış yeri Tandoğan Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır.

Tablo-14 Diğer Sosyal Alanlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Sinema Salonu	413	3	390
Tiyatro Salonu	351	1	150
Konser Salonu	385	1	200
Ürün Satış Yeri	13	1	-
TOPLAM	1.162	6	740

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine mesleki alanlarına göre araştırma ve uygulama yapma imkanı sunmaya devam etmektedir.

Tablo-15 Araştırma Uygulama Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Araştırma Uygulama Çiftliği	7.414.971	2
Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri	94.000	2
Kütüphane	15.934	29

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-16 Spor Alanları

Birim Adı	Kapalı Spor Tesisleri			Açık Spor Tesisleri		
	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)
Tıp Fakültesi				Tenis Kortu	1	648
				Basketbol-Voleybol	1	480
Eczacılık Fakültesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	130			
Veteriner Fakültesi				Basketbol	1	362
Ziraat Fakültesi	Basketbol	1	880	Tenis Kortu ²	2	1.625
				Futbol (Toprak+Halı)	2	2.350
Siyasal Bilgiler Fakültesi	Basketbol-Voleybol	1	560			
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi				Basketbol-Voleybol	1	1.000
Spor Bilimleri Fakültesi	Genel Amaçlı Salon	1	2.200			
	Güreş ve Uzakdoğu Sporları	1	206			
	Ritm Eğitimi	1	100			
	Jimnastik	1	200			
GAMA Meslek Yüksekokulu	Basketbol-Voleybol	1	495	Basketbol	1	356
Kalecik Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	720
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	Masa Tenisi	1	65	Basketbol	1	230
				Voleybol	1	230
Beypazarı Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	375
				Voleybol	1	300
İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	180			
Gümüşdere Yerleşkesi (Devlet Konservatuvarı, Başkent Meslek Yüksekokulu, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)				Basketbol	1	50
Tandoğan Yerleşkesi	Tenis Kortu	1	648	Tenis Kortu	5	2.486
	Fitness Egzersiz Salonu	2	250	Basketbol	2	1.607
	Yüzme Havuzu	1	3.510	Voleybol	1	275
	Spor Salonu	1	1.082	Plaj Voleybol-Hentbol	1	594
				Futbol	1	1.485
Cebeci Yerleşkesi	Spor Eğitim Merkezi	1	2.045			
Gölbaşı Su Sporları Eğitim Merkezi		1	6.000			

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-17 Hastane Alanları

Alan Adı	İbn-i Sina Uyg. ve Arş. Hastanesi	Cebeci Uyg. ve Arş. Hastanesi	Diş Hekimliği Fak. ve Diş Hekimliği Uyg. Hastanesi	TOPLAM
Acil Servis	1	1	2	4
Yoğun Bakım	9	8	0	17
Ameliyathane	1	22	2	25
Poliklinik	24	126	0	150
Klinik	18	18	15	51
Laboratuvar	6	44	16	66
Eczane	1	1	0	2
Radyoloji Alanı	1	58	6	65
Nükleer Tıp Alanı	1	0	0	1
Sterilizasyon Alanı	1	7	14	22
Mutfak	1	53	2	56
Çamaşırhane	1	8	1	10
Teknik Servis	3	3	5	11
Adli Tıp	0	1	0	1
Kompresör Odası ve Kazan Dairesi	0	10	3	13
Diyaliz	1	0	0	1
Diş Kliniği	1	0	0	1
Tıbbi Malzeme Deposu	1	0	0	1
TOPLAM	71	360	66	497

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-18 Hayvan Sağlığı Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Acil Servis	1	200
Ameliyathane	4	250
Klinik	5	1.500
Laboratuvar	58	9.000
Radyoloji Alanı	1	250
TOPLAM	69	11.200

Kaynak: 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-19 Ambar ve Arşiv Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Ambar Alanı	143	22.207
Arşiv Alanları	120	7.632
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	234	14.776
TOPLAM	497	44.615

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

b.2) Taşınır

Aşağıda verilen tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. 2015 yılsonu itibarıyla, I. düzeyde 253 tesis, makine ve cihazlar grubunda toplam 68.428, 254 taşıtlar grubunda toplam 561, 255 demirbaşlar grubunda da 39.949 adet taşınır kayıtlıdır.

Tablo-20 2015 Yılsonu İtibariyle Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayısı

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınır	Ölçü Birimi	2015 Yılı
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	68.428
254	Taşıtlar Grubu	Adet	561
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	39.949

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tablo-21 Taşıtlar Grubu

Taşıtların Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Toplam
Otomobiller (Binek)	21	38	59
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs)	27	0	27
Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon)	17	0	17
Hafif Ticari Araç	1	3	4
Arazi Taşıtları	2	0	2
Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler)	12	0	12
Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork)	443	0	443
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)	16	0	16
Botlar	6	0	6
Yelkenliler	7	0	7
Kanolar ve Kayıklar	9	0	9
Toplam	561	41	602

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üniversitemizin ağ altyapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahiptir. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan tüm toplanma noktalarına fiber optik kablo çekilmiş ve tüm kullanıcılara aktif ağ ucu sağlanmıştır. Üniversitemiz 1,2 Gbps hızında metro ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahiptir.

Tablo-22 Teknolojik Kaynaklar (2013-2015)

	2013 Yılı	2014 Yılı	2015 Yılı
Sunucular	131	101	259
Masaüstü Bilgisayar	12.895	12.879	13.190
Taşınabilir Bilgisayar	3.913	3.939	4.334
Tablet Bilgisayar	1.314	1.419	1.540
Cep Bilgisayar	18	22	73

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-23 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2013-2015)

	2013 Yılı	2014 Yılı	2015 Yılı
Projeksiyon	1.655	1.593	1.857
Slayt Makinesi	159	99	45
Tepegöz	330	281	388
Episkop	1	0	0
Barkot Okuyucu	437	135	143
Yazıcı	5.076	4.702	5.411
Baskı Makinesi	25	37	20
Fotokopi Makinesi	310	270	278
Faks	192	172	169
Fotoğraf Makinesi	289	315	364
Kameralar	923	1.057	2.045
Televizyonlar	2.827	2.641	2.664
Tarayıcılar	434	471	645
Müzik Setleri	79	165	461
Mikroskoplar	2.519	2.404	2.640
DVD'ler	578	395	143
Akıllı Tahta	11	183	1.223

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Birim Faaliyet Raporları

2015 yılında birimlerden gelen kitap talepleri doğrudan temin ve ihale yöntemiyle alınmış olup, 3.319 Türkçe, 2.042 yabancı dilde olmak üzere toplam 5.361 adet kitap alınmıştır. Ayrıca e-kitap olarak 162.140 adet kitap sağlanmıştır. Toplam sağlanan kaynak sayısı 167.501'dir. Bunların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-24 Kütüphane Kaynakları

	2015 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	5.361	162.140	167.501	807.996	250.000	1.057.996
Dergi Aboneliği Sayısı	0	0	0	10.785	52.000	62.785
Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı*	233	200	381	233	200	381
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	0	10	10	0	92	92
Yazma Eser	0	0	0	17.000	0	17.000
Toplam	5.594	162.350	167.892	836.014	302.292	1.138.254

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

* 52 adet dergi basılı + elektronik dergi olarak abone olunmuştur.

Tablo-25 Alınan Kitapların Birimler İtibari İle Dağılımı

Birimler	Türkçe	Yabancı Dil	Toplam
Adalet Meslek Yüksekokulu	293	-	293
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)	2	12	14
Başkent Meslek Yüksekokulu	24	67	91
Beypazarı Meslek Yüksekokulu	99	3	102
Biyoteknoloji Enstitüsü	-	6	6
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi	371	550	921
Diş Hekimliği Fakültesi	-	12	12
Eczacılık Fakültesi	69	60	129
Eğitim Bilimleri Fakültesi	192	65	257
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	135	-	135
Fen Fakültesi	1	119	120
Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)	40	-	40
Haymana Meslek Yüksekokulu	34	1	35
Hukuk Fakültesi	109	176	285
İlahiyat Fakültesi	957	156	1.113
İletişim Fakültesi	35	73	108
Kalecik Meslek Yüksekokulu	20	1	21
Mühendislik Fakültesi	3	94	97
Sağlık Bilimleri Fakültesi	385	171	556
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	27	5	32
Siyasal Bilgiler Fakültesi	-	311	311
Spor Bilimleri Fakültesi	2	10	12
Tıp Fakültesi	147	20	167
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü	150	-	150
Veteriner Fakültesi	47	33	80
Ziraat Fakültesi	177	97	274
Elektronik Kitap	-	162.140	162.140
Toplam	3.319	164.182	167.501

Kaynak: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

7. 2015 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Yatırımları

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Sağlık	2012I000160	Muhtelif İşler	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında büyük onarımın yapılması ve hastanelerin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında 21 adet binanın büyük onarım işi gerçekleştirilmiştir ve muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları ödenekler sınırında karşılanmıştır.
Sağlık	2014I000070	Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi	Üniversite hastanelerinde maliyet etkin bir mali yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması planlanmıştır.	Proje kapsamında döner sermaye kaynaklarının yetersizliği sebebi ile herhangi bir gerçekleştirme olmamıştır.
Sağlık	2011I000130	İbn-İ Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	Yapım İşine İlişkin Etüt Projelerin tamamlanarak ihale edilmesi planlanmıştır.	Yapım işi ihale edilememiştir.
Sağlık	2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnşaatı (4.218 M2)	Gastroenteroloji Binası İnşaatının Tamamlanması ve makine-teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Yapım işinin %100'ü gerçekleştirilmiştir ve muhtelif makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Ancak Maliye Bakanlığı yatırımları hızlandırma yedek ödeneğinden aktarılan 3.000.000,00 TL ödenek ihale sürecinin yeterli olmaması sebebi ile harcanamamıştır.
Sağlık	2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatına başlanması planlanmıştır.	Yapılan yapım işinin ihalesi sonuçlanmış yılsonuna doğru işe başlanılmıştır.
Eğitim	2015H030390	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Yeni yapılacak olan Bağlıca Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Bina İnşaatı Projesi ile ihtiyaç duyulan diğer muhtelif etüt projelerin yapılması planlanmıştır.	8 Adet Etüt Proje Hizmeti Alınmıştır. Bağlıca Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Bina İnşaatı Projesi İş 2015-2016 yıllarına sari olarak ihale edilmiştir.
Eğitim	1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	Cebeci Kampüsü Sosyal Bilimler Derslikleri, Gölbaşı Mühendislik Fakültesi, Deney Hayvanları Laboratuvarı ve Didim Uluslar Arası Gençlik Merkezi olmak üzere 4 adet yeni bina yapımına başlanması planlanmıştır.	2014 yılında Gölbaşı Mühendislik Binası Jeoloji Mühendisliği, YEBİM Binası ve Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Bina İnşaatına yıllara sari olarak başlanılmış ve devam etmektedir. Gıda Mühendisliği Binası İkmal İnşaatı ise 2015-2016 yıllarına sari olarak ihale edilmiştir.
Eğitim	2013H030660	Büyük Onarım Projesi	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında büyük onarımlarının yapılması planlanmıştır.	Proje kapsamında 68 adet binanın büyük bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2015H030400	Muhtelif İşler	Üniversitemiz birimlerinin makine-teçhizat, bilgisayar, yazılım, altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje kapsamında birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, kablosuz ağ bağlantı cihazları ile muhtelif demirbaşların ve makine teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2015H030410	Yayın Alımı	Üniversitemiz kütüphane basılı, elektronik, süreli yayını ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje kapsamında mevcut ödenekleri çerçevesinde süreli yayını aboneliği, veri tabanı aboneliği ve kitap alımları gerçekleştirilmiştir.

Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Kültür	2014H040020	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	Kültür varlığı olarak tescilli binalarımızın ihtiyaç duyulan restorasyon, restitüsyon projelerinin yapılması planlanmıştır.	Cebeci Kampüsü ve Dikimevi Kampüsünde yer alan tescilli binalarımızın etüt proje hizmeti alınmıştır.
Kültür	2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında restorasyonlarının yapılması planlanmıştır.	2014 yılında başlanılan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Restorasyon İşi tamamlanmıştır.
Beden Eğitimi ve Spor	2014H050120	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	Gölbaşı Kampüsünde Spor Bilimleri Fakültesi ihtiyacına Sentetik Atletizm Pisti ve Futbol Sahası yapılması ile spor alanlarının büyük bakım onarımlarının yapılması planlanmıştır.	Tandoğan Kampüsü Açık Spor Alanı Tribünlerinin Kapatılması İşi yapılmış, Gölbaşı Yerleşkesi Spor Tesisleri İşi ihale edilmiş ve yapımına başlanılmış ve muhtelif bakım onarımlar tamamlanmıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı Ve İleri Arş. Lab.	DSÖ kriterlerinde BSL-3 ve ABSL-3 kurulumunun tamamlanması planlanmıştır.	DSÖ normlarında BSL-2, BSL-3 ve ABSL-3 kurulumu gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Merkez laboratuvarının çalışmalarına katkı sağlayacak gerekli alımların yapılması, insan gücü ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje kapsamında ihtiyaç olan hizmet ve mal alımları gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan personel ücreti ödemeleri ile yurt içi ve yurtdışı kongre görevlendirmeleri de proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje alımlarının ihale ve kabul sürecinde alınması planlanan cihazların hali hazırda üretilip satılan bir sistem olmayıp özel tasarım gerektiren cihazlar olması dolayısıyla çeşitli problemler yaşanmaktadır. Diğer taraftan proje kapsamında çalışmaları yürüme üzere personel çalıştırılmaktadır. Proje 3 yıldır ek bütçe talep edilerek devam etmektedir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi Ve Test Laboratuvarı	Hızlandırıcı ve soğutma sistemlerinin teslim alınarak kurulumunun tamamlanması, donanım adaptasyon planlamasının ve alt sistemlerin yapım işinin tamamlanması, elektronik kaynağının tamamlanarak enjektör kurulumu ve testlerinin yapılması, küçük ölçekli elektronik ve mekanik atölyelerin hayata geçirilmesi, deney istasyonlarının planlamasının tamamlanması, tasarımı yapılan 4 tesisin teknik tasarımlarının sürdürülmesi planlanmıştır.	Donanım adaptasyonuna yönelik imalat işi tamamlanmıştır. Helyum ve su soğutma sistemleri teslim alınmış ve kurulumları tamamlanmış ve testleri devam etmektedir. Hızlandırıcı sistemlerinden normal iletken hızlandırıcılar teslim alınmış, elektronik kaynağı tamamlanarak testleri yapılmış, küçük ölçekli elektronik ve mekanik atölyeler kurulmuş ve proje kapsamında tasarımı sürdürülen 4 hızlandırıcı tesisinin teknik tasarımları tamamlanmıştır.

Tablo-26 Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	Parçacık hızlandırma sisteminin kurulması ile kısa ömürlü radyoaktif maddelerin üretilmesi planlanmıştır.	Projenin ancak 2016 yılında tamamlanacak olmasının başlıca nedeni; yapılacak yurtdışı alımın spesifik bir konuda olmasına takriben 500 sayfadan oluşan teknik şartnamelerin hazırlanması sonrasında; ihaleye çıkış sürecinde; döviz kurunun öngörülemez şekilde artması/proje bütçesini olumsuz yönde etkilemesi; dolayısıyla teknik şartnamelerin defalarca tekrar revize edilmesi gereksiniminin doğması ve proje bütçesine içinde kalınabilmesi adına revize/daraltma işlemlerini gerçekleştirilerek birkaç kez ihaleye çıkmak zorunda kalınmasıdır. Ayrıca Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafınca yapılan hasılat yolu ile kiralama ihalesi işine dair yapılan çalışmaların elde olmayan nedenlerden dolayı zaman almasıdır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi	LA-ICP-MS alımının yapılması ve YEBİM Binası İnşaatının tamamlanması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında ödenek yetersizliği sebebi ile planlanan makine-teçhizat alımları gerçekleştirilememiştir. Diğer taraftan YEBİM inşaatı sözleşme süresinde bitmediği için süre uzatımı verilerek hakediş ödemelerinin yapılabilmesi için ödeneği taahhüt artığı karşılığı olarak 2016 yılına devretmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2014K120190	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Tahsis edilen ödenek ile Üniversitemizde yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.	2015 yılında Üniversitemizde 549 adet Bilimsel Araştırma Projesi için özel hesaptan harcama yapılmıştır.

8. 2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. Özellikle 2011 ve 2012 yıllarında Çocuk Hastanesi Projesinin fiili olarak başlaması sebebi ile önemli bir artış gerçekleşmiştir. 2012 yılında inşaatı tamamlanan Çocuk Hastanesi Projesinin 2013 yılında donanım ihtiyacı giderilmiş ve proje tamamlanmıştır ve bu doğrultuda 2014 yılında başlangıç ödeneginde önceki senelere göre %35,5 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Projesi Yatırım Programına dahil olmuştur. 2015 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 5 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için 21.000.000,00 TL hazine yardımı ve 5.000.000,00 TL döner sermaye karşılığı olmak üzere toplam 26.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 3.666.706,56 TL taahhüt artığı karşılığı, 575.000,00 TL likit karşılığı ödenek kayıtları ve 3.000.000,00 TL tutarında Maliye Bakanlığı yatırım hızlandırma ödeneginden aktarma ile sektör desteklenmiş ve toplam proje tutarı 33.241.706,56 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-27 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2012	25.000	28.533	23.239
2013	27.900	28.540	16.495
2014	18.000	24.392	14.324
2015	26.000	33.242	14.466

Grafik-6 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

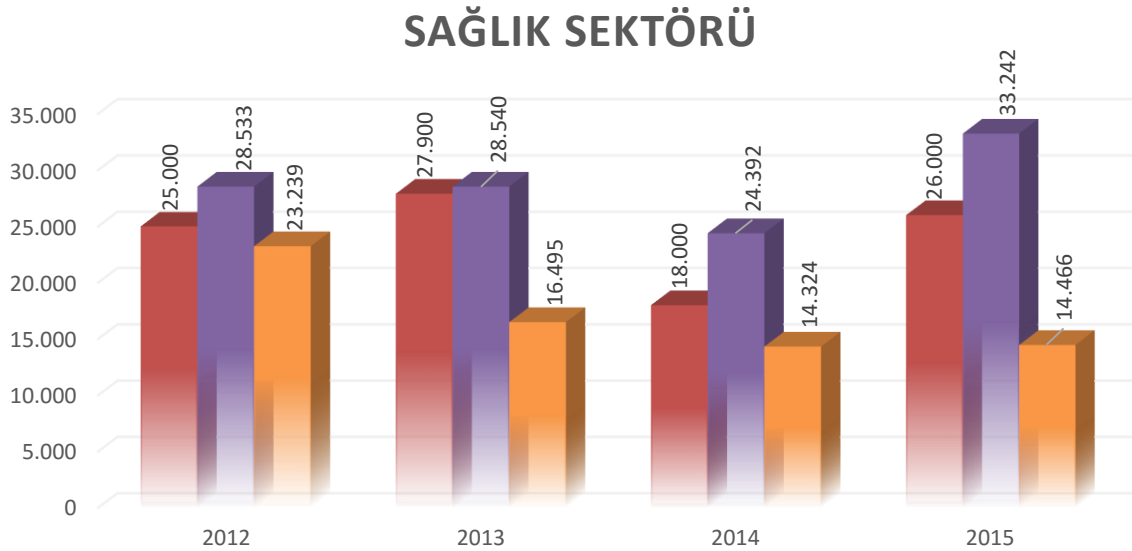


2015 yılında 2 adedi kültür sektöründe ve 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 8 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam 38.209.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılı başlangıç ödeneginde bir önceki seneye göre %21,3 oranında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Yıl içerisinde Maliye Bakanlığı yedek ödeneginden yatırımları hızlandırma

kapsamında gelen 4.000.000,00 TL tutarındaki kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş ve revize ödenek toplamı 51.096.484,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Restorasyon İşinin yapıldığı ve Didim Uluslar arası Gençlik Merkezi Binası ile Mühendislik Fakültesi İnşaatı işlerine yıllara sari olarak devam edildiği görülmektedir.

Tablo-28 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2012	19.132	18.444	12.246
2013	28.561	31.735	28.387
2014	31.505	32.886	31.561
2015	38.209	51.096	46.523

Grafik-7 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

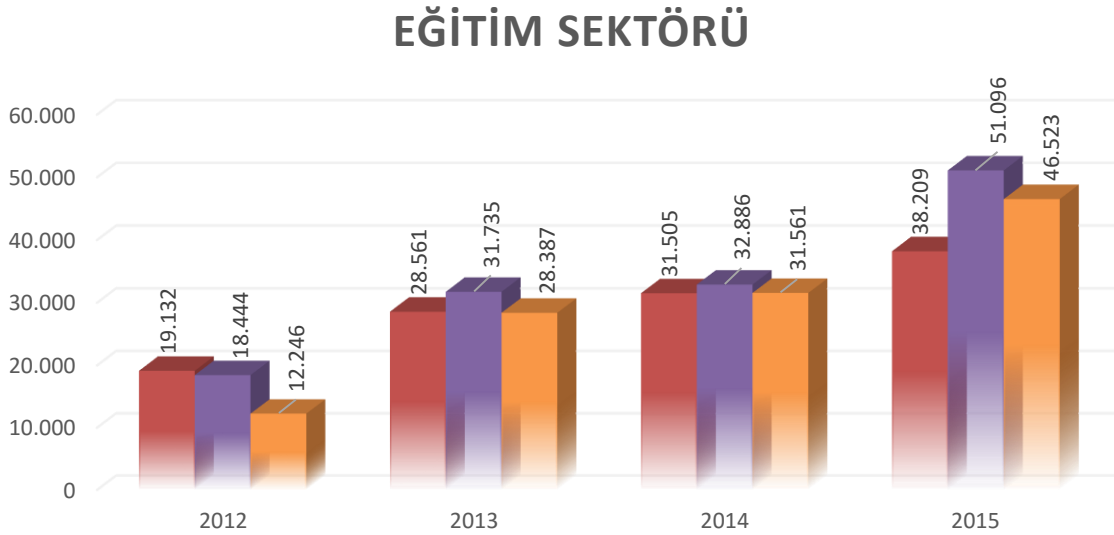


2015 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 6 adet proje için toplam 28.010.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki seneye göre sektörün toplam ödeneğinde %82,2 oranında yüksek bir artış olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-29 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2012	36.546	36.713	22.751
2013	30.904	30.991	14.716
2014	15.370	17.886	26.864
2015	28.010	37.852	28.575

Grafik-8 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

(DKH) SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ

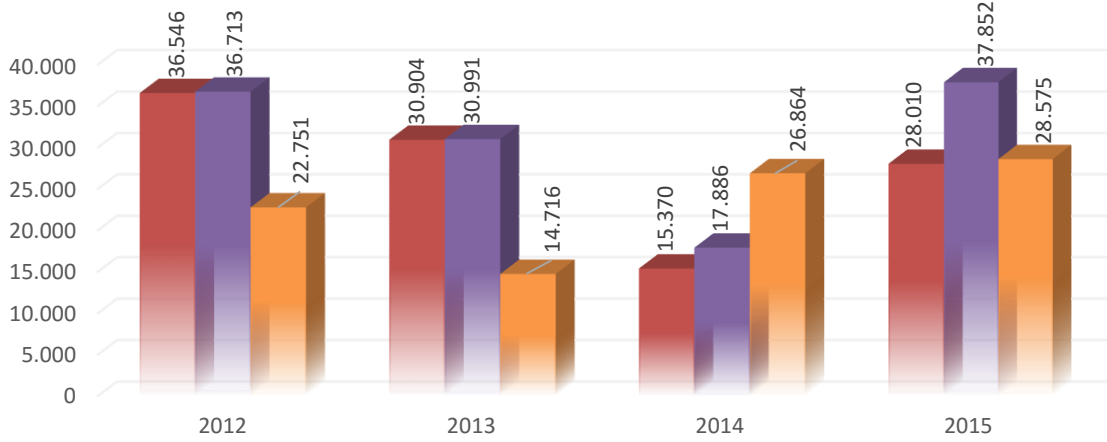

Tablo-30 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2014 Sonu Kümülatif Harcama	2015 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2015 Yılı Harcama (2)	Toplam Harcama
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Lab.	7.065	6.565	500			500	3.990	10.555
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	14.274	13.774	500			500	887	14.661
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarı	71.480	61.480	10.000			10.000	3.008	64.488
2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	27.423	21.423	6.000			6.000	425	21.848
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk.	7.724	5.724	2.000			2.000	1.047	6.771
KB Destekli Projeler Toplamı		127.966	108.966	19.000	0	0	19.000	9.357	118.323
2015K120160	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri(1)	9.010	0	9.010	9.842		18.852	19.218	19.218
GENEL TOPLAM		136.976	108.966	28.010	9.842	0	37.852	28.575	137.541

(1)Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.

(2) Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlar muhasebe kayıtlarında 333.20-emanet hesabının borcu dikkate alınmaktadır.

2015 yılı yatırım programında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 6 adet proje için 19.000.000,00 TL hazine yardımı ve 9.010.000,00 TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 28.010.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 9.842.032,45 TL ekleme işlemi ile toplam ödenek 37.852.032,45 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin 37.852.032,45 TL'si özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 28.573.784,26 TL harcanmıştır.

Tablo-31 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2014 Sonu Kümülatif Harcama	2015 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2015 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	15.000	1.483	1.800	650		2.450	1.648	3.131
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	155.000	99.917	14.998	1.550		16.548	14.444	114.361
2015H030390	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	100	0	100	820		920	764	764
2013H030660	Büyük Onarım	40.000	29.726	9.000	7.613		16.613	16.141	45.867
2011I000130	İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç.	10.000	0	100			100	0	0
2012I000160	Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	39.068	28.774	5.000	4.500		9.500	9.414	38.188
2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnş.(İnşaat)	5.913	5.913	0	4.017		4.017	3.924	9.837
2014I000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	42.000	0	15.400		4.850	10.550	128	128
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	1.000	500	500		301	199	174	674
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	10.000	1.500	3.500	730		4.230	4.230	5.730
TOPLAM		318.081	167.813	50.398	19.880	5.151	65.127	50.867	218.680

Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 6 adet, sağlık sektöründe 4 adet olmak üzere, toplam 10 adet proje için 2015 yılı programında toplam 50.398.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından etüt, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği 65.126.190,79 TL olmuştur. Ödenegin 50.866.599,30 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %78,1'dir.

Tablo-32 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 YTL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2014 Sonu Kümülatif Harcama	2015 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2015 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2015H030400	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim)	2.750	0	2.750	826		3.576	2.988	2.988
2015H030410	Yayın Alımı	3.250	0	3.250	500		3.750	3.734	3.734
2015H030400	Muhtelif İşler (Bil.Teknoloji.)	1.900	0	1.900	500		2.400	2.400	2.400
2012I000160	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Sağlık)	500	0	500	325		825	750	750
2015H030400	Muhtelif İşler (Taşıt Alımı) (Hibe)	411	0	411			411	0	0
2014I000070	Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi	286	180	106			106	0	180
2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnşaatı (Mak. Ve Teçhizat)	2.235	2.135	100	3.250		3.350	250	2.385
TOPLAM		11.332	2.315	9.017	5.401	0	14.418	10.122	12.437

Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan 2 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 3 adet olmak üzere toplam 5 adet proje için 2015 yılı programında 9.017.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından makine-teçhizat, yayım alımı ve bilgi teknolojileri projelerinin toplam ödeneği 14.418.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin 10.122.671,82 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %70,2'dir.

Tablo-33 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)

Açıklama	Proje Tutarı	2014 Sonu Kümülatif Harcama	2015 Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Revize Ödenek	2015 Yılı Harcama	Toplam Harcama
Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler*	136.976	108.966	28.010	9.842		37.852	28.575	137.541
Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım	318.081	167.813	50.398	19.880	5.151	65.127	50.867	218.680
Makine Teçhizat	5.771	2.315	3.456	4.401		7.857	3.988	6.303
Yayın Alımı	3.250	0	3.250	500		3.750	3.734	3.734
Bilgi Teknolojileri	1.900	0	1.900	500		2.400	2.400	2.400
Taahhüt Alımı (Hibe)	411	0	411			411	0	0
GENEL TOPLAM	466.389	279.094	87.425	35.123	5.151	117.397	89.564	368.658

* Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır. Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlar muhasebe kayıtlarında 333.20-emanet hesabının borcu dikkate alınmaktadır.

Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2015 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için 92.219.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 122.190.223,24 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 37.852.032,45 TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2014 yılından devreden tutar ve 2015 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde projeler ihtiyacına 9.021.000,00 TL, kamulaştırma için 115.000,00 TL ve Kalkınma Ajansı destekli projenin tamamlanabilmesi için sözleşme kapsamında 82.044,00 TL olmak üzere toplam 9.218.044,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Ayrıca taahhüt artığı karşılığı olarak toplam 4.108.190,79 TL ve Bilimsel Araştırma Projeleri ihtiyacına da gelir fazlası karşılığı toplam 9.842.032,81 TL ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında sağlık sektöründe yer alan 2013I000690 proje numaralı Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesine makine-teçhizat ihtiyacına 3.000.000,00 TL ve eğitim sektöründe yer alan 2015H030400 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine 1.000.000,00 TL ve 2013H030660 proje numaralı Büyük Onarım Projesine 3.000.000,00 TL olmak üzere toplam 7.000.000,00 TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2015 yılı yatırım programında Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam 19 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 46.523.140,62 TL, sağlık sektöründeki projeler için 14.466.130,50 TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 37.852.032,45 TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 98.841.303,57 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo-34 2015 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	EKLENEN					DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
		LİKİT	TAAHÜT ARTIĞI	GELİR FAZLASI	AKTARMA	YEDEK ÖDENEK			
06.1 Mamul Mal Alımları	22.660.000	1.401.000		9.842.033	656.419	4.000.000		38.559.452	34.881.139
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	8.710.000							8.710.000	8.710.000
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	1.960.000						656.419	1.303.581	1.303.580
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	2.000	115.000						117.000	104.115
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.390.000	3.020.000	3.666.707				4.500.000	36.576.707	22.909.435
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	330.000							330.000	329.985
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	18.300.000	4.682.044	441.484		4.500.000	3.000.000		30.923.528	30.331.208
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	458.000							458.000	458.000
TOPLAM	86.810.000	9.218.044	4.108.191	9.842.033	5.156.419	7.000.000	5.156.419	116.978.268	99.027.462

b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2015 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.
2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarımı Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda mali bir baskı yaratmaktadır.
6. Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Kalkınma Bakanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır.

III. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-35 Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
20141000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	2014-2017	İnşaat-Makine ve Teçhizat	15.400.000	10.550.000	128.028	Yeni Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi yapım işi ihalesinde çıkılmış, 42.426.000,00 TL bedelle 2015-2017 yıllarına sarı olarak ihale edilmiş ancak ihale iptal edilmiştir. Proje kapsamında sadece imar ruhsatı alımı için harcama gerçekleştirilmiştir.
20111000130	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirilmesi	2011-2016	Etüt-Proje	100.000	100.000	0	Ön çalışmalarda deprem güçlendirme çalışmalarının oldukça yüksek maliyette olması ancak bütçe ve döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeni ile işe başlanılmamıştır.
20121000160	Muhtelif İşler	2012-2015	Makine ve Teçhizat-Bakım Onarım-Taşıtlar	10.294.000	15.119.000	10.163.648	Proje kapsamında 21 adet binanın büyük bakım onarım işleri yapılmıştır. Projenin 5.500.000,00 TL olan başlangıç ödeneği sağlık sektöründe mevcut binaların zorunlu büyük onarım ihtiyaçlarının olması ve bu amaçla tahsis edilen ödenenin yetersiz kalması nedeniyle ihale süreçleri uzadığı için ödenek kullanılmayan Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi Projesinden 4.500.000,00 TL aktarılacak ve 325.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenerek döner sermaye hariç toplam 10.325.000,00 TL tutarına çıkarılmıştır. Ayrıca proje kapsamında hastaneler ihtiyacına hasta koltuğu, ameliyat masası ve tefriş malzemesi alımları gerçekleştirilmiştir.
20131000690	Gastroenteroloji Binası İnşaatı	2013-2015	Makine ve Teçhizat-İnşaat	100.000	7.366.707	4.174.454	Yapım işi 2013 yılında KDV dahil toplam 5.233.654,00 TL tutarında ihale edilmiş ve yapım işi 2015 yılında tamamlanmıştır. Diğer taraftan proje kapsamında 250.000,00 TL tutarında tefriş malzemesi alımı yapılmıştır. Maliye Bakanlığı yatırımları hızlandırma yedek ödeneğinden gelen 3.000.000,00 TL tutarında ödenek ihale süreci için yeterli zamanın olmaması sebebi ile harcanmamıştır.
20141000070	Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi	2014-2015	Etüt Proje-Donanım ve Yazılım	106.000	106.000	0	Proje kapsamında döner sermaye kaynaklarının yetersizliği sebebi ile herhangi bir gerçekleştirilme olmamıştır.

Tablo-36 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012I000160	Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)	İbni Sina Hastanesi Asansör Yapım İşi (2014-2015 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Mehmet Altuntaş	3.160.974
		Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği Büyük Bakım Onarımı (14-15 Sari)	Açık İhale	Lütfi Yıldız İnşaat-Taşyapı Resi.-İş Ortaklığı	2.703.468
		Kalp Merkezi Mek. Tes. Büyük Onarım İşi(2014-15 Sari)	Pazarlık	Mehmet Koç	155.052
		Çocuk Hastanesi Eksik İşleri Tamamlama İşi	Açık İhale	Altay Mek.İsı Sist.Ltd.Şti	1.077.970
		İbni Sina Hastanesi Basınçlı Komprasör Değişim İşi	Açık İhale	Metin Şahin	270.692
		Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Hematoloji Binası Çatı Onarımı	Doğrudan Temin	Köksal İnşaat	50.740
		Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Binası Asansör Yenilemesi İşi	Açık İhale	Raba Ticaret	417.720
		A.Ü.Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Kazan Ve Altyapı Onarımı İşi	Açık İhale	Hellan Ofis	274.619
		Cebeci Hastanesi Kampüsü Kaldırım Yenileme Tadilatı	Doğrudan Temin	Metzan İnşaat	56.640
		Tıp Fak.Kadın Hast.Ve Doğum ABD Binası Deprem Performans Analizi	Doğrudan Temin	İkiz Yapı	47.200
		İbni Sina Hast 15.Kat A Blok Boyama Çatı Onarımı	Doğrudan Temin	Orhan Toraman	58.233
		Tıbbi Onkoloji Hastanesi Büyük Onarımı (2015-16 Sari)	Açık İhale	Taşyapı Restorasyon	500.320
		Tıp Fak.Çocuk Hastanesi Entegrasyon Sistemi Ve Görüntü Aktarım Revizyon İşi	Açık İhale	İstem Tıbbi Ciha.	309.160
		Dış Hekimliği Laboratuvarları Ve Derslikleri Havalandırma Tesisatı Tadilatı	Doğrudan Temin	Koçoğlu İnşaat	59.177
		Kalp Merkezi Güçlendirme Ve Gastro Yangın Merdiveni İşi	Doğrudan Temin	Gümüş İnşaat	57.820
		İbni Sina Hastanesi Öğ. Üyeleri Yemekhanesi Asansör Mk. D. Yanı Yalıtımı Ve B Blok 15.Kat. Boyanması İşi	Doğrudan Temin	Ergen İnşaat	58.705
		Tıbbi Onkoloji Binası Rölöve Projesi (D.T.Kültür İstisna)	Doğrudan Temin	Art Line İnşaat	25.000
		A.Ü.Cebeci Kampüsü Beyin Merkezi Ve Biobanka Yağmur Suyu Drenaj Yapım İşi	Doğrudan Temin	Karaca İnşaat	58.174
		Çocuk Hastanesi Radyoloji Medikal Cihaz Topraklama Hattı	Doğrudan Temin	Erol Koç	11.387
		Nükleer Tıp A.B.D. Ek Binası Klima Santrali Isıtma Hattı Kollektör Sisteminin Yap. İşi	Açık İhale	Şen-Ka İnşaat	28.674
Tıp Fakültesi Cebeci Hast. Tıbbi Onkoloji Binası Tesisat Elektrik Rölöve Projesi Yaklaşık Maliyet Hazırlanması İşi	Açık İhale	Altu Mimarlık	31.860		
TOPLAM				9.413.584	

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-37 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012I000160	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	Hasta Koltuğu Alımı	Açık İhale	Yetkin	294.840
		Ameliyat Masası	DMO	DMO	97.041
		Tefriş Malzemesi Alımı	DMO	DMO	358.183
TOPLAM					750.064

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-38 Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2) Projesi	Gastroenteroloji Binası İnşaatı Yapım İşi	Açık İhale	Askon İnşaat	3.924.454
TOPLAM					3.924.454

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-39 Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi (inşaat) Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013I000690			-		
Proje Adı	Gastroenteroloji Binası İnşaatı			-		
Sektör/Alt sektör	Sağlık			-		
Proje Amacı	Gastroenteroloji Binası İnşaatının tamamlanarak hizmete açılması			-		
Proje Yeri	Ankara / Cebeci			-		
Karakteristiği	İnşaat			-		
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2014			2013-2015		
Proje Sözleşmesi Tarihi	13.08.2013	Sözleşme İhale Bedeli		5.234		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		5.234			5.620	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
Açıklama	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2013)		300			353	
2014		1.267			1.343	
2015		3.924			3.924	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında Üniversitemiz sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca İstihdam artışı, bölgesel kalkınma ve katma değer beklenen faydalardandır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri, Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Sağlık sektörüne hizmet katkısının artırılması					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Şikayet ve itiraz prosedürleri sonucu ihale süreçlerinin uzaması nedeni ile yapım işi öngörülen sürede bitirilememiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Proje tekliflerinde olası aksaklıklar göz önüne alınarak proje süresi teklif edilmelidir.					

Tablo-40 Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2013I000690	Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2) Projesi	Tefriş Malzemesi Alımı	DMO	DMO	250.000
		TOPLAM			

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-41 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Projesi Yapım İşi

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014I000080	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Yapım İşi (yalnızca imar ruhsatı alım gideri gerçekleşmiştir.)	Açık İhale	Ertay İnşaat/İşyapı İnş. Ortak Girişim	128.028
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-42 Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	2014-2016	İnş.(4 kap. Tenis Kr., Sent. Atı, Pis. Futbol S., 1 Basketbol S.) Onarım	1.800.000	2.450.000	1.648.016	Üniversitemiz Tandoğan Kampüsü Açık Spor Alanı Tribünlerinin Kapatılması işi 1.356.875,10 TL maliyetle yapılmış ve Gölbasi Yerleşkesi Spor Tesisi işi 5.773.000,00 TL bedelle 2015-2017 yıllarına sarı olarak ihale edilmiştir. Diğer taraftan 6 adet muhtelif büyük onarım işleri yapılmıştır. 1.800.000,00 TL olan başlangıç ödeneği 2.450.000,00 TL'na çıkarılmış ve toplam 1.648.015,99 TL kullanılmıştır.
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	1994-2017	İnş.+Don. Ceb.Kmp.Sos.Bil.Der. Göl.Kamp.Müh.Fak. Denedy Hy.Lab. Didim Uls.Dil ve Kül.Mer.	14.998.000	16.548.000	14.444.145	2014 yılında Gölbasi Mühendislik Fakültesi yıllara sarı olarak 11.894.000,00 TL bedelle ve Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Bina İnşaatı işleri yıllara sarı olarak 12.247.500,00 TL bedelle ihale edilmiştir. 2015 yılında yapım işleri devam etmiştir. Gıda Mühendisliği Binası İkmal İnşaatı ise 2015 yılında 7.668.000,00 TL bedelle ihale edilmiş ve yapım işleri devam etmektedir. 14.998.000,00 TL olan başlangıç ödeneği ypsilonunda 16.548.000,00 TL'ye çıkarılmıştır ve toplam 14.444.145,03 TL kullanılmıştır.
2015H030390	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2015-2015	Etüt Proje-Müşavirlik	100.000	920.000	763.932	Bağlica Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Bina İnşaatı Projesi işi 984.000,00 TL bedelle 2015-2016 yıllarına sarı olarak ihale edilmiş, büyük onarım ihtiyaçlarının çokluğu sebebi ile ihtiyacı karşılamaya yönelik diğer muhtelif etüd projeler yapılmıştır. 100.000,00 TL olan başlangıç ödeneği 920.000,00 TL'na çıkarılmış ve 763.932,00 TL kullanılmıştır.
2013H030660	Büyük Onarım	2013-2017	B.Onar. Tad.Res.Dep.G üç.lđ.Yen.	9.000.000	16.612.909	16.140.913	9.000.000 TL'si olan başlangıç ödeneği eğitim sektöründe mevcut eğitim binalarının zorunlu büyük onarım ihtiyaçlarının yüksek olması ve bu amaçla tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması sebebi ile Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden gelen tutar ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile 16.612.909,23 TL'na çıkarılmıştır. Proje kapsamında 68 adet binanın bakım onarım işi tamamlanmıştır.
2015H030410	Yayın Alımı	2015-2015	Küt.Yayın Alımı	3.250.000	3.750.000	3.734.810	Proje ödeneği Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden aktarılan tutar ile birlikte 3.750.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir ve ödeneğin 557.588,03 TL'si 381 adet süreli yayın aboneliğinde, 2.754.192,97 TL'si 92 adet veri tabanı aboneliğinde ve 423.029,33 TL'si 5.361 adet kitap alımında kullanılmıştır.
2015H030400	Muhtelif İşler	2015-2015	B.On.- Tad.Mök.Teç.Bil.Don.Y az.Alt.Bak.On.lđ.Yen.T aşit	5.061.000	6.387.000	5.387.798	Proje ödeneği yıl içerisinde yapılan ekleme işlemleri ve Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden yapılan aktarma ile toplam 6.387.000,00 TL olmuştur. Ödeneğin 2.987.905,76 TL'si muhtelif makine-teçhizat alımları ve tefris alımlarında, 2.399.891,92 TL'si ise bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır.
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	2014-2015	Etüt Proje-Müşavirlik	500.000	198.575	173.552	500.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin 31.425,00 TL'si kültür sektöründe mevcut binalarımızın zorunlu büyük onarım ihtiyaçlarının olması ve bu amaçla tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması sebebi ile Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesine aktarılmıştır. Proje kapsamında muhtelif etüd proje işleri yapılmıştır.
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2014-2016	Onarım-Restorasyon	3.500.000	4.230.000	4.229.974	3.500.000 TL'si olan başlangıç ödeneği diğer projelerden yapılan aktarmalar sonucunda 4.230.000,00 TL'sine çıkarılmıştır. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Restorasyon işi tamamlanmıştır ve proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

Tablo-43 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	A.Ü. Tandoğan Yerleşkesi Açık Spor Alanı Tribünlerinin Kapatılması ve Soyunma Odaları ve WC Bakım Onarımı İşi	Açık İhale	Berkant Ekici	1.356.875
		Olimpik Yüzme Havuzu Çevre Düzenleme İşi	Doğrudan Temin	Yapitem Yapı	58.705
		Tandoğan Yerleşkesi Açık Amfi Oturma Yerleri Ahşap Yenileme İşi	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	53.100
		Ziraat Fak. Tenis Kortu Tadilatı	Doğrudan Temin	Ergen İnşaat	52.864
		A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Spor Tesisleri Yapım İşi (2015-2017) (imalat gerçekleştirilememiştir.)	Açık İhale	Garden İnşaat	-
		Elmadağ Kayak Merkezi Tadilatı	Doğrudan Temin	Smd Yapı	58.410
		Hataş Tarafından Açılan Dava Sonucu Çıkan İcra Borcuna Karşılık İcra Müdürlüğüne Ödeme	Doğrudan Temin	İcra Müdürlüğü	9.475
		Tandoğan Kamp. Yüzme Havuzu Bodrum Pompa İşi	Doğrudan Temin	Yapitem Yapı	58.587
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-44 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	Mühendislik Binası Jeoloji Müh. YEBİM Binası İnşaatı (2014-2015 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Hellan Ofis İnş. Ltd.Şti.	5.992.598
		Didim Uluslar arası Gençlik Merkezi İnşaatı (2014-2017 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Onursal Proje İnş.	3.151.962
		Gölbaşı Kampüsü Gıda Müh. ve Ek Bina İkmal İnşaatı (2015-2016 yıllarına sari)	Açık İhale	Askan İnşaat	5.299.585
TOPLAM				14.444.145	

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Şekil-1 Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Proje Resmi



Şekil-2 Didim Uluslararası Gençlik Merkezi Proje Resmi



Tablo-45 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2015H030390	-
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Etüt Proje Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Etüt-Proje Müşavirlik	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015	-
Proje Tutarı (maliyeti)	100 (Hazine Yardımı)	100 (Hazine Yardımı) 820 (Öz Gelir)
Yapılan Harcama		764

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-46 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2015H030390	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Bağlıca Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi Etüt ve Projeleri Hazırlanması İşi (2015-16 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Altu Mimarlık	348.336
		Gama MYO Mimari Müh. Proje İşi	Doğrudan Temin	Özgür Tuğa	57.820
		Ziraat Dışkapı Zemin İyileştirme Projesi	Doğrudan Temin	Art Geodesing Müş.	27.435
		DTCF Ek Bina D Blok Yaklaşık Mal. Çıkartılması İşi	Doğrudan Temin	İff Mühendislik	21.830
		Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi Revize Projesi	Doğrudan Temin	Aye Mimarlık	53.808
		Dışkapı Kamp. Yaya üst Geçidi Proje İşi	Doğrudan Temin	Kahraman Sönmez	59.000
		A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Spor Tes.Mim.Müh. Projeleri ve Keşif Dosyası Hazırlanması Hiz. Alım İşi	Pazarlık	Aye Mimarlık	170.923
		Siyasal Bil.Fak. Çatı Proje İşi	Doğrudan Temin	Gümüş İnşaat	24.780
		Manavgat İmar Çalışması (Taahhüt artığı olarak ertesi yıla devretmiştir.)	Doğrudan Temin	Barlas İmar	-
		TOPLAM			

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-47 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	DTCF Kütüphane Binası Tadilatı İşi Yıllara Sari 2014-15	Açık İhale	Gensoy İnşaat	3.077.748
		Yüzme Havuzu Büyük Onarım İşi	Açık İhale	Yapıtem Yapı	293.939
		Tandoğan Kampüsü Astronomi Ve Uzay Bilimleri Bölümü Teras Onarımı İşi (2014-15 Sari)	Açık İhale	Gökhan Çakırhan	59.033
		Gölbaşı Sosyal Tesis Binası Çatı Yalıtımı İşi	Doğrudan Temin	Yıldırımlar İnşaat	41.300
		Gölbaşı Yerleşkesi M ve E Blokta İki Adet Okuma Salonu Yapımı İşi	Doğrudan Temin	Master Grup	42.657
		Gölbaşı Yerleşkesi K Bloğun Biyomedikal Müh. H Bloğun Jeoloji Müh. Olarak Düzenlenmesi Büyük Onarım İşi	Açık İhale	Gensoy İnşaat	2.327.349
		Tandoğan Yerleşkesi Anküsem Binasının Oyuncak Müzesine Dönüştürülmesi İşi	Doğrudan Temin	Master Grup	54.442
		Tömer İstanbul Şubesi Hizmet Binası Bakom Onarımı (Döner Ser.Top. Dahil Edilmemiştir)	Açık İhale	Yapinet Yapı	517.973
		Eğ.Bil.Fak.Ve Eski Sosyal Bil.Enst. Öğ. Elemanı Odaları Tam.ve Asansör Etrafının Kapatılması İşi	Doğrudan Temin	Özgüven İnşaat	53.100
		İletişim Fakültesi Muhtelif Mahaller Onarım İşi	Açık İhale	Hepa Mühendislik	173.814
		İlahiyat Fakültesi WC Ve Dış Cephe Mantolama Büyük Onarım İşi	Açık İhale	Selim Mühendislik	488.415
		Yıldırım Beyazıt Öğ. Yurdu Mutfak Ve Çam. Elektrik Tes. Onarımı	Doğrudan Temin	Zafer Elektrik	28.320
		Tandoğan Kadın Platformu Birimi Isıtma Tesisatı Onarım İşi	Doğrudan Temin	Smd İnşaat	10.915
		Rektörlük Yemek Salonu, Ayniyat Ofisleri Tadilatı Ve Fen Fak. Rögarlarının Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	İnci Emre İnşaat	58.705
		Dışkapı Yerleşkesi Toprak Bölümü Tadilatı	Doğrudan Temin	Doğuş 2000 İnşaat	58.587
		Veteriner Fak. Genetik Zooteknik Hayvancılık İşletme Ek.ABD Asansör Yapım İşi	Açık İhale	Sebahattin Bozat	107.380
		Keçiören Yerleşkesi Sağlık Hiz.Bekçi Kulübesi Yapım İşi	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	23.600
		İlgaz Örsem Kanka Kafe Söküm İşi	Açık İhale	İnci Emre İnşaat	17.700
		Siyasal Bilgiler Fakültesi Muhtelif Mahaller Onarım İşi	Açık İhale	Şen-Ka İnşaat	897.630
		SAYFA TOPLAMI			

Tablo-47 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					7.814.633
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	Veteriner Fakültesi Kanalizasyon Yenileme İşi	Doğrudan Temin	Karaca İnşaat	155.760
		Diş Hekimliği Fakültesi 1 Nolu Derslik Ve Konferans Salonu Havalandırma Tadilatı İşi	Doğrudan Temin	Koçoğlu İnşaat	9.440
		Ziraat Fak. Toprak Bölümü A Blok Doğrama Değişim İşi	Açık İhale	Özgüven İnşaat	137.922
		Manavgat Örsen Tesisi Asansör Yapım İşi (A.İ.-Sosyal Tes. Bütçesi Toplama Dahil Edilmemiştir.)	Açık İhale	Raba Ticaret	270.479
		50.Yıl Kam. İdari Birim Binası Misafirhane Mek. Kısım Tad.	Doğrudan Temin	Aydın Karagözoğlu İnşaat	21.019
		Fen Fakültesi Kimya Ve Biyoloji Bölümü Muh. Lab. Restorasyon İşi	Açık İhale	İşsan İnşaat	1.626.424
		Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü A Blok Onarımı İşi	Açık İhale	Gülistan Ayluçtarhan	286.879
		Hukuk Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Restorasyonu İşi	Pazarlık	Lütfi Möble	499.232
		Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü Altyapı Kan. Diranaj Tad. İşi	Doğrudan Temin	Berkant Ekici	58.705
		Ziraat Fak. Haymana Çiftliği Yemekhane Elektrik Tadilatı İşi	Doğrudan Temin	Yüksel Öztürk	58.705
		A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Yabancı Diller Y.O. Wc Çatı Onarımı Ve L-K-I-H Blok Çatı Onarımı İşi	Açık İhale	Gülistan Ayluçtarhan	374.719
		Eczacılık Fak.Lab. Onarımı	Açık İhale	Ergen İnşaat	371.147
		A.Ü. Tandoğan Yer. Astronomi Ve Uzay Bil.-Kimya Mühendisliği Binası E Blok Onarım İşi	Açık İhale	Gülistan Ayluçtarhan	535.373
		DTCF Ek Bina D Blok Onarımı İşi (2015-16 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Güvem Proje/ Emre Türkeli-Ortak Girişim	407.557
		Milli Piyango Öğrenci Evi Tadilatı	Doğrudan Temin	Yüksel Öztürk	58.882
		A.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Muhtelif Mahaller Onarımı	Açık İhale	Erfa İnşaat	211.866
		A.Ü. Su Yönetimi Enstitüsü Muhtelif Mahal Ve Çatı Onarımı	Açık İhale	Mts Grup	151.263
		Tandoğan Yerleşkesi Mühendislik Fak.D Blok Yemekhane Onarımı	Açık İhale	Hepa Mühendislik	86.494
		Eğitim Bil.Fak Geçiş Koridoru, Arşiv Ve Asansör Yapılması İşi (Döner Sermaye Toplama Dahil Edilmemiştir)	Açık İhale	Özgür Tuğa	353.271
		SAYFA TOPLAMI			

Tablo-47 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					12.866.020
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	Vet.Fak. Hayvan Hast. Ve Ek Binaları Rest. İşi (14-15yıllara Sari)	Açık İhale	Doğuş 2000 İnşaat	1.300.355
		Ş.Aziz Kansu Binası Soğutma Grubu Evaporatörler Değişimi İşi	Doğrudan Temin	Üntes Klima	58.646
		Ş.A. Kansu Binası 6.Kat H.İçi Eğitim Salonu Tadilatı	Doğrudan Temin	Pan Yapı-Ulaş Yıldız	24.190
		Eczacılık Fakültesi Çevre Düzenleme İşi	Doğrudan Temin	Metzan İnşaat	58.882
		Ankara Üniv. Ziraat Fk.Su Ürünleri Müh.B Blok Çatısı Saçak Yapımı Ve Doğalgaz Bacasının Onarımı İşi	Doğrudan Temin	Mustafa Turan Selçuk	59.000
		A.Ü. Ziraat Fk.Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mutfak Teras Tadilatı Ve Merdiven Yapımı	Doğrudan Temin	Smd İnşaat	57.820
		Cebeci Kampüsü Yürüyüş Yollarının Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	İnci Emre İnşaat	42.480
		Güzel Sanatlar Dekanlık Tadilatı	Doğrudan Temin	Güvem Proje	58.764
		Adalet MYO Mescit Tadilatı	Doğrudan Temin	Özgüven İnşaat	57.584
		Cebeci Uygulamalı Bilimler Fak. Binası B. On. (2015-16 Sari)	Açık İhale	Şen-Ka İnşaat	247.995
		DTCF Ana Bina Asansör İşi	Açık İhale	Doğuş 2000 İnşaat	279.660
		Hukuk Fakültesi D Blok Yeni Bina 6 Adet Amfi Onarımı	Doğrudan Temin	Lütfi Möble	58.410
		Nükleer Bilimler Enst. Yalıtım Ve Pis Su Gideri Tadilatı	Doğrudan Temin	Karaca İnşaat	58.410
		Tandoğan Öğrenme Merkezi Çatı Tadilatı	Doğrudan Temin	Kule İnşaat	56.685
		Rektörlük WC Tesisatları Tadilatı	Doğrudan Temin	Kule İnşaat	30.090
		Devlet Konservatuvarı Ve Enformatik Bölümleri Çatı Onarımı	Doğrudan Temin	Köksal İnşaat	9.912
		Tandoğan Kampüsü Nilüfer Havuzu Tadilatı	Doğrudan Temin	Kayhan İnşaat	30.680
		İlahiyat Fakültesi Çatı Onarımı	Doğrudan Temin	Çatı Dizayn	59.118
		ANKEV Binası Kalorifer Tesisatı Sirkülasyon Hattı Tadilatı	Doğrudan Temin	Aton Mühendislik	14.160
		Tandoğan Öğrenme Merkezi W C Onarımı	Doğrudan Temin	Gülistan Ayluçtarhan	31.565
Gölbaşı Yemekhane Yağmur Olukları Rezistans İşi	Doğrudan Temin	Form Mühendislik	44.250		
Taşınmaz Geliştirme ABD 2.Kat Tadilatı	Doğrudan Temin	Metzan İnşaat	58.882		
SAYFA TOPLAMI					15.563.559

Tablo-47 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					15.563.559
2013H030660	Büyük Onarım Projesi	İlahiyat Fakültesi Mescit Düzenleme İşİ	Doğrudan Temin	Metzan Yapı	57.702
		Kalecik MYO Kalorifer Tesisatı Onarımı İşİ	Doğrudan Temin	Özgüven İnşaat	38.763
		Çocuk Bilim Merkezi Isıtma Hattı Değişimi	Doğrudan Temin	Doğan Karaca	58.587
		Ziraat Veterinerlik Dekanlık Kampüsü Çevre Düzenleme Rest. Projeleri İşİ(Kültür-D.T.) (taahhüt artığı)	Doğrudan Temin	Ark Restorasyon	0
		ATAUM Bodrum Kat Tadilatı	Doğrudan Temin	Şen-Ka İnşaat	47.200
		Gölbaşı 50.Yıl Kampüsü A Blok Çatı Onarımı	Doğrudan Temin	Gülistan Ayluçtarhan	35.990
		Spor Bilimleri Fakültesi Binasının Engellilere Göre Düzenlenmesi İşİ	Doğrudan Temin	Zafer Kaplan	57.393
		Gölbaşı Kamp. H Blok PVC Döşeme Ve K Blok Seminer Odası Halı Kaplama İşİ	Doğrudan Temin	Hellan Ofis	57.820
		Rektörlük Asansör Yapımı İşİ	Açık İhale	Nuras Asansör	223.899
TOPLAM					16.140.913

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-48 Yayın Alımı Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2015H030410	-
Proje Adı	Yayın Alımı	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Kütüphane Yayın Alımı	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015	-
Proje Tutarı (maliyeti)	3.250 (Hazine Yardımı)	3.750 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		3.735

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tablo-49 Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları

Proje No	Proje Adı	Alım Usulü	Alımı Yapılan Mallar	Adedi	Alımın Toplam Maliyeti
2015H030410	Yayın Alımı	22/A 22/D	Sürelî Yayın Aboneliği	381	557.588
			Veri Tabanı Aboneliği	92	2.754.193
			Kitap Alımı	5.361	423.029
TOPLAM					3.734.810

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Şekil-3 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi



Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2015H030400	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Makine-Teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015	-
Proje Tutarı (maliyeti)	1.800 (Hazine Yardımı) 950 (Öz Gelir)	1.800 (Hazine Yardımı) 1.776 (Öz Gelir)
Yapılan Harcama		2.988

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-51 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2015H030400	Muhtelif İşler	Binek Otomobil Alımı	DMO	DMO	205.668
		Minibüs (Sürücü Dahil En Fazla 17 Kişilik)	DMO	DMO	79.002
		4 Adet Masa, 30 Adet Ahşap Sandalye, 1 Adet Konsol Ve 100 Adet Giydirme Ahşap Sandalye Alımı	DMO	DMO	34.987
		1 Adet Yazıcı Ve 50 Adet Telefon Alımı	DMO	DMO	4.692
		Koltuk Alımı	DMO	DMO	15.487
		Masa, Dolap Ve Koltuk Alımı	DMO	DMO	282.201
		Telefon Santrali Alımı	DMO	DMO	88.251
		Bekleme Koltuğu Alımı	DMO	DMO	3.492
		Masa, Koltuk Ve Kitaplık Alımı	DMO	DMO	32.736
		Bilgisayar Masası	DMO	DMO	12.071
		Masa, Dolap, Koltuk, Banko Ve Yazı Tahtası Alımı	DMO	DMO	95.085
		Toplantı Masası Alımı	DMO	DMO	772
		Masa Ve Yazı Tahtası Alımı	DMO	DMO	9.230
		Büro Tefriş Malzemesi (Masa, Sandalye, Bekleme Koltuğu, Çalışma Koltuğu, Ofis Mobilyası) Alımı	DMO	DMO	162.279
		Büro Tefriş Malzemesi (Masa, Sandalye, Bekleme Koltuğu, Çalışma Koltuğu, Ofis Mobilyası) Alımı	DMO	DMO	209.963
		Bilgisayar Masası, Kütüphane Masası Ve Sandalye Alımı	DMO	DMO	32.884
		Çalışma Koltuğu Alımı	DMO	DMO	4.997
		Konferans Sandalyesi Alımı	DMO	DMO	5.906
		Bekleme Koltuğu Alımı	DMO	DMO	13.452
		Konferans Sandalyesi Alımı	DMO	DMO	4.673
		Büro Tefriş Malzemesi Alımı	DMO	DMO	39.837
		Okul Sırası Alımı	DMO	DMO	22.585
		Tek Kişilik Okul Sırası Alımı	DMO	DMO	4.673
		-86 Derin Dondurucu Alımı	Açık İhale	Labor İldam	28.236
		Isıtmalı Ultrasonik Banyo Alımı	Açık İhale	Info	4.931
		Hassas Terazı Alımı	Açık İhale	Ankyra	5.375
		Hassas Terazı Alımı	Açık İhale	Protek	1.770
		Polorimetre Alımı	Açık İhale	Ankyra	9.074
		Digital Büret Alımı	Açık İhale	Protek	1.888
		Etüv Alımı	Açık İhale	Protek	1.741
Dissolüsyon Cihazı Alımı	Açık İhale	Bilim	39.825		
SAYFA TOPLAMI				1.457.764	

Tablo-51 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					1.457.764
2015H030400	Muhtelif İşler	Hassas Terazi Alımı	Açık İhale	Ankyra	8.555
		Rotor Alımı	Açık İhale	Daihan	2.449
		Vorteks	Açık İhale	Daihan	496
		Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Alımı	Açık İhale	Daihan	1.121
		Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Alımı	Açık İhale	İnfo	14.146
		Mantolu Isıtıcı Alımı	Açık İhale	Çalışkanlar	3.210
		Karıştırıcı Vorteks Alımı	Açık İhale	Daihan	313
		Kit Saklama Dolabı Alımı	Açık İhale	Protek	5.723
		Kuru Hava Sterilizatörü Alımı	Açık İhale	Protek	1.741
		Hassas Terazi Alımı	Açık İhale	Ankyra	2.041
		Densitometre Alımı	Açık İhale	Ankyra	2.230
		Jinekoloji Amaçlı Laparoskop Seti Alımı	Doğrudan Temin	Hasvet	26.880
		Mikrotom Cihazı	Açık İhale	Sermed	20.060
		Kafatası Açma Masası Ve Seti Alımı	Açık İhale	Denmak	10.030
		Elektro Ejakülatör Alımı	Açık İhale	Ata-Fen	10.638
		Selüloz Analiz Cihazı (Fiber Analyser) Alımı	Açık İhale	Labormed	67.018
		Kan Gazları Ve Elektrolit Cihazı Alımı	Açık İhale	Savaş Med.	15.660
		Video Otoskop	Açık İhale	Hasvet Med.	2.124
		Veteriner Muayene Masası Alımı	Açık İhale	Hasvet Med.	3.510
		Manyetik Karıştırıcı-Isıtmalı Alımı	Açık İhale	Tesa	3.995
		Racklı Sıvı Azot Saklama ve Taşıma Kabı Alımı	Açık İhale	Kayra	22.066
		Temel Elekt. ve Elektronik Lab. Deney Seti Alımı	Açık İhale	Spark	191.160
		Temel Veri Toplama Modülü Alımı	Açık İhale	Enovas	19.774
		Ultrasaf Su Cihazı Alımı	Açık İhale	Militest	39.589
		Hassas Terazi Alımı	Açık İhale	Sem End.	5.133
		Soğutmalı Santrifüj Alımı	Açık İhale	Prizma	26.279
		Derin Dondurucu - 86 C Alımı	Açık İhale	Prizma	42.280
		Isıl İşlem Fırını Alımı	Açık İhale	Protek	5.841
		Optik Mikroskop Alımı	Açık İhale	Daihan	24.624
		Metalografik Numune Bakalite Alma Makinesi Alımı	Açık İhale	Elista	27.814
Metalografik Numune Zımparalama /Parlatma Cihazı Alımı	Açık İhale	Elista	37.170		
SAYFA TOPLAMI					2.101.433

Tablo-51 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					2.101.433
2015H030400	Muhtelif İşler	Otomatik Üniversal Sertlik Test Cihazı Alımı	Açık İhale	Als	101.811
		Metalografik Numune Kesme Makinası Alımı	Açık İhale	Elista	68.078
		M-Fpk-Std Fiber Projeler Eğitim Kiti Alımı	Açık İhale	Optomek	70.800
		1 Adet X Ray Cihazı,1 Adet Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Ve 1 Adet Otomatik Fotoselli Kayar Kapı Alımı	Pazarlık	CNM	135.700
		Kablo Sistemi Alımı	Doğrudan Temin	Age Advanced	12.223
		Çeyrek Kuyruklu Piyano Alımı	Doğrudan Temin	Dore	26.000
		Duvar Tipi Ve Orta Tip Vitrin Alımı	Doğrudan Temin	Karataş Ayna	59.354
		Ultrason Cihazı Alımı	Doğrudan Temin	Elsa	8.640
		Kombine Elektroterapi Cihazı Alımı	Doğrudan Temin	Elsa	7.020
		Masalı Servikal Lomber Traksiyon Alımı	Doğrudan Temin	Elsa	10.260
TOPLAM					2.601.319

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-52 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2015H030400	Muhtelif İşler	Çalışma Tezgahı Tepsi Arabası Yer Ocağı-Doğalgazlı Gazlı Fırın Kanal Tip aspiratör Dik Tip Depo Buzdolabı Benmari Ünitesi Servis Ünitesi Kapaklı Küvet Çatı Tip Aspiratör Havalandırma Kanalı Yer Ocağı Elektrikli Fırın Konveksiyonlu Bulaşık Yıkama Mak.	22/D	HT Profesyonel	57.083
		Compact Arşiv Sistemi Endüstriyel Elektrik Süpürgesi Kuru Tip Elektrik Süpürgesi Metal Ayaklı Masa Metal Ayaklı Sehpa Dosya Dolabı Soyunma Dolabı Çalışma Koltuğu Soho Koltuk Metal Bekleme Koltuğu	DMO	DMO	161.743
		Sekreter Koltuğu Duvar Tipi Klima Tekli Koltuk Üçlü Koltuk Buzdolabı Elbise Dolabı Bilgisayar Masası Karyola Komidin	DMO	DMO	167.761
TOPLAM					386.586

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-53 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2015H030400	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Üniversitemiz birimlerinde İnternet bağlantısı amacıyla yeni uç ihtiyaçlarına cevap verilmesi, bilişim cihazları alınması, Üniversitemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar ve ağ cihazlarının donanım yükseltmesi ve tamiri için muhtelif yedek parçaların alınması gerekmektedir. Ayrıca işletim sistemi, anti virüs ve güvenlik yazılımı ile güvenlik duvarı yazılımının lisans yenilemeleri gerekmektedir.	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bilgisayar, Donanım, Yazılım, Altyapı ve Bakım-Onarım	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015	-
Proje Tutarı (maliyeti)	1.900(Hazine Yardımı)	2.400(Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		2.400

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-54 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2015H030400	Muhtelif İşler	Yedekleme yazılımı (Symantec Netbackup)	Doğrudan Temin	Symturk Bilgisayar	79.178
		Windows İşletim Sistemi (Microsoft)	Açık İhale	Sentim Bilişim	158.656
		Log Yazılımı (Sentinel LM)	Açık İhale	Profelis Bil.Danş.	37.760
		Redhat Lisans yenileme	Açık İhale	Profelis Bil.Danş.	9.322
		SCB Lisans	Açık İhale	Profelis Bil.Danş.	81.420
		SecureW2	Açık İhale	Profelis Bil.Danş.	25.960
		Kurumsal Kimlik Yönetim sistemi	Açık İhale	Profelis Bil.Danş.	22.420
		Database cluster (several lines)	Açık İhale	Profelis Bil.Danş.	42.480
		Antivirus Yazılım (Symantec)	Açık İhale	Symturk Bilgisayar	69.768
		Firewall Lisans yenileme (Fortigate)	Açık İhale	İnfrasis Bilgi Teknolojileri	205.143
		VM Ware Lisans	Açık İhale	Koç Sistem Bilgi Ve İletişim	30.090
		Kablosuz Ağ Denetleyicisi	Açık İhale	Bilgibim Bilgisayar	33.984
		Taşeron İşçi Takip Programı	Doğrudan Temin	Kamutech Yazılım	47.400
		Teyp Ünitesi Alımı	Doğrudan Temin	Jforce Bilişim	60.298
		UPS Alımı	Açık İhale	Emerson Network Pow.Güç.Sis.Ltd.Şti.	104.619
		Bilgisayar Kasası	DMO	DMO	109.667
Bilgisayar Monitörü	DMO	DMO	498.581		
SAYFA TOPLAMI					1.616.745

Tablo-54 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI					1.616.745
2015H030400	Muhtelif İşler	Yazıcı	DMO	DMO	95.774
		Projeksiyon Cihazı	DMO	DMO	162.257
		Kablosuz Ağ Cihazı	DMO	DMO	123.051
		Tandoğan Yerleşkesi Altyapı Tip-1 Dağıtım Anahtarı Tip-2 Dağıtım Anahtarı Data Kabineti Split Klima Kesintisiz Güç Kaynağı	Açık ihale	Fts Bilişim Teknolojileri	302.080
		115Soket G3240 İşlemci	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	4.691
		Flash Disk 16GB	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	625
		Flash Disk 32 GB	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	979
		Flash Disk 64 GB	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	1.505
		Flash Disk 128 GB	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	2.449
		Flash Disk 256 GB	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	5.192
		2TB 2,5 Taşınabilir Disk	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	3.528
		3,5'' 4TB Sata 64MB Hard disk	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	1.794
		500 GB Hard disk	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	2.124
		3.0 USB Dock Station	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	375
		Kaset Etiketli(IBM LTO6)	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	26.432
		Temizleme Kartuşu(Ultrium Universal)	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	3.162
		Çelik Dosya Dolabı	Doğrudan Temin	Aknet Yazılım	4.720
		500 gb Hard disk	Doğrudan Temin	Zemin Bilgisayar	29.500
		Tip 1 Ekran 27''	Doğrudan Temin	Zemin Bilgisayar	11.316
		Tip 2 Ekran 28''	Doğrudan Temin	Zemin Bilgisayar	1.593
		TOPLAM			

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-55 Tarihi Yapıların Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Proje Çalışmaları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	Hukuk Fak. Siyasal Bil.Fak. ve Fen Fak. A-B Bloklar Rölöve ve Restitüsyon Projeleri Hazırlama İşi	Pazarlık	Blok Mimarlık	54.977
		Tıp Fakültesi Cebeci Kamp. Başhekimlik Bin. Röl. Restitüsyon Proje İşi (Kültür D.T.)	Doğrudan Temin	Artline	118.575
TOPLAM					173.552

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-56 Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi Kapsamında Yapılan Bakım Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Restorasyonu İşi (2014-2015 Yıllarına Sari)	Açık İhale	Doğuş 2000 İnş.	4.229.974
TOPLAM					4.229.974

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Şekil-4 Veteriner Fakültesi Veteriner Tarihi Müzesi Restorasyon İşi Resimleri



3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-57 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA *	AÇIKLAMA
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Lab.	2011-2015	İleri Araştırma, Makine-Teçhizat	500.000	500.000	3.989.655	Projenin 2014 yılında tamamlanan MAL(BSL-3 Lab) ihalesinin 3.656.820.- TL tutarındaki ödeme işlemi 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje kapsamında toplandı katılım bedeli, makine-teçhizat ve sarf malzeme alımlarını karşılamak üzere özel hesaptan toplam 3.989.655,08 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	2010-2015	İleri Arş. Mak-Teç. İnş. (5.930 m2)	500.000	500.000	886.555	Ülkemizde Süperiletkenlik araştırma alanında Üniversitemiz bünyesinde mükemmeliyet merkezi kurmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında çalıştırılan personel ücret ödemeleri ve yurtiçi ve yurtdışı yolculuk ödemeleri de dahil olmak üzere, muhtelif mal ve hizmet alımları yapılmış olup emanet hesapları kayıtlarına göre 886.554,75 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	2006-2015	İleri Arş. Mak-Teç. İnş.(5.148 m2)	10.000.000	10.000.000	3.008.458	Süperiletken Modüllerin KDV masrafları bloke edilmiş, radyasyon kapısı, radyasyon bacası, radyasyonlu bölge su soğutma sistemi, vektör network analizör, RF yükseltçeler, RF iletim hatları, pulse former ihaleleri tamamlanmış, radyasyon kapısı kurulum çalışmaları başlatılmış, bazı enjektör hattı donanımının ihaleleri ve teminleri gerçekleştirilmiş, elektron kaynağı yüksek voltaj testleri yapılmıştır. Alımlar yapılmasına rağmen kurulumların uzun süreli işler olması sebebiyle 2015 yılı için uygulamada beklenen gerçekleşme oranı, 2014 yılından başlatılan imalatlar ile birlikte ele alındığında %55'tir.
2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	2012-2015	İleri Arş. Makine-Teçhizat	6.000.000	6.000.000	424.800	Proje kapsamında 2013 yılında Parçacık Hızlandırıcı (Siklotron) Sistemi ve PET/BT Sistemi alım ihalesine çıkmıştır ve söz konusu alıma ilişkin olarak 15.668.137.- TL tutarında akreditif açılmıştır. 2013 yılında yapılan ihale için 2015 yılında açılan akreditif tutarına aktarma 4.200.000,00 TL, 2015 yılında ihale edilen Micro PET sistemi alımı işi için 1.450.400,00 TL ve alınan Denetim Destek Hizmeti bedeli 424.800,00 TL tutarında olmak üzere toplam 6.075.200,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Lab.	2012-2015	İl. Araş. Mak-Teçh. İnş. (2.500 m2)	2.000.000	2.000.000	1.046.790	Proje kapsamında YEBİM inşaatı yapımı için 1.046789,85 TL tutarında harcama yapılmıştır. Proje ödeneğinin yetersiz kalması sebebi ile planlanan makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmemiştir. İnşaat işi yıllara sari olup; 2016 yılında yapımına devam edilecektir.
2015K120160	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2015-2015	İleri Arş. Mak-Teç.	9.010.000	18.852.032	19.217.527	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 19.217.526,66 TL tutarında özel hesaptan yapılan harcamalar ile toplam 549 adet proje desteklenmiştir.

*Projelerin özel hesabına 2014 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Emanet Hesapları dikkate alınmıştır.

Tablo-58 Viral Zoonozlar Tane ve İleri Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Laboratuvarı Yapılandırması	MAL (BSL-3 Lab)	İhale	İNŞEL A.Ş.	3.656.820
		Toplantı Organizasyonu (XI. Biyoteknoloji Günleri)	İhale	Bilkom	56.950
		Bilimsel Toplantı Katılımı	Avans	-	5.968
		Sarf Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	Adayuvam İnş. Taah.Dekorasyon. Gıd.	45.670
		BSC-2 Laminar Flow Kabin	İhale	SEM BİO	42.480
		Sarf Malzemesi Alımı	İhale	Adayuvam İnş. Taah.Dekorasyon. Gıd.	39.998
		Kimyasal ve Sarf Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	İnterlab Laboratuvar Ürünleri S.	9.608
		Cihaz Alımı	İhale	Gen Era Diagnostik Sağlık Hizm.	132.160
TOPLAM					3.989.655

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Tablo-59 Süperiletkenlik Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar				
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti	
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Mal Alımı	Doğrudan Temin	Netes Müh. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.	33.040	
		Hizmet/Yapım İşi	Doğrudan Temin	Ela-53 İnş. Gıda Tur. Oto. Bil. Taş ve Tem Ltd. Şti.	50.126	
		Hizmet/Yapım İşi	Doğrudan Temin	ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü	1.245	
		2 Kalem sarf malzeme alımı	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	49.383	
		2 kalem yüksek sıcaklık süperiletken tel alımı	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	49.677	
		10 Kalem Makine-teçhizat alımı	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	44.840	
		10 kalem sarf malzeme alımı	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	48.970	
		10 Kalem Makine-teçhizat alımı	Doğrudan Temin	Zenotek İthalat Pazarlama ve Ticaret/Yüksel Özkan	47.790	
		3 adet dizüstü bilgisayara alımı	Doğrudan Temin	Zemin Bilgisayar Yaz. Tan. İlet	18.644	
		37 Kalem sarf malzeme alımı	Doğrudan Temin	Biostar Ahmet Öğretmen Kimya Med.	42.770	
		1 Kalem Makine-teçhizat kül fırını alımı	Doğrudan Temin	Teknis İleri Araştırma Sis. Ve Yaz. E.	35.164	
		Proje kapsamında çalışan personel ücret ödemeleri				149.824
		Akreditif Mahsubu				112.734
		Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirme ve Kongre Katılım Giderleri				197.406
Mahkeme giderleri				3.555		
TOPLAM					885.167	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Tablo-60 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	Enjektör Hattı için Elektron Demet İletim Sistemi	İhale	Metalic Flex	64.516
		Raf Sistemi	İhale	Akın Metal	36.580
		RF Yükselteçler	İhale	Sigmaphi	1.009.524
		RF Dalga Kılavuzları (circulator&dummy load)	İhale	S.P.A Ferritte	445.319
		RF Dalga Kılavuzları	İhale	Mega RF Solution	750.000
		Pulse Former	İhale	Laurin	310.000
		Süper İletken Hızlandırıcı Modüllerin KDV Ödemesi	İhale	Research Instruments	2.350.000
		Helyum Soğutma Sisteminin Basınçlı Hava ve Elektrik Tesisatı Kurulum Hizmeti	İhale	Tamtes Elektrik San. Ve Tic. Ltd. Şti.	52.215
		Sıvı Helyum Soğutma Sistemi İçin Sıcak ve Soğuk Boru Kurulum Hizmeti	İhale	Barış Isıtma Soğutma Elektrik Tesisat Hırdavat İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.	53.454
		THM YUUP Projesi Genel Değerlendirme Çalışmayı	İhale	Bilkon Ltd.Şti.	52.805
		YUUP Projesi IMAC-VI Toplantısı	İhale	Bilkon Ltd.Şti.	36.580
		Kişisel Dozimetri Hizmetleri	İhale	Radat	10.307
		Radyasyon Güvenlik Kapısı Alt Yapı Hizmeti	İhale	Ergen İnş. Turzm.	666.700
		Radyasyon Bacası Kurulum Hizmeti	İhale	Ergen İnş. Turzm.	633.333
		Elektron Kaynağı Montaj ve Test Çalışmaları Destek Hizmeti	İhale	Ares Analitik	247.800
		İlan Bedelleri	İhale	Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşl.Müd.	4.720
		Yüksek Voltaj Güvenlik Koruması İçin Mekanik İhtiyaç Listesi	İhale	İlkan Müh.	24.426
		RF Komponent	İhale	Yıldırım Elektronik	53.100
		İnşaat Malzemeleri	İhale	Ergen İnş. Turzm.	53.631
		LLRF ve BPM Malzemeleri	İhale	Yıldırım Elektronik	81.738
Mekanik Sarf Malzemesi	İhale	Ares Analitik	23.600		
Yazılım	İhale	Sistek Elektronik	16.000		
TOPLAM				6.976.348	

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

*Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir.

Tablo-61 Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	Denetim Destek Hizmeti	Açık İhale	Cern AR-Ge Klinik Araştırmalar Med.Yön.Hiz.Bil.Tek.Elk.Yaz.Dan.Tic.L td.Şti.	424.800
		Mamul Mal Alımı (PET/BT Sistem) (Micro PET Sistemi)	Yurtdışı İsteklilere Açık İhale	S.C. Monrol Europe SRL. Açılan Akreditif	5.650.400
TOPLAM					6.075.200

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

*Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir.

Tablo-62 Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar			
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
2012K120440	Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi	YEBİM Bina İnşaatı	Açık İhale	Hellan Ofis İnş.Ltd.Şti.	1.025.790
		12'li Konsolidasyon Deney Düzeneği	Doğrudan Temin	SBR Kauçuk Ahmet Sabri Şimşek	21.000
TOPLAM					1.046.790

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

IV. ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların artırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının artması anlamına gelecektir.

Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçevede etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinliği artıracaktır.

Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet içi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve değerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Kalkınma Bakanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım - enerji gibi diğer sektörlerde de Üniversitelerin proje sunmasına imkân tanınmasının bu sektörlerde gerekli uzman personeli çağın gereklerine göre yetiştirmekle görevli üniversitelerdeki sunulan eğitimlerde etkinliği arttıracığı değerlendirilmektedir.

V. 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Tablo-63 Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		229.000		133.126			37.798		50.686					46.524
Sağlık	4		96.322		36.822			21.000		28.242					14.466
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	6		136.976		108.966			28.010		37.853					28.575
TOPLAM	18		462.298		278.914			86.808		116.781					89.565

Tablo-64 Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık	3		5.180			180			5.000			5.000			0
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	3		5.180			180			5.000			5.000			0

Tablo-65 Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: HİBE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama				2015 Yılı Program Ödenek				2015 Yılı Revize Ödenek				2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Dış	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam		
Tarım																			
Madencilik																			
İmalat																			
Enerji																			
Ulaştırma - Haberleşme																			
Turizm																			
Konut																			
Eğitim	1		411		0						411							0	
Sağlık																			
Diğer Kamu Hizmetleri																			
-İktisadi																			
-Sosyal																			
TOPLAM	1		411		0					411								0	

Tablo-66 Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: İÇMAL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama				2015 Yılı Program Ödenek				2015 Yılı Revize Ödenek				2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	
Tarım																			
Madencilik																			
İmalat																			
Enerji																			
Ulaştırma - Haberleşme																			
Turizm																			
Konut	8		229.411		133.126		38.209		51.097		46.524								
Eğitim	5		101.502		37.002		26.000		33.242		14.466								
Sağlık																			
Diğer Kamu Hizmetleri																			
-İktisadi																			
-Sosyal	6		136.976		108.966		28.010		37.853		28.575								
TOPLAM	19		467.889		279.094		92.219		122.192		89.565								

VI. 2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablo-67 Sektör Adır: Eğitim
2015 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2014 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0	155.000	99.917	16.548	+	1.550(1) 3.000(2)	14.444
408	2013H030660	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0	40.000	29.726	16.613	+	1.350(3) 1.750(3)	16.141
408	2014H040020	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	1.000	500	199			174
408	2014H040030	Tarihi Yapıların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	10.000	1.500	4.230			4.230
408	2014H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	15.000	1.483	2.450	+	650(4)	1.648
408	2015H030390	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	100	0	920	+	100(1)	764
408	2015H030400	Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR	2015	Ankara	0	0	0	0			
408		Muhtelif İşler	Taahhüt Hıbesi	2015	Ankara	0	0	0	0			411
408		Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	5.061	0	5.976	+	100(5) 114(6) 25(7) 87(8)	5.388
408	2015H030410	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	3.250	0	3.750	+	500(9)	3.735
TOPLAM								133.126	50.686			46.524

- (1) Ankara Üniversitesinin 06.10.2015 tarih ve 55514 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.
(2) Ankara Üniversitesinin 08.09.2015 tarih ve 50404 sayılı yazısı ile yapılan bütçe işlem iptali.
(3) Ankara Üniversitesinin 17.12.2015 tarih ve 70828 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.
(4) Ankara Üniversitesinin 06.10.2015 tarih ve 55482 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.
(5) Ankara Üniversitesinin 22.10.2015 tarih ve 58983 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.
(6) Ankara Üniversitesinin 11.11.2015 tarih ve 63302 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.
(7) Ankara Üniversitesinin 14.12.2015 tarih ve 69818 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.
(8) Ankara Üniversitesinin 18.12.2015 tarih ve 71307 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.
(9) Ankara Üniversitesinin 20.11.2015 tarih ve 65183 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.

Tablo-68 Sektör Adı: Sağlık
2015 Yılı 4. Dönem Sonu Yılı İç Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2014 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	20111000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirilmesi	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	10.000	0	0	100		0
408	20121000160	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	34.274	28.774	10.325	40.000	20(10) 305(11)	10.164
408		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2015	Ankara	0	4.794	0	4.794	0		
408	20131000690	Gastroenteroloji Binası İnşaatı	DÖNER SERMAYE	2015	Ankara	0	100	8.048	0	100		
408		Gastroenteroloji Binası İnşaatı	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	8.048	0	0	0		
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0	5.913	5.913	4.017	3.667	350(12)	3.924
408	20141000070	Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi (Döner Sermaye)	DÖNER SERMAYE	2015	Ankara	0	286	180	0	106		0
408	20141000080	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0	44.000	0	10.550	40.900	350(12)	128
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	0	42.000	0	0	10.550		
408		Makine ve Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	0	2.000	0	0	0		
408	20131000690	Makine ve Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	2.135	2.135	3.250	0	250(13) 3.000(14)	250
408		Makine ve Teçhizat	DÖNER SERMAYE	2015	Ankara	0	100	0	0	100		
TOPLAM								37.002	33.242	29.667		14.466
						0	101.502	37.002	33.242	29.667		14.466

(10) Ankara Üniversitesinin 22.10.2015 tarih ve 58983 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.

(11) Ankara Üniversitesinin 11.11.2015 tarih ve 63302 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.

(12) Ankara Üniversitesinin 17.12.2015 tarih ve 70835 sayılı yazısı ile yapılan aktarma işlemi.

(13) Ankara Üniversitesinin 06.11.2015 tarih ve 61372 sayılı yazısı ile yapılan likit karşılığı ekleme işlemi.

(14) Kalkınma Bakanlığının 01.10.2015 tarih ve 4024 sayılı yazısı ile yatırım hızlandırma ödeneğinden yapılan aktarma işlemi.

Tablo-69 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)
2015 Yılı 4. Dönem Sonu Yılı İçerisinde Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2014 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	71.480	61.480	0	10.000		3.008
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	12.022	12.022	0	0		
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	59.458	49.458	0	10.000		
408	2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	14.274	13.774	0	500		887
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	6.745	6.745	0	0		
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	7.529	7.029	0	500		887
408	2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Laboratuvar	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	7.065	6.565	0	500		3.990
408	2012K120430	Parçacık Hızlandırıcı Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	27.423	21.423	0	6.000		425
408	2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. ve Ar. Merk.	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	7.724	5.724	0	2.000		1.047
408	2015K120160	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2015	Ankara	0	9.010	0	18.853	+	1.600(15) 1.702(16) 1.124(17) 1.611(18) 1.624(19)	19.218
408		Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0	9.010	0	0	9.010		
TOPLAM						0	136.976	108.966	37.853	30.192		28.575

(15) Ankara Üniversitesinin 30.09.2015 tarih ve 54708 sayılı yazısı ile yapılan gelir fazlası karşılığı yapılan ekleme işlemi.

(16) Ankara Üniversitesinin 04.11.2015 tarih ve 59857 sayılı yazısı ile yapılan gelir fazlası karşılığı yapılan ekleme işlemi.

(17) Ankara Üniversitesinin 27.11.2015 tarih ve 230 numaralı bütçe işlem ile yapılan gelir fazlası karşılığı yapılan ekleme işlemi.

(18) Ankara Üniversitesinin 23.11.2015 tarih ve 65308 sayılı yazısı ile yapılan gelir fazlası karşılığı yapılan ekleme işlemi.

(19) Ankara Üniversitesinin 21.12.2015 tarih ve 71647 sayılı yazısı ile yapılan gelir fazlası karşılığı yapılan ekleme işlemi.

