



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2022





ANKARA ÜNİVERSİTESİ

**2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2022



Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ.....	7
1.GENEL DEĞERLENDİRME.....	9
1.MİSYON.....	9
2.VİZYON.....	9
3.İLKELER.....	9
4.AMAÇ VE HEDEFLER.....	10
2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	11
3.MEVcut HİZMET KAPASİTESİ.....	13
a) İnsan Kaynakları.....	13
b) Fiziksel Kaynaklar.....	16
4.2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	25
5. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	27
a) Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	28
b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	33
6. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	35
1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	35
2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	39
3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	51
7. ÖNERİLER.....	55
2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	56
2021 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU.....	60

YÖNETİCİ ÖZETİ

Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde toplam 70.464 öğrencisi, 4.318 akademik personeli, 4.254 idari personeli, 1.122 sözleşmeli ve 2.409 işçi olmak üzere toplam 12.103 personeli ile 19 fakülte, 14 enstitü, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 44 araştırma uygulama merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 2 araştırma uygulama hastanesi ve 1 dış hekimliği uygulama hastanesi ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, kültür, spor, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2021 yılı yatırımları için toplam 216.033.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 48.750.072, 00 TL ekleme işlemi ile toplam 264.783.072, 00 TL'ye çıkmıştır.

Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %76,79, bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %69,17 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo-1 2021 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)

Sektör	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Gerçekleşme	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	30.900	40.600	37.574	92,55
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	250	250	169	67,60
Kültür	26.500	26.500	20.270	76,49
Sağlık	101.000	131.950	79.840	60,51
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar	57.383	65.483	65.483	100,00
TOPLAM	216.033	264.783	203.336	76,79
TOPLAM (BAP Hariç)	158.650	199.300	137.853	69,17

Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir. BAP harcamaları özel hesaba aktarılan tutarı ifade etmektedir.

2021 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 37.573.858,91 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda kampüslerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak birçok binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, kitap alımı, bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %92,55 ile yüksek oranda bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Beden Eğitimi ve spor sektöründe ise 169.327,00 TL harcama gerçekleşmiş olup; Olimpik Yüzme Havuzu Muhtelif Tesisat Arızalarının Giderilmesi Yapım İşi ve Spor Bilimleri Fakültesi Ofis Yapım İşi kapsamında işler yapılmıştır. Beden eğitimi ve spor sektöründe gerçekleşme %67,60 oranında olmuştur.

Diğer taraftan kültür sektöründe 20.270.337,33 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda etüt proje işleri ve Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Fen Fakültesi Tescilli A ve B Bloklara Ait Restorasyon İşi ve Yazma ve Nadir Eserler Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alımlar gerçekleştirilmiştir. Kültür sektöründe %76.49 oranında bir gerçekleştirme olduğu görülmektedir.

Sağlık Sektöründe 79.839.573,46 TL kaynak kullanımı kapsamında hastane binalarımızın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, hastanelerimizin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. Dış Hekimliği Uygulama Hastanesinin inşaatı devam etmekte olup temmuz ayında tamamlanacağı öngörülmektedir. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleştirme oranı %60,51'dir. Gerçekleşmenin düşük kalmasının sebebi ise İbni Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı ve İbni Sina Hastanesi Deprem Güçlendirme Projesi kapsamındaki işlerin 2022 yılında yapılacak olması nedeniyle ödeneğinin büyük bir kısmının harcanmamış olmasıdır.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 65.483.000,00 TL ödenek bütçeden özel hesaba aktararak bilimsel araştırma projeleri desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere proje özel hesaplarına aktarılmıştır.

2021 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.MİSYON

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

- Eleştirel düşünebilen ve çözüm odaklı, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, yaratıcı ve farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi,
- Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, disiplinlerarası ve etik değerleri gözetilen araştırmalar yapmayı,
- Sosyal sorumluluk bilinci ile dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözetilen ve bulunduğu bölgenin kalkınmasına-gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı, görev edinmiştir.

2.VİZYON

Nitelikli araştırmalar yapan, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi araştırma üniversitesi olmaktır.

3.İLKELER

- Akademik özgürlüğe öncelik verme
- Etik değerlere bağlılık
- Liyakat
- Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Kültür öğelerine ve tarihine bağlılık
- Saydamlık
- Öğrenci merkezlilik
- Kaliteyi içselleştirme
- Katılımcılık
- Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı

4.AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2019-2023 dönemi stratejik planında 5 adet stratejik amaç altında 22 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir.


Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç-1. Araştırma Üniversitesi statüsünü sürdürülebilir kılmak
Hedef 1.1. Araştırma proje kaynaklarının sürekli artırılması ve çeşitlendirilmesi
Hedef 1.2. Araştırma altyapısını geliştirerek etkin kullanımının sağlanması
Hedef 1.3. İndekslerce (SCI, SCI expanded, SSCI, AHCI vb) taranan dergilerdeki öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının ve bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısının %20 oranında artırılması
Hedef 1.4. Araştırma ve lisansüstü eğitimde ülke öncelikleri de gözetilerek disiplinlerarası çalışmaların geliştirilmesi
Amaç-2. Akredite eğitim programlarını artırmak ve nitelikli mezun vermek
Hedef 2.1. Eğitim kalitesini geliştirerek; akredite eğitim programlarının sayısının artırılması
Hedef 2.2. Öğretim elemanlarının niteliğinin ve motivasyonunun artırılması
Hedef 2.3. Öğrenme ve sosyal yaşam ortamları geliştirerek öğrencilerin akademik ve bireysel gelişiminin desteklenmesi
Hedef 2.4. Uluslararasılaşma niteliğinin geliştirilmesi
Hedef 2.5. Uluslararası değişim programlarından yararlananların sayısının %25 artırılması
Amaç-3. Paydaşlarıyla işbirliği içinde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak
Hedef 3.1. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülkenin sosyal, çevresel ve ekonomik gelişiminin desteklenmesi
Hedef 3.2. Üniversitede öğretilen bilginin toplumla paylaşılması
Hedef 3.3. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkıda bulunulması
Hedef 3.4. Etkin sağlık hizmeti sunmak için, ulusal ve uluslararası akreditasyonunu sağlamış, hasta memnuniyetini öne çıkaran üçüncü basamak üst düzey merkezler kurulması ve mevcut merkezlerin niteliğinin geliştirilmesi
Amaç-4. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek
Hedef 4.1. Teknoloji Transfer Ofisi'nin sanayi ile etkileşimini üst düzeye çıkarmak
Hedef 4.2. Eğitim, ürün ve her türlü hizmetin toplum yararına sunulması
Hedef 4.3. Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasının/ürüne dönüştürülmesinin özendirilmesi/teşvik edilmesi
Hedef 4.4. Kuluçkadan yararlanan öğrenci sayısının artırılması
Amaç -5. Üniversitenin bütün yerleşkelerinde kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef 5.1. Yerleşkelerin altyapı ve fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi
Hedef 5.2. Yönetim bilgi sisteminin bütünüyle hayata geçirilmesi
Hedef 5.3. Kurumsal aidiyeti geliştirmek
Hedef 5.4. Kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi
Hedef 5.5. Yerleşkelerin ekolojik bilinçle yeniden yapılanması

2. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ankara Üniversitesi'nin 2021 Yılı Yatırım Programında toplam 18 adet proje için 218.233.000,00 TL kaynak öngörülmüştür. Diğer taraftan gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu toplam ödeneği 268.583.072,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 605.000,00 TL'si öz gelir 14.935.072,00 TL'si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 3.800.000,00 TL'si döner sermaye ve 249.243.000,00 TL'si hazine yardımı olarak finanse edilmiştir.

Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılımı

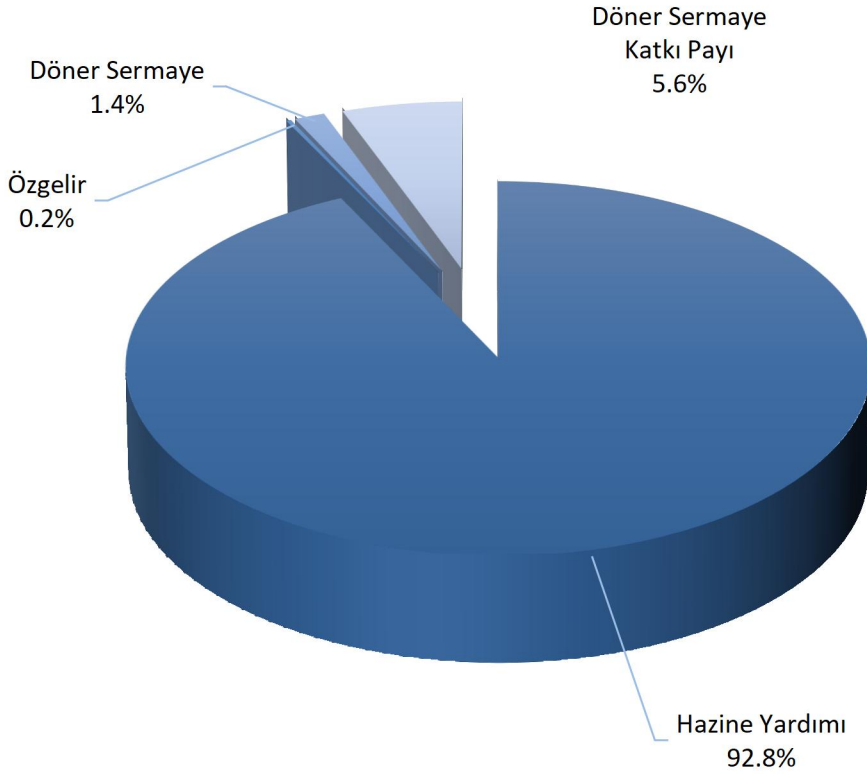

2021 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 4 adet proje için 30.900.000,00 TL kaynak ayrılmış olup 605.000,00 TL'sinin öz gelirlerle, 30.295.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kültür sektörü kapsamında ise biri etüt proje olmak üzere 3 adet projeye yer verilmiştir ve projeler için toplam 26.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sağlık Sektöründe ise 3 adet proje için toplam 103.200.000,00 TL kaynak tahsis edilmiş olup; 2.200.000,00 TL'sinin döner sermaye kaynakları ve 101.000.000 TL'sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 7 adet proje için 57.383.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; 6.835.000,00 TL'sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 50.548.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-3 2021 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)

PROJE NO	PROJE ADI	2021 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI				
			ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE	DÖNER SERMAYE KATKI PAYI	HAZİNE YARDIMI	HİBE/DIŞ ÖZKAYNAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM		218.233	605	2.200	6.835	208.593	0
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR		57.383	0	0	6.835	50.548	0
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	500				500	
2021K12-167875	Yer Bilimleri Uyg. Ve Arş. Merkezi	1.500				1.500	
2021K12-167874	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	1.700				1.700	
2016K12-2836	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	7.348				7.348	
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	35.000				35.000	
2017K12-21024	Kolorektal Kanseri İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	3.500				3.500	
2021K12-167873	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	7.835			6.835	1.000	
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM		30.900	605	0	0	30.295	0
2021H03-167885	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500				500	
2021H03-167879	Muhtelif İşler	8.900	605			8.295	0
2020H03-150547	Büyük Onarım	16.500				16.500	
2021H03-167881	Yayın Alımı	5.000				5.000	
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		250	0	0	0	250	0
2019H05-152569	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	250				250	
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR		26.500	0	0	0	26.500	0
2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	500				500	
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	25.500				25.500	
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	500				500	
SAĞLIK		103.200	0	2.200	0	101.000	0
2011I00-1432	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	20.000				20.000	
2020I00-152404	Muhtelif İşler	48.880		2.200		46.680	0
2014I00-2070	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	34.320				34.320	

3.MEVcut HİZMET KAPASİTESİ

a) İnsan Kaynakları


Ankara Üniversitesinde 2021 yılsonu itibarıyla 3.828 kadrolu akademik, 1 2547/30 madde kapsamında sözleşmeli akademik, 52 yabancı uyruklu akademik, 95 sözleşmeli öğretici, 342 Üniversitemize 2547/35 madde ile görevlendirilen akademik personel, 4.254 kadrolu idari, 1.122 sözleşmeli idari ve 2.409 (2.386'sı sürekli 23'ü geçici) işçi olmak üzere toplamda 12.103 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %35,7'si akademik, %64,3'ü idari personel ve işçiler oluşturmaktadır.

Tablo-4 2019-2021 Yılları Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2019 Yılı	2020 Yılı	2021 Yılı	2021 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Kadrolu Akademik Personel	3.717	3.685	3.828	3,9
2547/30 Md. Kapsamında Sözleşmeli Akademik Personel	2	1	1	0,0
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	68	62	52	-16,1
Sözleşmeli Öğretici Personel	119	102	95	-6,9
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2547/35)	390	370	342	-7,6
İdari Personel (Kadrolu)	4.566	4.391	4.254	-3,1
Sözleşmeli İdari Personel	621	1.093	1.122	2,7
İşçi (Sürekli+Geçici)	2.159	2.446	2.409	-1,5
Toplam	11.642	12.150	12.103	-0,4

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-2 2021 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı

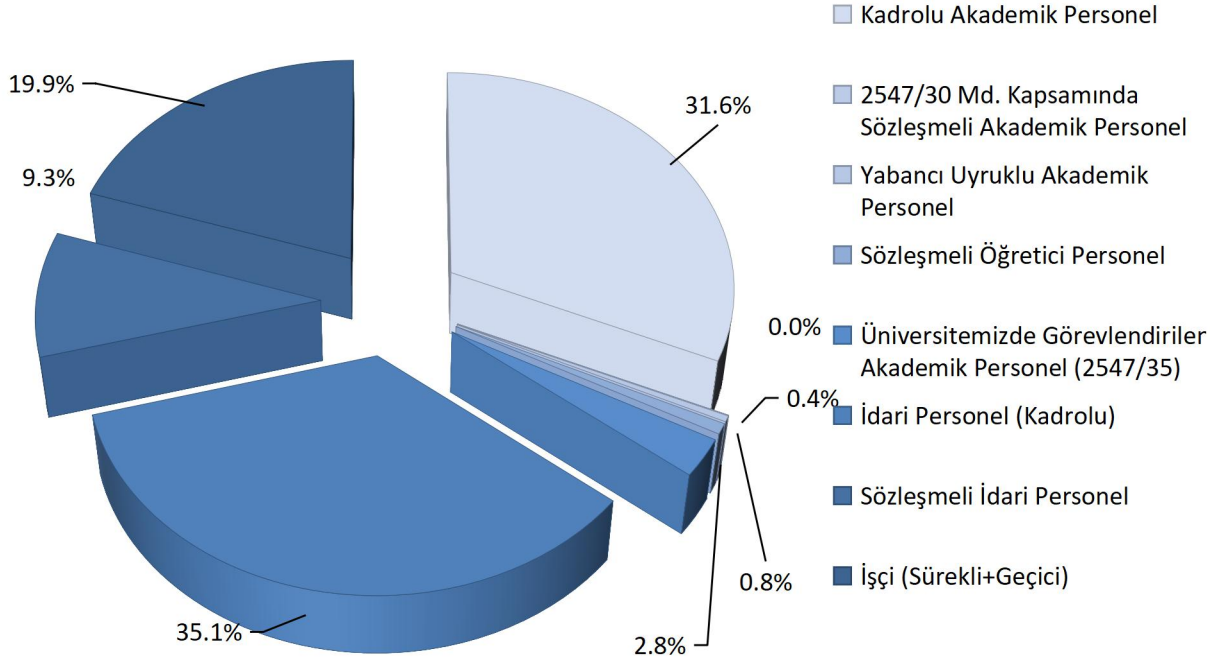

2021 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %3,9 oranında artış göstermiştir. En büyük artış %10,4 ile araştırma görevlisi kadrosunda görülmektedir. Diğer akademik personel sayıları karşılaştırıldığında profesör kadrosunda %0,5 azalış yaşanırken doçent kadrosunda %2 oranında artış yaşanmıştır.


2021 yılsonu 1.773 öğretim üyesinin, %47,8'i kadın, %52,2'si erkek, toplam akademik personelin ise %52,6'sı kadın, %47,4'ü erkek akademik personel oluşturmaktadır

Tablo-5 2019-2021 Yılları Akademik Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2019 Yılı	2020 Yılı	2021 Yılı	2021 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Profesör	1.159	1.133	1.127	-0,5
Doçent	299	352	359	2,0
Doktor Öğretim Üyesi	283	286	287	0,3
Öğretim Görevlisi	666	631	638	1,1
Araştırma Görevlisi	1.310	1.283	1.417	10,4
Toplam	3.717	3.685	3.828	3,9

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-3 2021 Yılı Akademik Personel Kadro Dağılımı




Tablo-6 2019-2021 Yılları İdari Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2019 Yılı	2020 Yılı	2021 Yılı	2021 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Genel İdari	2.041	1.986	1.930	-2,8
Teknik	465	450	444	-1,3
Sağlık	1.567	1.484	1.432	-3,5
Eğitim-Öğretim	1	1	1	0,0
Avukatlık	6	5	7	40,0
Din	1	1	0	-100,0
Yardımcı	485	463	440	-5,0
Toplam	4.566	4.390	4.254	-3,1

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-4 2021 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı



b) Fiziksel Kaynaklar

b.1) Taşınmazlar

Ankara Üniversitesi mülkiyet durumuna göre arsa/arazi alanı toplam 13.702.332,79 m² alanda hizmetlerini sürdürmekte olup, bina/tesis yerleşim alanı toplam 1.128.082,59 m² dir.

Tablo-7 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m ²)	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)
Ahlatlıbel 20. Yıl	122.908,00	16.381,34
Altındağ Konaklar	495,00	-
ANKEV	505,00	714,45
ANKÜSEV	651,00	899,58
Ayaş Meslek Yüksekokulu	6.297,00	1.279,18
Ayaş Meslek Yüksekokulu Arazisi	149.000,00	-
Bağlıca 70. Yıl Yerleşkesi	2.430.125,00	23.149,17
Beşevler 10. Yıl	216.157,00	123.042,73
Beşevler Dış Hekimliği Fakültesi / Uygulama Hastanesi	8.440,00	51.288,17
Beşevler İlahiyat Yerleşkesi	12.020,00	18.445,50
Beşevler Yeni Dış Hekimliği Fakültesi / Uygulama Hastanesi İnşası	9.025,00	-
Beypazarı (Diğer)	13.578,00	-
Beypazarı (Harmancık)	471.160,00	-
Beypazarı Abbaslar Konak	484,00	440,90
Beypazarı Meslek Yüksekokulu	15.595,00	8.658,10
Bursa Gemlik Zeytinlik	9.912,00	-
Cebeci 30. Yıl Yerleşkesi	5.010,00	2.999,79
Cebeci Tıp Yerleşkesi	118.952,00	127.789,58
Cebeci Yerleşkesi	94.539,00	79.418,77
Cevizlidere Kök Hücre Yerleşkesi	4.474,00	3.284,27
Çankaya Konut/Kongre Arsası	43.805,00	-
Demirlibahçe Hemşirelik Yerleşkesi	435,00	4.676,50
Dışkapı Yerleşkesi	100.606,00	54.769,60
Didim ÖRSEM Yerleşkesi	36.977,00	12.295,10
Elmadağ Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	6.422,00	3.607,82
Elmadağ ÖRSEM Yerleşkesi	10.838,00	673,56
Gölbaşı (Diğer)	38.164,00	-
Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi	712.923,00	130.017,65
Gölbaşı Öğrenci Yurdu	251.313,00	56.698,59
Gölbaşı ÖRSEM Yerleşkesi	45.600,00	1.864,29
Gölbaşı Teknokent	115.103,00	19.849,00
Gölbaşı Yeni Veteriner Arazisi	1.587.699,50	-
Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi	119.797,00	11.735,29
Gümüşdere Yerleşkesi	285.092,00	56.957,85

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Haymana (Gölet)	200.000,00	-
Haymana Meslek Yüksekokulu	2.234,00	3.438,80
İlgaz ÖRSEM Yerleşkesi	5.436,00	5.861,38
İstanbul TÖMER (Beyoğlu)	-	1.395,90
Kahramankazan Merkez	12.122,00	-
Kalecik Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	14.331,00	2.955,21
Kastamonu Gölemirler	1.686,00	-
Keçiören Şaraphane	-	904,90
Keçiören Teknokent	24.126,00	2.042,16
Keçiören Yerleşkesi	24.480,00	15.366,78
Kızılay TÖMER	-	2.422,90
Kızılcahamam Ayşe Bezci	17.044,00	-
Kızılcahamam Devlet Hastanesi	11.668,00	-
Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	16.728,00	645,11
Maltepe Vehbi Koç Yurdu	2.868,00	4.490,16
Maltepe Yerleşkesi	392,00	2.132,25
Manavgat ÖRSEM Yerleşkesi	21.843,00	8.047,36
Morfoloji Yerleşkesi (Sihhiye Tıp)	80.975,86	145.191,40
Nallıhan Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	2.680,00	2.139,35
Sihhiye Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yerleşkesi	18.923,51	31.385,68
Sihhiye Yüksek İhtisas Hastanesi	-	47.293,92
Urla Yerleşkesi	1.467,19	1.485,68
Veteriner Fakültesi Kazan Eğitim ve Uygulama Çiftliği Yerleşkesi	1.524.192,23	16.271,55
Ziraat Fakültesi Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu Yerleşkesi	416.144,50	2.255,33
Ziraat Fakültesi Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İstasyonu Yerleşkesi	108.952,00	2.131,83
Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yerleşkesi	3.944.692,00	18.940,66
Ziraat Fakültesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu Yerleşkesi	205.246,00	347,50
Toplam	13.702.332,79	1.128.082,59

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ankara Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Üniversite bazında toplam 65 amfide eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Toplam amfinin %95,4'ü fakültelerde, %4,6'sı Devlet Konservatuvarında bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesinde 2021 yılı itibarıyla 836 sınıfta eğitim-öğretim yapılmıştır. Toplam sınıfın %47,60'sı fakültelerde, %22,37'si yüksekokullarda, %15,79'u araştırma ve uygulama merkezlerinde, %2,40'ı Devlet Konservatuvarında, %1,31'i enstitülerde ve geri kalan %10,53'ü de uygulama merkezleri ile eğitim merkezlerinde bulunmaktadır.

Öğrencilerin uygulama yapmak amacıyla kullandığı 58 atölyenin %36,20'si fakültelerde, %24,14'ü yüksekokullarda, %5,17'si uygulama merkezlerinde ve geri kalan %34,49'u da

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

araştırma ve uygulama merkezlerinde bulunmaktadır. Ayrıca toplam 673 laboratuvarın %59,43'ü araştırma, %38,5'i eğitim, %2,07'si sağlık laboratuvarlarından oluşmaktadır.

Tablo-8 Eğitim ve Uygulama Alanları

KAPASİTE (m2)	AMFİ	SINIF	ATÖLYE	LABORATVUARLAR	TOPLAM
0-50	4	555	55	623	1.237
51-75	0	145	2	22	169
76-100	3	81	1	23	108
101-150	23	40	0	2	65
151-250	20	12	0	1	33
251-Üzeri	15	3	0	2	20
TOPLAM	65	836	58	673	1.632

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara merkezinde 4, Demirlibahçe Yerleşkesinde de 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca diğer Üniversitelerden gelen araştırma görevlileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin barınabildikleri 1 öğrenci evi olmak üzere toplam 5 öğrenci evi bulunmakta olup, bunun yanı sıra Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası ile öğrencilerimize barınma hizmeti sunulmaktadır.

Tablo-9 Öğrenci Evleri Kapasiteleri

ÖĞRENCİ EVİ	ALAN (m ²)	KAPASİTE (Kişi)
Cumhuriyet Öğrenci Evi	5.972	172
Milli Piyango Öğrenci Evi	9.543	365
Vehbi Koç Öğrenci Evi	4.698	200
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	4.439	160
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	5.144	234
Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası	1.570	47
TOPLAM	31.336	1.178

Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Milli Piyango Öğrenci Evi bünyesinde Üniversitemiz misafirlerine hizmet vermek üzere misafir odaları bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşdere Yerleşkesinde yardımcı hizmetli personelin yararlandığı 2 bina olarak, 20 daireden oluşan toplam 1.780 m² alana sahip lojman bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere toplam 45 adet yemekhane, bunun yanı sıra 59 adet kantin/kafeterya ile 3 adet restoran bulunmaktadır.

Tablo-10 Yemekhane, Kantin/Kafeteryalar ve Restoranlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	13.996,25	45	7.249
Kantin / Kafeteryalar	7.887,97	59	5.225
Restoran	828,93	3	260

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-11 Toplantı ve Konferans Salonları

KAPASİTE (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	TOPLAM
-----------------	-----------------	------------------	--------

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

0-50	160	14	174
51-75	18	4	22
76-100	4	8	12
101-150	3	5	8
151-250	1	5	6
251-Üzeri	1	13	14
TOPLAM	187	49	236

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesinde 2, Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 adet olmak üzere toplam 3 sinema salonu, Ziraat Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 1'er olmak üzere toplam 2 adet tiyatro salonu, Devlet Konservatuvarında 1 adet konser salonu, Rektörlük binasında yer alan Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinde Oyuncak Müzesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü binasında Herbaryum Müzesi ile aynı Fakültede Zooloji Müzesi, Veteriner Fakültesi (Anatomi Müzesi ile Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi) 2 adet, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi (Devrim Tarihi Müzesi), Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Jeoloji Müzesi) bünyesinde 1'er adet olmak üzere toplamda 13 adet müze bulunmaktadır.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde müzik, sinema gösterimi vb. amaçlar için 69,80 m2, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde 21,50 m2, Veteriner Fakültesinde 300 m2 ve Güzel Sanatlar Fakültesinde de 70 m2 lik çok amaçlı salon bulunmaktadır. Eczacılık Fakültesinde 1, Tıp Fakültesinde 1, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 3 el sanatları salonu bulunmaktadır. Eczacılık Fakültesi ve Elmadağ Meslek Yüksekokulunda birer, Siyasal Bilgiler Fakültesinde 5, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde de 2 olmak üzere toplam 9 müzik salonu bulunmaktadır. Hemşirelik Fakültesinde Hemşirelik ve Ebelik Tarihi ile ilgili belgeler ve dokümanlar sergilendiği bir sergi salonu Ziraat Fakültesinde de öğrencilerin kullanabileceği 64 m2 lik bilgisayar salonu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dans atölyesi, drama salonu da Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer almaktadır.

Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde Üniversite amblemi bulunan ürünlerin satışının gerçekleştiği 33 m2 lik bir satış yeri, Tandoğan Kampüsü içerisinde 51,7 m2 lik kapalı alana sahip Ziraat Fakültesi ürünlerinin satış ve sunum yeri, Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisi karşısında 18 m2 lik sürün satış ve sunum yeri ile Tıp Fakültesin Morfoloji Kampüsünde 135 m2 lik kapalı, 99,3 m2 lik açık alana sahip ürün satış ve kafe olarak kullanılan mekan bulunmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında 2 m2 lik fuaye alanı bulunmaktadır. Aşçılık kursu yeri ANKEV 2. Katta, kitap satış yeri de Hukuk Fakültesi Merkez Binasında bulunmaktadır.

İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 kuaför ve 1 erkek berberi bulunmaktadır. İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesinde 1'er market bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra Ayaş, Kalecik ve Haymana'da öğrencilerimizin kullanımına yönelik sosyal tesisler bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli fakülte, enstitü ve yüksekokullarında okuma salonları, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde de mescit bulunmaktadır.

Tablo-12 Diğer Sosyal Alanlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
----------	-------------------------------	------	-----------------

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sinema Salonu	413	3	390
Tiyatro Salonu	471	2	270
Konser Salonu	557	1	100
Müzik Salonu	813	9	484
Müze	2.910	13	-
Okuma Salonu	3.346	28	1.745
Çok Amaçlı Salon	461	4	431
Dans Atölyesi	55	1	10
Drama Salonu	67	1	30
El Sanatları Salonu	960	5	161
Sergi Salonu	59	1	-
Aşçılık Kursu Yeri	331	2	-
İç Bahçe	350	1	150
Öğrenci Sosyal Alanı	52	1	30
Bilgisayar Salonu	64	1	32
Sosyal Tesis (Ayaş,Haymana,Kalecik)	2.329	3	150
Öğrenci Kulüpleri	431	11	-
Kitap Satış Yeri	100	1	-
Ürün Satış Yeri	293	5	-
Berber	9	1	2
Kuaför	22	1	-
Market	1.192	2	-
Mescit	1.230	29	981

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine mesleki alanlarına göre araştırma ve uygulama yapma imkanı sunmaya devam etmektedir.

Tablo-13 Araştırma Uygulama Alanları

ALAN ADI	Arsa/Arazi Alanı (m2)	Kapalı Alan (m2)	ADET
Araştırma Uygulama Çiftliği	6.199.226,73	39.946,87	5
Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri	120.694,00	28.741,69	5
Kütüphane	-	20.612,92	34

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-14 Spor Alanları

Birim Adı	Kapalı Spor Tesisleri	Açık Spor Tesisleri
-----------	-----------------------	---------------------

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)
Tıp Fakültesi				Tenis Kortu	1	648
				Basketbol-Voleybol	1	480
Eczacılık Fakültesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	130			
Veteriner Fakültesi		1	62	Basketbol	1	270
Ziraat Fakültesi	Basketbol	1	880	Tenis Kortu ²	2	1.625
				Futbol	1	2.350
				Halı Saha	1	1.000
Siyasal Bilgiler Fakültesi	Basketbol-Voleybol-Hentbol vb.	1	547			
Spor Bilimleri Fakültesi	Genel Amaçlı Salon	1	2.050	Stadyum Kompleksi	1	11.009
	Güreş ve Uzakdoğu Sporları	1	206			
	Ritim Eğitimi	1	100			
	Jimnastik ve Plates Salonu	2	240	Futbol	1	620
	Okçuluk Alanı	1	150			
	Masa Tenisi	1	100			
	Atış Poligonu	1	100			
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri MYO				Voleybol	1	162
Kalecik Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	720
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	Masa Tenisi (1), Bilardo (1) ve Langirt (1) Alanı	3	138	Basketbol	1	230
				Voleybol	1	230
Beypazarı Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	375
				Voleybol	1	300
İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi	Fitness Egzersiz Salonu	1	180			
Ziraat Uygulama Merkezi				Basketbol-Voleybol	2	700
Gümüşdere Yerleşkesi				Basketbol	1	50
Tandoğan Yerleşkesi	Tenis Kortu	1	648	Tenis Kortu	5	2.486
	Fitness Egzersiz Salonu	2	250	Basketbol	2	1.607
	Yüzme Havuzu	1	3.510	Voleybol	1	275
	Spor Salonu	1	1.082	Plaj Voleybol-Hentbol	1	594
				Futbol	1	1.485
Cebeci Yerleşkesi	Cebeci Spor Salonu	1	2.045			
Dışkapı Yerleşkesi	Dışkapı Spor Salonu	1	1.250			
Keçiören Yerleşkesi	Keçiören Spor Salonu	1	400			
Gölbaşı Su Sporları Eğitim Merkezi		1	6.000			

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-15 Hastane Alanları

Alan Adı	İbn-i Sina Uyg. ve Arş. Hastanesi	Cebeci Uyg. ve Arş. Hastanesi	Diş Hekimliği Fak. ve Diş Hekimliği Uyg. Hastanesi	TOPLAM
----------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------	--------

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Acil Servis	1	1	0	2
Yoğun Bakım	8	6	0	14
Ameliyathane	1	26	2	29
Poliklinik	24	176	0	200
Klinik	22	25	16	63
Laboratuvar	6	6	16	28
Eczane	1	1	0	2
Radyoloji Alanı	1	58	6	65
Nükleer Tıp Alanı	1	16	0	17
Sterilizasyon Alanı	1	5	1	7
Mutfak	1	1	2	4
Çamaşırhane	1	0	1	2
Teknik Servis	9	1	5	15
Adli Tıp	0	1	0	1
Morg	1	0	0	1
Kan Merkezi	0	1	0	1
Kompresör Odası ve Kazan Dairesi	0	6	3	9
Hastane Müdürlüğü	1	0	0	1
Hasta Yatış	1	0	0	1
Bekleme Salonu	0	35	1	36
Hasta İletişim Birimi	0	0	1	1
TOPLAM	80	365	54	499

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-16 Hayvan Sağlığı Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Acil Servis	1	164
Ameliyathane	7	227
Klinik	18	293
Laboratuvar	1	103
Radyoloji Alanı	1	141
TOPLAM	28	928

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-17 Ambar ve Arşiv Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Ambar Alanı	8.231	98
Arşiv Alanları	8.716	167
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	28.577	628
TOPLAM	45.524	893

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

b.2) Taşınır

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Aşağıda verilen tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. 2021 yıl sonu itibarıyla, I. düzeyde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda toplam 60.507, 254 Taşıtlar grubunda toplam 521 ve 255 Demirbaşlar grubunda da 329.895 adet taşınır kayıtlıdır.

Tablo-18 2021 Yılı Sonu İtibarıyla Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayısı

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınırlar	Ölçü Birimi	2021 Yılı
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	60.507
254	Taşıtlar Grubu	Adet	521
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	329.895

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tablo-19 Taşıtlar Grubu

Taşıtların Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Toplam
Otomobiller (Binek)	18	33	51
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs)	16	0	16
Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon)	18	0	18
Hafif Ticari Araç	1	2	3
Arazi Taşıtları	2	0	2
Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler)	10	0	10
Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork)	421	0	421
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)	9	0	9
Botlar	10	0	10
Yelkenliler	7	0	7
Kanolar ve Kayıklar	9	0	9
Toplam	521	35	556

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üniversitemizin ağ altyapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahiptir. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan tüm toplanma noktalarına fiber optik kablo çekilmiş ve tüm kullanıcılara aktif ağ ucu sağlanmıştır. Üniversitemiz 7,4 Gbps hızında Metro Ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahiptir.

Tablo-20 Teknolojik Kaynaklar (2019-2021)

	2019 Yılı	2020 Yılı	2021 Yılı
Sunucular	324	334	340
Masaüstü Bilgisayar	15.172	15.483	15.102
Taşınabilir Bilgisayar	4.761	4.855	4.747
Tablet Bilgisayar	1.421	1.400	1.396
Cep Bilgisayar	240	240	232

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-21 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2019-2021)

	2019 Yılı	2020 Yılı	2021 Yılı
--	-----------	-----------	-----------

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Projeksiyon	1.973	1.933	1.891
Tepegöz	236	232	220
Barkot Okuyucu	152	202	253
Yazıcı	6.174	6.356	6.371
Baskı Makinesi	29	27	27
Fotokopi Makinesi	250	250	241
Faks	132	125	119
Fotoğraf Makinesi	390	394	396
Kameralar	2.183	2.303	2.303
Televizyonlar	2.791	2.813	2.418
Tarayıcılar	650	698	711
Müzik Setleri	421	409	393
Mikroskoplar	2.530	2.501	2.463
DVD'ler	212	197	191
Yazı Tahtası	1.459	1.440	1.441

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Birim Faaliyet Raporları

2021 yılında birimlerden ve kullanıcılardan gelen kitap talepleri ile doğrudan temin yöntemiyle 937 Türkçe, 168 yabancı olmak üzere toplam 1.105 kitap alınmış olup dağılımı Tablo 23'de gösterilmiştir.

Tablo-22 Kütüphane Kaynakları

	2021 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	1.105	839.470	840.575	784.160	839.470	1.623.630
Basılı ve Veri Tabanında Yer Alan Süreli Yayın Sayısı	0	51.999	51.999	10.850	51.999	62.849
Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı	52	61	113	52	61	113
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	0	123	123	0	123	123

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-23 Alınan Kitapların Birimler İtibari İle Dağılımı

Birimler	Alınan Kitap Sayısı
----------	---------------------

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Adalet Meslek Yüksekokulu	61
Ayaş Meslek Yüksekokulu	22
Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi	19
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi	40
Diş Hekimliği Fakültesi	85
Eczacılık Fakültesi	48
Eğitim Bilimleri Fakültesi	282
Fen Fakültesi	5
Güzel Sanatlar Fakültesi	24
Hukuk Fakültesi	26
İlahiyat Fakültesi	3
İletişim Fakültesi	1
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2
Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi	6
Sağlık Bilimleri Fakültesi	2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	40
Siyasal Bilgiler Fakültesi	256
Tıp Fakültesi	3
Veteriner Fakültesi	54
Ziraat Fakültesi	126
Toplam	1.105

Kaynak: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

4.2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo-24 Ankara Üniversitesi 2021 Yılı Yatırımları

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Sağlık	2020I00-152404	Muhtelif İşler	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında büyük onarımının yapılması ve hastanelerin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında büyük bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir ve muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları ödenekler sınırında karşılanmıştır.
Sağlık	2011I00-1432	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Büyük Bakım Onarımının Yapılması Amaçlanmıştır	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Büyük Bakım Onarımının Yapılması için kullanılmıştır.
Sağlık	2014I00-2070	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatının tamamlanması ve ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımlarının yapılması planlanmıştır.	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı devam etmektedir ve makine-teçhizat alımlarının ödenek kısıtı altında bir kısmı gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2021H03-167885	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Muhtelif Etüd Projelerin yapılması planlanmıştır.	4 adet etüd proje hizmeti alınmıştır.
Eğitim	2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Bakım Onarımının Yapılması Planlanmıştır.	Proje kapsamında sınırlı ödenekler çerçevesinde önceliklendirilerek ihtiyaç duyulan ivedi bakım onarımlar gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2021H03-167879	Muhtelif İşler	Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tablet Bilgisayar, Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazları ile Muhtelif Demirbaşların ve Makine Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2021H03-167881	Yayın Alımı	Üniversitemiz kütüphane basılı, elektronik, süreli yayın alımı ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje kapsamında mevcut ödenekleri çerçevesinde süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliği ve kitap alımları gerçekleştirilmiştir.

Tablo-25 Ankara Üniversitesi 2021 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
------------	----------	-----------	---------------------	----------------------

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Kültür	2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi kapsamında kullanılmıştır.	Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi kapsamında kullanılmıştır
Kültür	2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Acil Restorasyon ve Uygulama İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Restorasyonlarının Yapılması Planlanmıştır.	Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tescilli A ve B bloklara ait restorasyonu yapılmıştır.
Kültür	2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	Yazma Eserler Depolama Alanı Alt Yapısı – Yazma Eserler Kataloglama Denetleme İşi	Alt yapı gerçekleşti. Kataloglama devam etmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor	2019H05-15269	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	A.Ü.Olimpik Yüzme Havuzu Muhtelif Tesisat Arızalarının Giderilmesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Ofis Yapımı İşi için kullanılmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Proje ihtiyacı makine-teçhizat alımları ve personel giderlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	Ödenek kısıtı altında alımlar kısmen gerçekleştirilmiş olup; personel giderlerine yönelik ödemeler gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2021K12-167875	Yer Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi	Flouresans Özellikli Mikroskop Sistemi Konfokal Raman Spektrometresi Lazerleri Ergiyik Kapanım Sistemi Mineral Tanımlama ve Haritalama Sistemi GPR Sistemi IR-MS Sistemi.	Döviz artışı nedeniyle alımların bir kısmı gerçekleştirilebilmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2021K12-167874	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme Altyapısı	Kordon kanı çalışmalarının devam ettirilmesi, ihtiyaç duyulan makine-teçhizat ve sarf malzemelerinin alınması hedeflenmiştir.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2016K12-2836	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	Kök hücre alanında, klinik uygulamalar ve araştırma çalışmalarında eksikliği doldurmak.	Kök hücre üretimine ve araştırma alt yapı faaliyetine devam edilmektedir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	Kök hücre alanında, klinik uygulamalar ve araştırma çalışmalarında eksikliği doldurmak amaçlanmaktadır.	Devam eden inşaat işi için 9 adet hakediş ödemesi yapılmıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K12-21024	Kolorektal Kanseri İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	Kanser görüntülemesi için kullanılacak olan radyoaktif madde üretim alt yapısının kapasitesinin artırılması.	2 adet iş istasyonları ve 2 adet Pet/Mrdiz ve ayak koilleri ile araştırma ve görüntülenme hizmetleri için satın alma işlemleri tamamlanmış ancak ödeme henüz yapılmamıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2021K12-167873	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Tahsis edilen ödenek ile Üniversitemizde yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.	2021 yılında Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri için özel hesaptan harcama yapılmıştır.

5. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. 2021 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 3 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için 101.000.000,00 TL hazine yardımı ve 2.200.000,00 TL döner sermaye karşılığı olmak üzere toplam 103.200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi ihtiyacına kullanılmak üzere 15.000.000,00 TL likit karşılığı, Muhtelif İşler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Hastanelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Geçirimli Elektron Mikroskop Sisteminin (TEM) alınabilmesi için için 6.450.000,00 TL likit karşılığı ödenek kayıtları ile yine Muhtelif İşler Projesinde makine ve teçhizat alımları için Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden 9.500.000,00 TL desteklenmiştir. Sektörde Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı ve makine-teçhizat alımları, hastanelerin büyük bakım onarımları ve makine teçhizat alımları kapsamında toplam 79.839.573,46 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.

Tablo-26 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2018	74.149	98.058	60.618
2019	47.900	85.021	37.124
2020	55.711	69.606	37.481
2021	103.200	134.150	79.840

Grafik-5 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

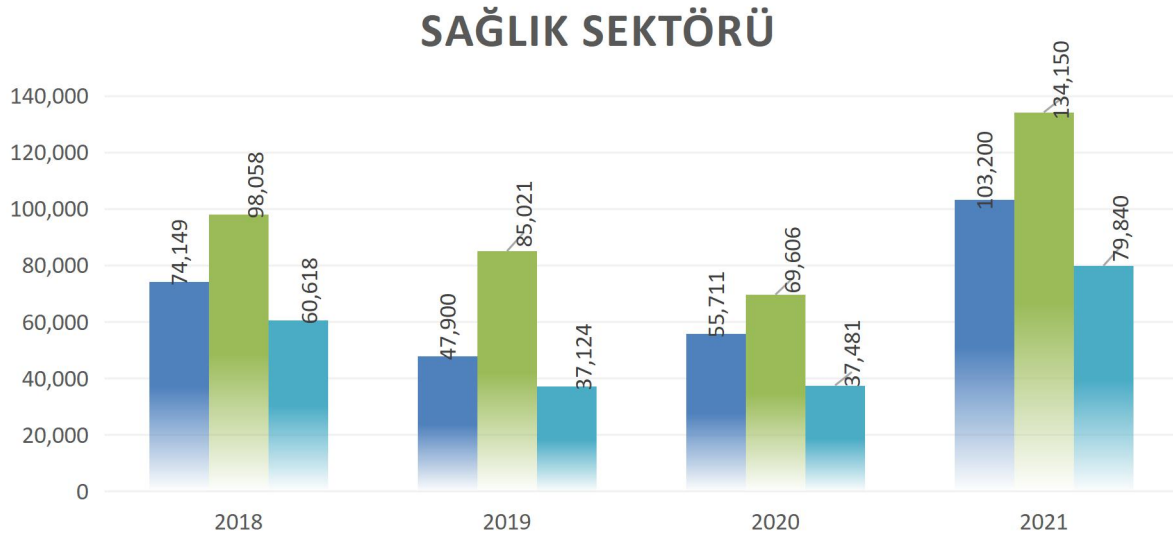

2021 yılında 3 adedi kültür sektöründe ve 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 8 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam 57.650.000,00 TL tutarında kaynak tahsis edilmiştir.

Yıl içerisinde 2.000.000,00 TL Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş, likit karşılığı ödenek kayıtları ile de 7.700.000,00 TL


2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

desteklenmiştir ve revize ödenek toplamı 67.350.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı, çeşitli restorasyon işlerinin yapıldığı görülmektedir. Diğer taraftan birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yayın alımları, bilişim malzemesi alımları ve makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.

Tablo-27 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2018	67.052	85.180	82.194
2019	44.350	56.799	54.905
2020	38.350	40.850	38.072
2021	57.650	67.350	58.014

Grafik-6 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

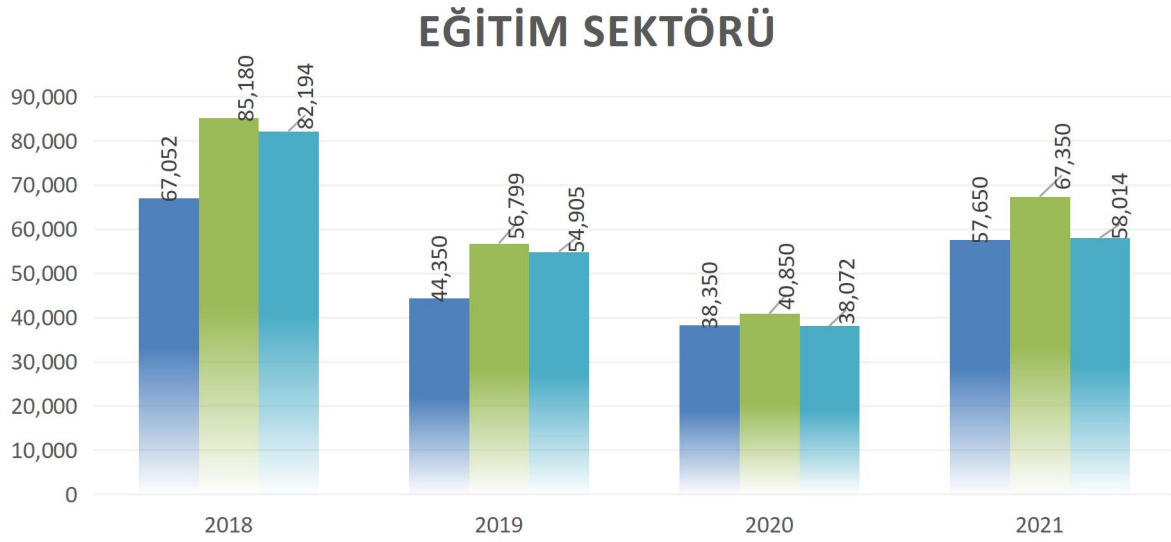


2021 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için toplam 57.383.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine gelir fazlası karşılığı olarak toplam 8.100.072,00 TL ödenek eklenmiştir.

Bilindiği üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-28 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2018	44.049	65.406	65.406
2019	28.500	42.000	42.000
2020	41.388	51.666	51.666
2021	57.383	65.483	65.483

Grafik-7 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

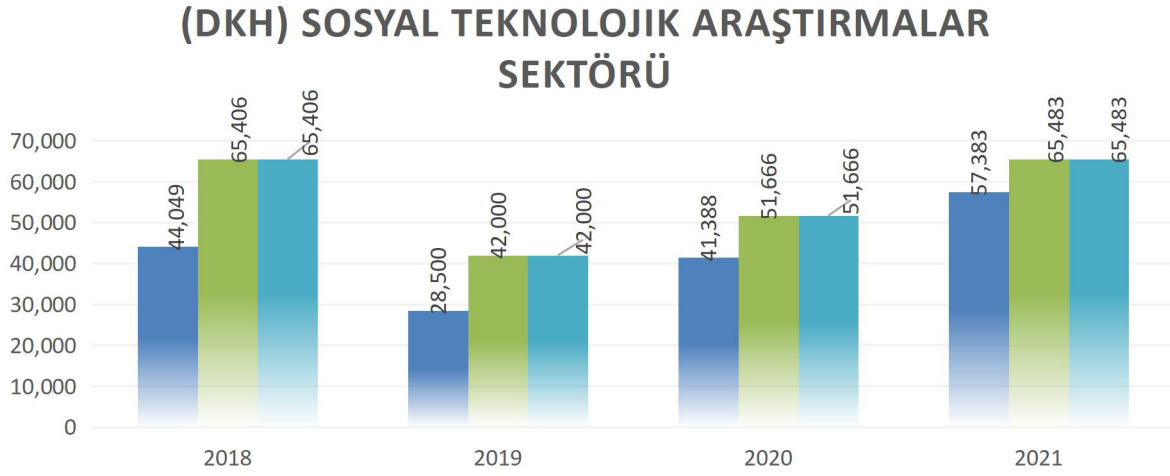

Tablo-29 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Sonu Kümülatif Harcama	2021 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2021 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	26.291	25.791	500			500	313	26.104
2021K12-167875	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk.	1.500	0	1.500			1.500	1.140	1.140
2021K12-167874	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme Altyapısı	1.700	0	1.700			1.700	1.578	1.578
2016K12-2836	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	47.125	39.777	7.348			7.348	6.181	45.958
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	156.952	54.754	35.000			35.000	34.937	89.691
2017K12-21024	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	37.331	33.831	3.500			3.500	1.847	35.678
KB Destekli Projeler Toplamı		270.899	154.153	49.548	0	0	49.548	45.996	200.149
2021K12-167873	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri*	7.835	0	7.835	8.100		15.935	20.479	20.479

(1) Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır.

(2) Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.

2021 yılı yatırım programında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe toplam 7 adet proje için 50.548.000,00 TL hazine yardımı ve 6.835.000,00 TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 57.383.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 8.100.072,00 TL ekleme işlemi ile toplam ödenek 65.483.072,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin tamamı özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 66.475.236,20 TL harcanmıştır.

Tablo-30 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 YTL)

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Sonu Kümülatif Harcama	2021 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2021 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2021H03-167879	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim)	4.450	0	4.450	3.550		8.000	7.908	7.908
2021H03-167881	Yayın Alımı	5.000	0	5.000	2.000		7.000	6.984	6.984
2021H03-167879	Muhtelif İşler (Bil.Teknoloj.)	4.450	0	4.450	1.200		5.650	5.649	5.649
2020I00-152404	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Sağlık)	15.680	1.500	14.180	15.950		30.130	21.284	22.784
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	4.500	3.000	500			500	318	3.318
2014I00-2070	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	43.350	39.030	4.320		3.850	470	465	39.495
TOPLAM		77.430	43.530	32.900	22.700	3.850	51.750	42.608	86.138

Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan 4 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 6 adet proje için 2021 yılı programında 32.900.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacıyla ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından makine-teçhizat, yayım alımı ve bilgi teknolojileri projelerinin toplam ödeneği 51.750.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 42.607.644,41 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %82,33'tür.

Tablo-31 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Sonu Kümülatif Harcama	2021 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2021 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2019H05-152569	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	250	0	250			250	169	169
2021H03-167885	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	500	0	500		50	450	375	375
2020H03-150547	Büyük Onarım	50.000	9.100	16.500	3.000		19.500	16.658	25.758
2011I00-1432	İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç.	60.000	9.000	20.000			20.000	776	9.776
2020I00-152404	Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	34.700	0	32.500	3.850		36.350	13.524	13.524
2014I00-2070	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	136.812	56.812	30.000	15.000		45.000	43.790	100.602
2014H04-2028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	4.995	3.495	500			500	370	3.865
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	41.504	16.000	25.500			25.500	19.583	35.583
TOPLAM		328.761	94.407	125.750	21.850	50	147.550	95.245	189.652

Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 5 adet, sağlık sektöründe 3 adet olmak üzere, toplam 8 adet proje için 2021 yılı programında toplam 125.750.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacıyla ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından etüt, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği 147.550.000,00 TL olmuştur. Ödeneğin 95.245.452,29 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %64,55'dir.

Tablo-32 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Açıklama	Proje Tutarı	2020 Sonu Kümülatif Harcama	2021 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2021 Yılı Harcama	Toplam Harcama
Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler*	278.734	154.153	57.383	8.100	0	65.483	66.475	220.628
Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım	328.761	94.407	125.750	21.850	50	147.550	95.245	189.652
Makine Teçhizat	67.980	43.530	23.450	19.500	3.850	39.100	29.975	73.505
Yayın Alımı	5.000	0	5.000	2.000	0	7.000	6.984	6.984
Bilgi Teknolojileri	4.450	0	4.450	1.200	0	5.650	5.649	5.649
GENEL TOPLAM	684.925	292.090	216.033	52.650	3.900	264.783	204.328	496.418

**Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır. Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.*

Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2021 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için (döner sermaye dahil) 218.233.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 264.783.072,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 65.483.072,00 TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2020 yılından devreden tutar ve 2021 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde projeler ihtiyacına toplam 29.150.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Ayrıca Bilimsel Araştırma Projeleri ihtiyacına da gelir fazlası karşılığı toplam 8.100.072,00TL ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında toplamda; 11.500.000,00 TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2021 yılı yatırım programında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından toplam 18 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 58.013.523,24 TL, sağlık sektöründeki projeler için 79.839.573,46 TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 66.475.236,20 TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 204.328.332,90 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-33 2021 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	EKLENEN					DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
		LİKİT	TAAHÜT ARTIĞI	GELİR FAZLASI	AKTARMA	YEDEK ÖDENEK			
06.1 Mamul Mal Alımları	48.763.000	9.950.000		8.100.072	207.000	11.500.000	5.448.162	73.071.910	63.931.485
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	2.130.000							2.130.000	2.130.000
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	1.890.000				2.461.132			4.351.132	4.350.751
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	65.500.000		15.000.000				50.000	80.450.000	79.165.382
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.500.000				231.000		20.000	1.711.000	1.709.254
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	95.250.000	3.000.000			3.850.000		31.000	102.069.000	51.049.296
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	1.000.000							1.000.000	1.000.000
TOPLAM	216.033.000	12.950.000	15.000.000	8.100.072	6.749.132	11.500.000	5.549.162	264.783.042	203.336.168

b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı

finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.

2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılmamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarımı Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda mali bir baskı yaratmaktadır.
6. Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır.

6. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-34 Sağlık Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2014100-2070	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	2014-2022	Hastane İnşaatı (35.758 m2), Makine-Teçhizat	34.320.000	45.470.000	43.790.200,71	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatın devam etmektedir. İnşaat için 43.790.200,71 TL harcanmıştır. Diğer taraftan proje kapsamında 465.490,60 TL ödenek hastane ihtiyacına makine-teçhizat alımları için harcanmıştır. Hastane inşaatı devam etmekte olup, 2022 temmuz ayı itibariyle hizmete hazır gelmesi planlanmaktadır.
2011100-1432	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	2011-2022	Büyük Onarım	20.000.000	20.000.000	775.850,00	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Bakım Onarımının Yapılması Planlanmıştır.
2020100-152404	Muhtelif İşler	2020-2021	Makine ve Teçhizat- Büyük Onarım	46.680.000	66.480.000	34.808.032,15	Proje kapsamında büyük bakım onarım işleri yapılmıştır. Diğer taraftan hastanelerin muhtelif makine-teçhizat ihtiyaçları proje kapsamında karşılanmıştır. Yıl içerisinde 6.450.000,00 TL likit ödenekten, 9.500.000,00 TL Cumhurbaşkanlığı Yatırım Hızlandırma Ödeneğinden ve 3.850.000,00 TL kurum içi aktarma olmak üzere toplam 66.480.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar

	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2020/00-152404	Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)	A.Ü. İbni Sina Hastanesi Kbb,Üroloji Ve Genel Cerrahi Ameliyathanelerine Ait Elektrik Ve Mekanik Proje Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	117.410
		A.Ü.Cebeci Tıp Fakültesi Yerleşkesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D Binası Yangın Söndürme Tesisatı Mekanik Tesisat Proje ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	11.800
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Mutfak Mahali Büyük Onarım (2020-2021 Yıllarına Sari) İşi	Açık İhale	8.827.086
		A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Doğalgaz Kaçaklarının Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	29.500
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İdari Blokları İnşaatı Kesin Hakedişi	Açık İhale	12.420
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Abd Binası Tadilat İşi	Açık İhale	3.076.931
		A.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum A.B.D. Ameliyathane Yapı(2019 -2020 Yıllarına Sari) İşi	Pazarlık Usulü 21/B	23.740
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Uygulama Hastanesi Pdö Binası Onarım İşi	Açık İhale	480.334
		Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Kazan Dairesi Tadilatı Ve Hematoloji Binası Cephe Onarım İşi	Pazarlık Usulü 21/B	5.199
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Çocuk Hastalıkları Abd Binası Zemin Kat Tadialt İşi	Açık İhale	410.418
		A.Ü.Morfoloji Binası Patoloji A.B.D.Alyapı Onarımı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	8.850
		A.Ü.Kalp Hastanesi Klima Santrali Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	6.372
		Cebeci Hastanesi Göz Bankası Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Tadilat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	59.000
		Adli Bilimler Enstitüsü Medikal Tüp Odası Ve Tesisat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	99.710
		A.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Soğutma Grubu Ses İzolasyonu Yapılması İşi	Doğrudan Temin	76.700
		102 Kalem İnşaat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	139.185
		6 Kalem Aydınlatma Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	139.854
		TOPLAM		

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-36 Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2014I00-2070	Dış Hekimliği Uygulama Hastanesi	1 Adet Elektro Kimyasal Aktivasyon Cihazı(Yerinde Üretilen Aktif Klor Cihazı)	Pazarlık Usulü 21/B	200.600
		1 Adet Sanayi Tipi Çamaşır Makinesi	Doğrudan Temin	41.300
		600 Adet Koruyucu Şeffaf Gözlük ve 600 Adet Siperlik	Doğrudan Temin	9.948
		10 Adet Aerosol Vakum Cihazı	Doğrudan Temin	74.340
		6 Adet Tarayıcı	Doğrudan Temin	33.418
		1 Adet Akrilik Pişirme Fırını, 1 Adet Dental Loupe ve Işık Kaynağı, 1 Adet Elektrikli Taşınabilir Led Işıklı Klinik Mikro Motoru ve 1 adet Kırmızı Kuşak Anguldurva	Doğrudan Temin	105.885
		TOPLAM		465.491

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-37 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	27 Adet Fotokopi Makinesi ve Lazer Yazıcı	DMO	199.847
		Gastroenteroloji 1 Adet Sabit Renkli Doppler USG Cihazı	DMO	355.856
		40 Lt. 150 Adet ve 22 lt. 150 Adet Atık Kovası	Doğrudan Temin	31.352
		2 Adet Yedekleme Ünitesi (DMO 72290-K1041)	DMO	586.395
		40 Adet Barkod Yazıcı (DMO 81696-K1140)	DMO	62.838
		50 Adet Hasta Karyolası (DMO 49399-K1087)	DMO	506.435
		4 Adet Hasta Karyolası (DMO 79442-K1087)	DMO	53.529
		5 Adet Ventilatör (DMO 22041-K1127)	DMO	603.170
		40 Adet Hasta Başı Monitör (DMO 13773-K1179)	DMO	469.635
		2 Adet Hasta Başı Monitör (DMO 60673-K1305)	DMO	87.266
		5 Adet Defibrilatör (DMO 13520-K1179)	DMO	325.771
		2 Adet Ultrasonografi (DMO 57668-K103)	DMO	501.693
		1 Adet EKG (DMO 38139-K2024)	DMO	24.744
		1 Adet Geçirimli Elektron Mikroskop Sistemi	Açık İhale	4.472.200
		1 Adet Sabit Renkli Doppler USG Cihazı (DMO 60674-K1305)	DMO	356.821
		1 Adet Pediatri Anjio Laboratuvarı TEE Probu (Tek Temsilci)	Doğrudan Temin	280.840
		1 Adet Kalp Damar Cerrahisi TEE Probu Tek Temsilci	Doğrudan Temin	280.840
		1 Adet Pediatri Anjio Laboratuvarı TEE Probu(Pediyatrik) Tek Temsilci	Doğrudan Temin	280.840
		1 Adet Çift Kapılı Yıkayıcı Dezenfektör Cihazı (DMO)	DMO	150.113
		1 Adet Bronkoskopi Cihazı Ped.Ameliyathanesi Tek Temsilci	Doğrudan Temin	392.040
1 Adet İleri Düzey Pediyatrik Endoskopik	Açık İhale	1.306.800		

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Görüntüleme Sistemi Ped.Gastro.		
8 Adet Tıbbi Patoloji Lisans Yenileme işi	Doğrudan Temin	442.500
1 Adet Renkli Doppler Ultrasonografi Sistemi	DMO	401.328
8 Adet Ritm Holter (Kardiyoloji)	Doğrudan Temin	124.200
1 Adet Masa Üstü Çok Amaçlı Santrifüj (Patoloji) (Doğrudan Temin)	Doğrudan Temin	21.311
2 Adet Otomatik Motorlu Bayrak Poster Sistemi (Mekanizmalı) (Doğrudan Temin)	Doğrudan Temin	138.650
1 Adet Seri Otomatik Lam Kapama Cihazı (5 kalem Tıbbi Cihaz Açık İhale)	Açık İhale	345.600
1 Adet Seri Otomatik Lam Boyama Cihazı (5 kalem Tıbbi Cihaz Açık İhale)	Açık İhale	383.400
2 Adet Basınç Destek Ventilatorü (5 kalem Tıbbi Cihaz Açık İhale)	Açık İhale	370.440
1 Adet Meibomian Termal Tedavi ve Görüntüleme Cihazı	Pazarlık İhale	286.200
1 Adet Görüntüleme Ataçmanlı Biyomikroskop	Pazarlık İhale	377.730
1 Adet Yüksek Çözünürlüklü Manometri Sistemi (HRM) Gastroenteroloji B.D. (4 Kalem Tıbbi Cihaz Açık İhale)	Açık İhale	528.908
1 Adet 4 Kanallı EMG Cihazı Ped. Nöroloji (4 Kalem Tıbbi Cihaz Açık İhale)	Açık İhale	242.881
1 Adet HD Video Endoskopi Sistemi Cihazı Gastroenteroloji B.D. (4 Kalem Tıbbi Cihaz Açık İhale)	Açık İhale	1.612.980
1 Adet Etilen Oksit Gaz Sterilizatörü İbni Sina Hastanesi (5 kalem Tıbbi Cihaz Açık İhale)	Açık İhale	1.004.400
1 Adet Stimilatör	Doğrudan Temin	57.820
4 Kalem Cihaz Alımı Cebeci Hastanesi Solunum Fonksiyon Test Cihazı, Jinekolojik/ Obstertrik Muayene Masası, Sabit Renkli Doppler, CPR destekli Monitörlü Defibrilatör)	DMO	830.039
12 Kalem Malzeme Alımı İbni Sina Hastanesi (Yastık Kılıfı, Nevresim Takım, Pike, Yastık Koruyucu Alez, Yatak Koruyucu Alez,,Battaniye, Sedye, Serum Askısı Pansuman Arabası, Buzdolabı ,Radyant Isıtıcı) Açık Yatak, Transrport Kuvöz	DMO	405.534
15 Kalem Malzeme Alımı(Damar Saptayıcı, Aşı Saklama Dolabı Hasta Bakım Yatağı Klima, Refakatçi Koltuğu, EKG Cihazı, Tesom,Hasta Başı Monitör, Soyunma Dolabı, Tekli Koltuk, Çalışma Koltuğu, Defibrilatör, Büro Tipi Buzdolabı, Atık Kovası)	DMO	675.683
70 Adet Masa Üstü Bilgisayar	DMO	791.583
57 Adet Masa Üstü Bilgisayar	DMO	784.483
1000 Adet Yastık	Doğrudan Temin	56.700
10 Kalem Ofis Mobilyaları	DMO	72.128
TOPLAM		21.283.523

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-38 Eğitim Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİS TİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2019H05-152569	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	2019-2021	Bakım Onarım	250.000	250.000	169.327	A.Ü.Olimpik Yüzme Havuzu muhtelif tesisat arızalarının giderilmesi ve spor bilimleri fakültesi ofis yapımı için kullanılmıştır.
2021H03-167885	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2021-2021	Etüd Proje	500.000	450.000	375.181	4 adet etüd proje hizmeti alınmıştır
2020H03-150547	Büyük Onarım	2020-2023	Büyük Onarım	16.500.000	19.500.000	16.658.099	Proje kapsamında birçok binanın bakım onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Projeye yıl içerisinde ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ödenek ekleme işlemleri ile desteklenmiş olup toplam 16.658.098,86 TL tutarında harcama yapılmıştır. %85,4 oranında harcama gerçekleşmesi olmuştur.
2021H03-167881	Yayın Alımı	2021-2021	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	5.000.000	7.000.000	6.984.120	Proje ödeneği süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliğinde ve kitap alımında kullanılmıştır.
2021H03-167879	Muhtelif İşler	2021-2021	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	8.900.000	13.650.000	13.556.459	Proje kapsamında muhtelif birimlerin ihtiyacına makine-teçhizat alımları, tefriş ve bilişim teknolojileri alımları gerçekleştirilmiştir. Ödeneğin 7.907.693,60 TL'si muhtelif makine-teçhizat alımları ve tefriş alımlarında, 5.648.765,25TL'si ise bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır.
2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2014-2023	Etüd Proje	500.000	500.000	369.750	Proje ödeneği etüd projeleri kapsamında kullanılmıştır.
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2014-2021	Restorasyon	25.500.000	25.500.000	19.582.536	Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Fen Fakültesi Tescilli A Ve B Bloklara Ait Restorasyon İşi kapsamında kullanılmıştır.
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	2018-2022	Bakım onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri	500.000	500.000	318.051	Kataloglama işi devam etmekte ve toplam 318.051,35 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo-39 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2019H05-152569	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	A.ü.Olimpik Yüzme Havuzu Muhtelif Tesisat Arızalarının Giderilmesi Yapım İşi	Doğrudan Temin	30.500
		A.Ü.Spor Bilimleri Fakültesi Ofis Yapım İşi	Doğrudan Temin	138.827
TOPLAM				169.327

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-40 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2019H05-152569	-
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	-
Proje Amacı	A.Ü.Olimpik Yüzme Havuzu Muhtelif Tesisat Arızalarının Giderilmesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Ofis Yapımı İçin Kullanılmıştır.	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Makine-teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2021	-
Proje Tutarı (maliyeti)	250(Hazine Yardımı)	-
Yapılan Harcama		169

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-41 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2021H03-167885	-
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Etüd Proje Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Etüd-Proje	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021	-
Proje Tutarı (maliyeti)	500 (Hazine Yardımı)	450
Yapılan Harcama		375

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-42 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2021H03-167885	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi 7372 Ada,3 Parsel İle 7374 Ada 3 Parşele İlişkin Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	58.941
		A.Ü.Veteriner Fakültesi Çiftliği Kurulmasına İlişkin Anakara İli Gölbaşı İlçesi, Balıkpınar Mahallesi, Hacılar Mahallesi, Yavrucuk Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alana Ait İmar Planına Esas Jeolojik Etüd Raporunun Hazırlanması İşİ	Doğrudan Temin	94.400
		Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Elektrik ve Mekanik Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşİ	Doğrudan Temin	82.600
		Bağlıca Kök Hücre Merkezi Bsl2, Bsl3 Ve Gmp Laboratuvarları Projesi Hazırlanması İşİ	Doğrudan Temin	139.240
TOPLAM				375.181

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-43 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	2021/328187 İKN. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Isı Merkezi Tadilat İşi	Açık İhale	3.216.997
		Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Tadilat İşi	Açık İhale	586.086
		Dışkapı Yerleşkesi Ve Morfoloji Yerleşkesi Çevre Duvarı Tadilatı İşi	Açık İhale	360.414
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Mahallerde Kullanılacak Elektrik Tesisat Malzeme Alımı	Pazarlık Usulü	419.426
		Ankara Üniversitesi Ilgaz Örsem Tesisi Kazan Dairesi Tadilatı İşi	Açık İhale	1.370.253
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Laboratuvarı Onarım İşi	Açık İhale	1.786.067
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere İnşaat Elektrik Ve Mekanik Tesisat Malzemesi Alım İşi	Pazarlık Usulü	432.118
		Eğitim Bilimleri Fakültesi Cephe Eğitim Onarımı Ve Pdr Bölümü Tadilatı Yapılması İşi Kesin Hakedişi	Açık İhale	3.409
		Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yağmur Suyu Giderleri Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	34.810
		Ziraat Fakültesi Merkez Kazan Dairesi Çek Valf Değişimi Yapılması İşi	Doğrudan Temin	5.487
		Ziraat fakültesi trafo değişimine bağlı elektrik panolarının yenilenmesi işi	Doğrudan Temin	11.210
		Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu Çatı Onarımı Ve Orta Bahçe Düzenlenmesi İşi	Doğrudan Temin	106.200
		2021 Yılı Muhtelif Binaların Yangın Sistemlerinin Bakım Onarımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	34.220
		10.Yıl Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Ofis Kart Okuyucu Sistem Yapılması İşi	Doğrudan Temin	3.894
		Cebeci Yerleşkesi Muhtelif Binalar Çatı Cephe ve Çeşitli Tadilatlar Yapılması İşi	Doğrudan Temin	124.726
		2021 Yılı Muhtelif Asansörlerin Bakım Onarımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	65.419
		2021 Yılı Muhtelif Jeneratörlerin Bakımında Tespit Edilen Arızaların Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	8.496
		50.Yıl Yerleşkesi Orta Gerilim Aboneliğine Bağlı 2 Adet (1600+800 Kva) Trafo ve 3 Adet (1600,1000,800 Kva) Trafo Kompanzasyon Panosunun 2021 Yılı Bakım Onarımlarının Yapılması İçin Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	14.927
		2021 Yılı Ankara Üniversitesi Muhtelif Jeneratörlerin Bakım Onarımının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	42.952
		Fen Fakültesi 32 (otuziki) Kalem Boya Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	134.777
		10.Yıl Yerleşkesi Muhtelif Binalara İdare Malı Boya Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	138.532
		50.Yıl Gölbaşı Yerleşkesi 2021 Yılı Muhtelif Asansörlerinin Periyodik Kontrol Rapor Eksikliklerinin Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	43.129
		10.Yıl Yerleşkesi Fen Fakültesi Ve İletişim Araştırmaları Ve Uygulama Merkezi (İlaum) Binalarında Tadilat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	137.352
		Deniz Hukuku Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tadilat Yapılması İş	Doğrudan Temin	139.240
		Ziraat Fakültesi Fermantasyon Binası Mantar Üretim Alanı Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	136.880
		Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Tadilat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	139.830
		Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Yerleşkesi Çocuk Gündüz Bakım Evi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Uluslararası Birim Ve 1.Osb Meslek Yüksekokulu Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşi	Doğrudan Temin	122.720
		93 Kalem Malzeme Alımı	Doğrudan Temin	117.428
		Ziraat Fakültesi Moleküler Bitki Patoloji Laboratuvarı Tezgah Yapım İşi	Doğrudan Temin	139.240
		Ziraat Fakültesi Kalecik Bağcılık Araştırma Ve Uygulama İstasyonu Ana Pano Ve Kompanzasyon Panosu Yenileme İşi	Doğrudan Temin	59.000
		Ankara Üniversitesine Devredilen Eski Kızılcahamam Devlet Hastanesi Etrafındaki Korkulukların Tamiri Yenilenmesi ve Üzerine Jiletli Tel Yapılması İşi	Doğrudan Temin	61.065
		A.Ü.ORD.PROF.DR.ŞEVKET AZİZ KANSU Binası 8.Kat Tadilat	Doğrudan Temin	85.550

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yapılması İşi		
Spor Bilimleri Fakültesi, Enerji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği Binaları Ve Muhtelif Mahallerde Tesisat Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	137.470
50.Yıl Yerleşkesi I-M-L-H-J Blokları Arası Ve Enerji Mühendisliği Önünde Andezit Taş Kaplamaların Tamiri Yenilenmesi İle 10.Yıl Yerleşkesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alaturka Wc Dönüşüm İşi	Doğrudan Temin	138.650
Milli Piyango Yurdu, Resim Odaları Oluşturulması ve Dans Salonu Laminant Parke Yapım İşi	Doğrudan Temin	138.414
Eczacılık Fakültesi Sınıflarına Pvc Döşeme Kaplama Yapılması, Boya İmalatları Yapılması, Wc Ve Laboratuvarda Fayans Tamirleri Yapılması İşi	Doğrudan Temin	139.240
A.Ü.Milli Piyango Yurdu, Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası,Gıda Mühendisliği Binası Ve Muhtelif Mahallerde Tesisat Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	139.240
Cebeci Yerleşkesi Açık Olan Oturma Grupları ve Kamelyaların Bakım Ve Onarımları İle Üniversitemiz Birimlerinin Taleplerini Karşlamak Üzere 95 Kalem İnşaat Ve Tesisat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	139.621
50.Yıl Yerleşkesi Beyas Binası Dış Cephe Ahşap Kaplaması Verniklenmesi Çatı Tadilatı Yapılması, Andezit Kaplamaların Tamiri ve Cebeci Yerleşkesinde Mutfak Dolabı Ve Alüminyum Kapı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	138.886
Dijital Eğitim İçeriği Geliştirme Stüdyosu Yapım İşi	Doğrudan Temin	135.700
50.Yıl Yerleşkesi Enerji Mühendisliği Bölümü Doğalgaz Tesisatı Revizyonu Yapılması İşi	Doğrudan Temin	23.600
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Yurdu Islak Hacim Tadilatları Ve Boya Yapılması İşi	Doğrudan Temin	135.700
Ankara Üniversitesi Video İçerik Üretim Ve Yayın Stüdyosu Dekor Uygulaması Yapılması İşi	Doğrudan Temin	124.549
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Yurdu Ve Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu Muhtelif Tadilatlar Yapım İşi	Doğrudan Temin	137.175
Gama M.Y.O Çatı Tadilatı Ve Wc Yapım İşi	Doğrudan Temin	138.001
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü İle Dış Hekimliği Fakültesi Yemekhane Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	113.162
Dışkapı Yerleşkesi Giriş Nizamiyelerine Fiber Altyapı Oluşturulması İşi	Doğrudan Temin	135.700
ORD.PROF.DR ŞEVKET AZİZ KANSU Binası B Blok Asansörlerinin Arızalarının Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	22.420
Personel ve Öğrenci Yemekhanelerinin İdare Malı Boya İle Boya Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	137.293
101 Kalem Elektrik İnşaat Ve Tesisat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	137.792
A.Ü.Gümüşdere Yerleşkesi Kullanma Suyu Tesisatı Tadilatı, Ziraat Fak.Mevcut Bahçe Sulama Sistemi Havalandırma, Hukuk Fak.Kütüphane Temiz Su Tesisatı Değişimi, Eczacılık Ve Kalp Merkezi Muhtelif Tesisat Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	139.240
İletişim Fakültesi Mutfak Tadilatı Enerji Mühendisliği Cephe Ve Çevre Tadilatı Yrd.Doç.Dr.Zekariya Müyesseroğlu Teleskopu Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	136.644
SAYFA TOPLAMI		12.570.351

Tablo-43 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI				12.570.351
2020H03-	Büyük	A.Ü.Kök Hücre Enstitüsü Tadilatları İle Eğitim Bilimleri	Doğrudan	138.178

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

150547	Onarım Projesi	Fakültesi Yalıtım Ve Boya İmalatları Yapılması İşi	Temin	
		Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Sanat Merkezi Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	125.080
		Gümüşdere Yerleşkesi Personel Lojmanları Dış Cephe Ve Merdiven Boşlukları Tadilatı İle Toprak Bölümü A Ve B Blok Yağmur İniş Boruları Tadilatı	Doğrudan Temin	127.145
		Yabancı Diller Y.O., Spor Bilimleri Fakültesi, İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Gama M.Y.O., Siyasal Bilgiler Fakültesi İle Rektörlüğe Bağlı Muhtelif Birimlerde Data Hattı Yapım İşi	Doğrudan Temin	137.706
		Tıp Fakültesi Dekanlığı Patoloji A.B.D.Otomatik Kayar Kapı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	28.910
		Muhtelif Jeneratörlerin Ağır Bakımlarının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	93.102
		10.Yıl Cebeci Ahlatıbel 50.Yıl Ziraat Fakültesi Yerleşkeleri Ve Muhtelif Mahallerde Pis Temiz Su Tesisatı Kanalizasyon Hattı Yağmur Suyu Hattı Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	135.700
		Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesi Otomatik Demir Kapı Ve Korkuluk Yapılması İşi	Doğrudan Temin	80.240
		62 Kalem İnşaat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	139.249
		Ankev Binasının Tömer Ek Binası Olarak Düzenlenmesi İşi	Doğrudan Temin	136.998
		Vehbi Koç Öğrencievi Tesisat Değişim Ve Tadilat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	82.600
		Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Giriş Holü Düşen Mermer Kaplamaların Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	79.650
		Tömer Ve Bakım Onarım Biriminin İhtiyacı Olan 100 Kalem İnşaat, Tesisat Ve Elektrik Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	138.007
		Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Spor Ve Sauna Salonu Tadilatları, Cebeci Yerleşkesi Spor Salonu İle Çatı Tadilatları Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Giriş Nizamiye Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	130.154
		Ankara Üniversitesi 50.Yıl Yerleşkesi 10.Yıl Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ve Muhtelif Mahallerde Tesisat Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	135.700
		Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Yurdu Kazan Dairesi Tesisatı Ve Pompaların Tadilatları İle Şevket Aziz Kansu Binası Kazan Dairesi Tesisatı Ve Pompalarının Tadilatı Ve Bakımlarının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	89.444
		İlahiyat Fakültesi B Blok Boya Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	137.824
		Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Öğrenci Yemekhaneleri Ve Muhtelif Mahallerde Doğalgaz Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	139.240
		Hemşirelik Fakültesi, Ataum Binası, Mühendislik Fakültesi, Astronomi Ve Uzay Bilimleri Bölümü, Fen Fakültesi Binalarında Altyapı Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	138.007
		Ankara Üniversitesi Milli Piyango Kız Yurdu Yangın Tesisatı Ve Muhtelif Binaların Elektrik Arızalarının Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	51.283
		Ziraat Fakültesi Dekanlık Jeneratörünün Arızasının Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	139.830
SAYFA TOPLAMI			2.404.047	

Tablo-43 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)

Tablo-43 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI			14.974.398	

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	76 Kalem İnşaat Malzemesi Alımı	Doğrudan Temin	139.261
		A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Cephe Onarımı Ve Pdr Bölümü Tadilatı Yapılması İşi	Açık İhale Usulü	3.409
		Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi Marangozhanaesi Üretim Aletlerinin Bakım Ve Onarımı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	30.774
		Adalet M.Y.O. Rektörlük Ana Bina, Devlet Konservatuarı İle Dışkapı Yerleşkesi ve 10.Yıl Yerleşkesi Muhtelif Binalarda Data Hattı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	135.464
		Patoloji Laboratuvarı Havalandırma Tesisatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	100.300
		Ankara Üniversitesi Başhekimlik Ek Bina Çatı Ve Wc Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	70.800
		Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Y.O., Kök Hücre Enstitüsü, Konservatuar, Ataum Binaları Çatı Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	94.400
		Ankara Üniversitesi Uluslararası Merkez Binası Dış Cephe Onarımı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	53.110
		Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Biyomedikal Mühendisliği Binası 60 Kva Lık Kesintisiz Güç Kaynağının Akülerinin Temini Ve Montajı İşi	Doğrudan Temin	38.350
		Ankara Üniversitesi Gümüşdere Yerleşkesi, Fen Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi Öğrenci Ve Personel Yemekhaneleri İle Cebeci Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi Atık Su Tesisatı Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	132.750
		Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yemekhanesi Isıtma Sistemi, Ziraat Ve Veteriner Fakültesi Brülör Tamirleri İle 10.Yıl Yerleşkesi Çatı Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	112.100
		Ankara Üniversitesi Anküsev Binasının İdare Malı Malzeme İle Ankara Forum Binasına Dönüştürülmesi Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	137.175
		Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Havalandırma Tesisatı Validasyon Ölçümü Ve Gerekli Tesisat Revizyonlarının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	129.800
		Ankara Üniversitesi Uygulama Bilimler Fakültesi Sundurma Yapılması İşi	Doğrudan Temin	106.200
		Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Kontrol Binası Pis Su Tesisatı Yenilenmesi İşi	Doğrudan Temin	137.942
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi Giriş Köprüsü Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	139.004
		Ankara Üniversitesi 10.Yıl Yerleşkesi Merkez Kantin Kalorifer Besleme Hattı Yenilenmesi Gıda Mühendisliği Duvar Tipi Kazan Yenileme Ve Tamiri İle Radyofizyoloji Binası Isıtma Tesisatı Yenileme İşi	Doğrudan Temin	122.872
		TOPLAM		

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-44 Yayın Alımı Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2021H03-167881	-
Proje Adı	Yayın Alımı	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021	-
Proje Tutarı (maliyeti)	7.000 (Hazine Yardımı)	
Yapılan Harcama		6.984

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-45 Yayım Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları

Proje No	Proje Adı	Alım Usulü	Alımı Yapılan Mallar	Alımın Toplam Maliyeti
2021H03-167881	Yayın Alımı	4734 Sayılı Kanunun 22/a maddesi	Sürelili Yayın Aboneliği Veri Tabanı Aboneliği Kitap Alımı Bilişim Malzemesi Alımları	6.984.120
TOPLAM				6.984.120

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-46 Yazma ve Nadir Eserler Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
		MAL ALIMI	Doğrudan Temin	318.051
TOPLAM				318.051

Kaynak: Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

Tablo-47 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2021H03-167879	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021	-
Proje Tutarı (maliyeti)	8.295 (Hazine Yardımı) 605 (Öz Gelir)	13.045(Hazine Yardımı) 605 (Öz Gelir)
Yapılan Harcama		13.556

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-48 Muhtelif İşler Projesi (Bilgi Teknolojileri) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2020H03-	MUHTELİF	23 adet 6 tip Switch Anahtarlama Cihazı	DMO	428.654

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

150511	İŞLER (Bilgi Teknolojileri)	134 Adet 3 Tip Erişim Noktası Cihazı	DMO	840.847
		79 Adet 4 Tip Erişim Noktası Cihazı	DMO	828.255
		1 Adet Dizüstü 1 Adet Tablet Bilgisayar	Doğrudan Temin	33.335
		1 Adet Süreç Yönetimi Otomasyon Yazılımı	Açık İhale	1.200.000
		1 Paket Microsoft İşletim Sistemi lisans güncelleme	Açık İhale	380.904
		1 Paket Sanallaştırma yazılım güncelleme	Açık İhale	115.050
		1 Ad Uç Kullanıcı Güvenliği Yazılımı Lisans Y.	Açık İhale	188.800
		1 Ad F5 (Yük Dengeleme Cihazı Lisansı)	Açık İhale	232.460
		1 Ad Güvenli Dns ve Dhcp Sistemi Lisansı	Açık İhale	199.078
		1 ad Aruba Ağ Yönetim Yazılımı	DMO	255.767
		1 Ad PALO_ALTO PA3250-LIC-URL-3YR	DMO	151.458
		1 Pk Oracle Lisans Yenileme	Doğrudan Temin	53.100
		1 Ad RedHat Lisans Yenileme	Doğrudan Temin	28.704
		1 Adet Netspaker Lisans Yenileme	Doğrudan Temin	37.760
		1 Ad Zafiyet Tarama Yazılımı (bizzy)	Doğrudan Temin	141.600
		1 Adet Jira Lisans Yenileme	Doğrudan Temin	33.571
		1 Yıllık İnternet Yedekleme Alımı	Doğrudan Temin	141.312
		1 Yıllık UPS Cihazları Bakımı	Doğrudan Temin	31.860
		1 Yıllık İklimlendirme Sistemi Bakımı	Doğrudan Temin	30.656
		TOPLAM		

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-49 Muhtelif İşler Projesi (Makine Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2020H03-150511	MUHTELİF İŞLER	IR Dome Kamera 4 kanal Kayıt Cihazı Kamera	22/D	25.091

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

(Makine-Teçhizat)	Ups Güç Kaynağı 8 Kanal Kayıt Cihazı 16 Kanal Kayıt Cihazı Çiftli Yaka Mikrofonu Sabit Telefon Telsiz Telefon Çekim Kamerası		
	IR Dome Kamera IR Bullet Kamera 16 Kanal Kayıt Cihazı Fotoğraf Makinası Ekranlı Masa Üstü Sabit Telefon	22/D	25.159
	Gazlı Fonksiyonlu Fırın Gazlı Kaynatma Kazanı	Pazarlık Usulü	198.240
	Bulaşık Makinası Giyotin Tip Bulaşık Makinası Sıcak Yemek Tevzi Bankosu Bulaşok Toplama Arabası (4 adet)	22/D	129.800
	Klima Mikro Dalga Mini Fırın Süpürge Buzdolabı Endüstriyel Süpürge Isıtrıcı Kahve Makinası Endüstriyel Süpürge	22/D	125.906
	Tablet Tablet Standı Tuvalet Kağıdı Oda Parfümü Genel Temizlik Maddesi Çamaşır Suyu Havlu Kağıdı Fotoselli Makine Havlusu	22/D	27.873
TOPLAM			532.069

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2021H03-167879	MUHTELİF İŞLER (Makine	1 Adet Çeker Ocak 1 Adet Ön Modül Üç Kişilik Amfi Sırası 9 Adet Orta Modül Üç Kişilik	DMO	176.024

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Teçhizat)	Amfi Sırası 1 Adet Arka Modül Üç Kişilik Amfi Sırası 19 Adet Ön Modül Çift Kişilik Amfi Sırası 105 Adet Orta Modül Çift Kişilik Amfi Sırası 19 Adet Arka Modül Çift Kişilik Amfi Sırası 7 Adet İkili Masa Takımı		
	15 Adet Isıtıcıli Manyetik Karıştırıcı	Doğrudan Temin	100.000
	21 k 5 Adet Compact Arşiv Dolabı 1 Adet Lazer Yazıcı (36188-K1020) alem malzeme	DMO	49.341
	8 Kalem Ses ve Görüntü Ekipmanları 2 Adet Derin Dondurucu Bakımı 1 Adet Akü (48 V 625 AH S/125 980*625*632 Traksiyoner Tip) 1 Adet HSM Cihazı 1 Adet Karel IPG 1000 Model Santral 1 Adet 16 Kanal H 265 NVR Kayıt Cihazı 9 Adet Ip Starlight Bullet Kamera 1 Adet 16 Port Poe Switch 1 Adet 6 TB 7/24 Harddisk 20 Adet Tezgah Masası 1 Adet Kollu Bariyer(4 metre) 2 Adet Alarm Sistemi 1 Adet 60 lık Çanak Anten 1 Adet LNB Cihazı 8 Adet Ip Starlight Bullet Kamera 1 Adet Alarm Sistemi 1 Adet 16 Kanal H 265 NVR Kayıt Cihazı 1 Adet 9 Port Poe Switch 1 Adet 6 TB 7/24 Harddisk 1 Adet 220V/24V AC Trafo 1 Adet 40" Led Televizyon	Doğrudan Temin	596.985
	1 Adet Ses ve Görüntü Sistemi Ekipmanları 1 Adet Buhar Türbini Eğitim Set 1 Adet Dalga Enerjisi Eğitim Seti 1 Adet Yeşil Perdeli Stüdyo Çekim Ekipmanları	Pazarlık Usulü	1.243.720
	10 Adet Püskürtmeli Dezenfektan Alımı 24 Kalem Malzeme (Taşınabilir Harddisk, USB Kablo, Mikrodata Kablosu, Balık Sırtın Kablo Kanalı, Şarj Edilebilir Kalem Pil, Webcam, Tripod (30 Adet İlahiyat Fakültesi ve 9 Adet Uygulamalı Bilimler Fakültesi), Kulaklık)	Doğrudan Temin	149.048
	8 Kalem (Sıra, Çalışma Koltuğu, Anfi Sırası ve Sehpa) 1 Adet	DMO	341.768

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	<p>Telefon Santrali 7 Adet Lazer Yazıcı (63736-K1020)(2 Adeti Eczacılık) 4 Adet Lazer Yazıcı (82981-K1414)</p>		
	<p>2 Adet Ups Cihazı 1 Adet İHA (Drone Kamera) 1 Adet Klima (15 m2 alanın soğutulması için) 1 Set (12 Adet) Kompakt Arşiv Sistemi 4 Adet Çim Bıçme Makinası, 3 Adet Sırtta Çim Bıçme Makinası ve 1 Adet Budama Makinası Kamera ve Tripod ,Harddisk ve Çizim Tableti 10 Adet Ulv 310 Adet Masa Telefonu-Telsiz Alımı</p>	Doğrudan Temin	432.544
	<p>1 Adet Yol Süpürme Aracı Tamiri 5 Adet Basın Halkla İlişkiler Biriminin Fotoğraf Makinası ve Ekipmanları 18 Kalem Rektörlük Güvenlik Kamerası 2 Adet 2 TB Taşınabilir Harddisk 10 Kalem Malzeme (Elektrik Süpürgesi, Çelik Tabanlı Halı, Çay Makinesi, Bulaşık Makinesi)(Hemşirelik Fak.,Rektörlük,Tıp Fakültesi,Güvenlik Şb.Müdür) 06 AU 0533 Plakalı Araç Bakımı</p>	Doğrudan Temin	170.640
	<p>4 Adet Klima 1 Adet IP Telefon Santrali 3 Kalem Yazıcı ve TV Klima 2 Adet Renkli Yazıcı ve 1 Adet Siyah Beyaz Yazıcı 35 Adet Yazıcı/Lazer Yazıcı 16 Adet Tarayıcı 25 Adet Laptop 15 Adet Projeksiyon</p>	DMO	1.291.427
	<p>4 Adet Turnike Sistemi, 13 Kalem Kamera ve Ekipmanları, 6 Kalem Mobilya 16 Adet Cep Telefonu 32 Adet Pleksiglas Sperlik (Büyük ve Küçük), Kapı İsimliği 14 Kalem Malzeme (1 Adet Bayraklı Totem,3 Adet İsimlik 15 x30 cm, 6 Adet İsimlik 2,5 x 35 cm,1 Adet İsimlik 25 x35 cm, 4 Adet İsimlik 15x15 cm,2 Adet İsimlik 30 x 60 cm,3 Adet İsimlik 12,5 x 25 cm,2 Adet Yönlendirme Tabelası(tek ayak), 1 Adet Yönlendirme Tabelası(çift ayak),1 Adet Poliklinik Tabelası 65x190 cm, 50 Adet Dezenfektan Standı, 195 m2 Folyo Baskı ve</p>	Doğrudan Temin	630.093

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	Uygulama,1 Adet Paslanmaz Toprak Kaidesi,1Aadet UV Branda Baskı ve Germe), IP Tabanlı Kamera ve Ekipmanları 6 Adet Binoküler ve Stereo Mikroskop Telefon Santrali ve Dahili Hat Sistemi, 6 Kalem Ses ve Görüntü Ekipmanları		
	1 Adet Konferans Merkez Ünitesi ve 57 Adet Başkan/Delege Ünitesi	Pazarlık Usulü	255.824
	Salon Tipi Klima Duvar Tipi Klima 24 Kalem Güvenlik Kamera ve Ekipmanları 12 Adet Lastik 23 Kalem Trafik ve Yönlendirme Levhası 8 Kalem Ses Sistemi 12 Adet Masa ve 59 Adet Makam Koltuğu 8 Adet LED Tv ve 1 Adet Buzdolabı, 10 Adet Çalışma Koltuğu,12 Adet Çalışma Masası, ve 70 Adet Misafir Koltuğu	Doğrudan Temin	624.982
	70 Adet Masa Üstü Bilgisayar ve 70 Adet Monitör	DMO	837.945
	2 Adet Otomatik Motorlu Bayrak Poster Sistemi (Mekanizmalı) (Doğrudan Temin)	Doğrudan Temin	338.593
TOPLAM			7.238.934

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-51 Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi Kapsamında Yapılan Bakım Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İş	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Fen Fakültesi Tescilli A Ve B Bloklara Ait Restorasyon İş	Belli İstekliler	19.582.536
Toplam				19.582.536

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-52 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
----------	-----------	----------------------	----------------	-------------------	---------------	----------	----------

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	2010-2021	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (5.930 m ²)	500.000	500.000	313.510	Proje kapsamında ihtiyaca binaen mal alımı ve personel alımları olmak üzere toplam 313.510,10 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2021K12-167875	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Lab.	2021-2021	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (2.500 m ²)	1.500.000	1.500.000	1.140.000	Döviz artışı nedeniyle alımların bir kısmı gerçekleştirilmiştir.
2021K12-167874	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme	2021-2021	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (200 m ²)	1.700.000	1.700.000	1.578.163	Proje kapsamında personel ödemeleri ve sar malzemesi giderleri için toplam 1.578.163,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2016K12-2836	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	2016-2021	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (700 m ²)	7.348.000	7.348.000	6.180.666	Pandemi nedeniyle 6.180.666,70 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

***Projelerin özel hesabına 2020 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.**

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-53 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu (Devamı)

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTER İSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	2017-2023	Etüt-Proje	35.000.000	35.000.000	34.936.941	Proje kapsamında 36.936.941,60 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, Kök Hücre Araştırma Merkezi inşaatı Mart ayı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.
2017K12-21024	Kolorektal Kanseri İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	2017-2021	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	3.500.000	3.500.000	1.846.588	Proje kapsamında proje ihtiyacına mal alımları gerçekleştirilmiş olup; proje özel hesabından toplam 1.846.588,20 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
2021K12-167873	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2021-2021	Proje Desteği	7.835.000	15.935.072	20.479.368	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında tutarında özel hesaptan yapılan toplam 20.479.368,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

***Projelerin özel hesabına 2020 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.**

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-54 Kök Hücre Araştırma Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşi

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	I. Etap Kök Hücre Araştırma Laboratuvar Binası Yapım İşi Hakediş Ödemeleri	Açık İhale Usulü	34.936.941
TOPLAM				34.936.941

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Tablo-55 Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2017K120770	Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi	Mr Uyumlu Elektronik Ventilatörlü Anestezi	Pazarlık Usulü	328.000
		Mr Uyumlu Elektronik Ventilatörlü Anestezi	Pazarlık Usulü	374.000
		Pet Ünfüzyon Sistemi	Pazarlık Usulü	572.253
		7000 Adet Pet Ünfüzyon Sistemi Hasta Sesi	Pazarlık Usulü	572.335
TOPLAM				1.846.588

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

7. ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların artırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının artması anlamına gelecektir.

Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinliği artıracaktır.

Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet içi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve değerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım - enerji gibi diğer sektörlerde de Üniversitelerin proje sunmasına imkân tanınmasının bu sektörlerde gerekli uzman personeli çağın gereklerine göre yetiştirmekle görevli üniversitelerdeki sunulan eğitimlerde etkinliği arttıracığı değerlendirilmektedir.

2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Tablo-56 Ankara Üniversitesi 2021 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		115.649			31.595			57.650			67.350			58.013
Sağlık	3		288.342			106.342			101.200			131.950			79.840
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	7		278.734			154.153			57.383			65.483			66.475
TOPLAM	18		682.725			292.090			216.233			264.783			204.328

Tablo-57 Ankara Üniversitesi 2021 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık	1		2.200			0			2.200			2.200			0
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		2.200			0			2.200			2.200			0

Tablo-58 Ankara Üniversitesi 2021 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: HİBE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	-		-			-			-			-			-
Sağlık	-		-			-			-			-			-
Diğer Kamu Hizmetleri	-		-			-			-			-			-
-İktisadi															
-Sosyal	-		-			-			-			-			-
TOPLAM	0		0			0			0			0			0

Tablo-59 Ankara Üniversitesi 2021 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: İCMAL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		115.649			31.595			57.650			67.350			58.013
Sağlık	3		290.542			106.342			103.200			134.150			79.840
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	7		278.734			154.153			57.383			65.483			66.475
TOPLAM	18		684.925			292.090			218.233			266.983			204.328

2021 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablo-60 Sektör Adı: Eğitim

2021 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2020 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2020H03-150547	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	50.000	9.100	19.500	+	3.500	16.658
408	2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	4.995	3.495	500			370
408	2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	41.504	16.000	25.500			19.583
408	2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	4.500	3.000	500			318
408	2019H05-152569	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	250	0	250			169
408	2021H03-167885	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	500	0	450	-	50	375
408	2021H03-167879	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	8.295	0	13.045	+	4.750	13.024
408		Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR		Ankara	0	605	0	605			532
408	2021H03-167881	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	5.000	0	7.000	+	2.000	6.984
TOPLAM						0	115.649	31.595	67.350			58.013

Tablo-61 Sektör Adı: Sağlık**2021 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2020 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam		(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2011I00-1432	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	60.000	9.000		20.000			776
408	2020I00-152404	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	50.380	1.500		66.480	+	19.800	34.808
408		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE		Ankara	0	0			2.200			
408	2014I00-2070	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	180.162	95.842		45.470			44.256
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ankara	0	136.812	56.812		45.000	+	15.000	43.790
408		Makine ve Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	43.350	39.030		470	-	3.850	465
TOPLAM						0	290.542	106.342		134.150			79.840

Tablo-62 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)
2021 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2020 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	26.291	23.458	500			313
408		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0	11.540	10.501				
408		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	14.751	12.957	500			313
408	2021K12-167875	Yer Bilimleri Uyg. Ve Ar.Merke.	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	1.500	0	1.500			1.140
408	2021K12-167873	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2021	Ankara	0	7.835	0	15.935	+	8.100	20.479
408	2021K12-167874	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	1.700	0	1.700			1.578
408	2016K12-2836	Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	47.125	39.777	7.348			6.181
408	2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ankara	0	156.952	54.754	35.000			34.937
408	2017K12-21024	Kolorektal Kanseri Erken Tanı Araş. Pro.	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ankara	0	37.331	33.830	3.500			1.847
TOPLAM						0	278.734	154.153	65.483			66.475
