



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2025





ANKARA ÜNİVERSİTESİ

**2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2025



Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ.....	7
1.GENEL DEĞERLENDİRME.....	9
1.MİSYON.....	9
2.VİZYON.....	9
3.İLKELER.....	9
4.AMAÇ VE HEDEFLER.....	10
2.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	11
3.MEVcut HİZMET KAPASİTESİ.....	13
a) İnsan Kaynakları.....	13
a) Fiziksel Kaynaklar.....	15
4.2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	25
5. 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	28
a) Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	28
b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	34
6. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	35
1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	35
2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	41
3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu.....	60
7. ÖNERİLER.....	62
2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	63
2024 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU.....	67

YÖNETİCİ ÖZETİ

Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, toplam 91.773 öğrencisi, 3.848 akademik personeli (kadrolu, şahsa bağlı kadro, yabancı uyruklu, sözleşmeli öğretici ve Üniversitemizde 2547/35 ile görevlendirilen), 5.010 idari, 1.013 sözleşmeli ve 2.146 işçi olmak üzere toplam 12.017 personeli ile 19 fakülte, 16 enstitü, 1 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 46 araştırma-uygulama merkezi, 2 merkez, Cebeci ve İbni Sina olmak üzere 2 araştırma ve uygulama hastanesi, 1 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve 1 Dış Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, kültür, spor, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2024 yılı yatırımları için toplam 763.783.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 696.220.739,48 TL ekleme işlemi ile toplam 1.460.003.739,48 TL'ye çıkmıştır.

Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %89,20 bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %86,66 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo-1 2024 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)

Sektör	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Gerçekleşme	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	250.500	614.168	609.778	99,29
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	2.000	1.800	1.648	91,56
Kültür	75.000	72.209	18.295	25,34
Sağlık	285.000	493.522	394.345	79,90
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar	151.283	278.305	278.305	100,00
TOPLAM	763.783	1.460.004	1.302.371	89,20
TOPLAM (BAP Hariç)	612.500	1.181.699	1.024.066	86,66

Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir. BAP harcamaları özel hesaba aktarılan tutarı ifade etmektedir.

2024 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 609.778.096,35TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda kampüslerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak birçok binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, kitap alımı, bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmış olup, ayrıca yıl içerisinde "Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Projesi" yatırım programına eklenmiştir. Eğitim sektöründe %99,29 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Beden Eğitimi ve spor sektöründe ise 1.648.320,00 TL harcama gerçekleşmiş olup; Spor Bilimleri Fakültesi TÖMER Basımevi Ve Rektörlük Ek Bina Tesisat Tadilatları, Spor Bilimleri Fakültesi Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Muhtelif Tadilatlar ve Olimpik Yüzme Havuzu Koç Yurdu ve Cebeci Merkezi Kazan Dairesi Mekanik Tadilatları işleri yapılmıştır. Beden eğitimi ve spor sektöründe gerçekleşme %91,56 oranında olmuştur.

Diğer taraftan kültür sektöründe 18.294.645,71 TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda etüt proje işleri ve Veteriner Fakültesi Tescilli Anatomi Patoloji Binası Restorasyonu Uygulama İşi ile diğer restorasyon işleri ve Yazma ve Nadir Eserler Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alımlar gerçekleştirilmiştir. Kültür sektöründe %25,34 oranında bir gerçekleşme olduğu görülmektedir.

Sağlık Sektöründe 394.345.656,62 TL kaynak kullanımı kapsamında hastane binalarımızın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, hastanelerimizin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleşme oranı %79,90' olup, İbni Sina Hastanesi Deprem Güçlendirme Projesi, İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı Projesi ve Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi-Onarım işlerine ilişkin yapım işlerinde kullanılmıştır.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 278.304.779,31TL ödenek bütçeden özel hesaba aktarılarak bilimsel araştırma projeleri desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere proje özel hesaplarına aktarılmıştır.

2024 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.MİSYON

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

- Eleştirel düşünebilen ve çözüm odaklı, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, yaratıcı ve farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi,
- Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, disiplinlerarası ve etik değerleri gözetilen araştırmalar yapmayı,
- Sosyal sorumluluk bilinci ile dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözetilen ve bulunduğu bölgenin kalkınmasına-gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı, görev edinmiştir.

2.VİZYON

Nitelikli araştırmalar yapan, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi araştırma üniversitesi olmaktır.

3.İLKELER

- Akademik özgürlüğe öncelik verme
- Etik değerlere bağlılık
- Liyakat
- Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Kültür öğelerine ve tarihine bağlılık
- Saydamlık
- Öğrenci merkezlilik
- Kaliteyi içselleştirme
- Katılımcılık
- Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı

4.AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2024-2028 dönemi stratejik planında 5 adet stratejik amaç altında 20 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir.


Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç 1. Ulusal ve uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapmak ve araştırma çıktılarının değere dönüştürülmesini sağlamak	Hedef 1.1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayan katma değeri yüksek araştırma çıktılarının artırılması
	Hedef 1.2. Araştırmacı niteliğinin artırılması ve teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi
	Hedef 1.3. Araştırma altyapısı ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması
	Hedef 1.4. Araştırma süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması
Amaç 2. Ulusal/uluslararası alanda kendini ifade edebilen, çağın gerektirdiği bilgi okur-yazarlığı becerileri ve alanında sorun çözüme yetkinliklerine sahip bireyler yetiştirmek ve öğretim elemanlarının üretkenliğini artırmak	Hedef 2.1. Eğitim-öğretim programlarında “yenilik” ve “kalite” sağlayarak öğrencilere çağın gerektirdiği becerilerin kazandırılması
	Hedef 2.2. Öğretim elemanlarının üretkenliğinin ve yetkinliğinin artırılması
	Hedef 2.3. Uluslararası akademik iş birliklerinin ve yararlanıcı sayısının artırılması
	Hedef 2.4. Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması
	Hedef 2.5. Lisansüstü eğitimin niteliğinin artırılması
Amaç 3. Üniversitenin sahip olduğu bilimsel kapasiteyi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmak	Hedef 3.1. Toplumun ihtiyaçlarına ve gelişimine yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerinin artırılması
	Hedef 3.2. Sunulan sağlık hizmetinin kalitesi, kapasitesi ve teknolojisinin artırılması
	Hedef 3.3. Üniversitemiz tarafından toplum yararına sunulan hizmetlerin artırılması
Amaç 4. Kurumun girişimcilik kapasitesini artırmak ve kurumsal iş birliklerini zenginleştirmek	Hedef 4.1. Girişimciliği teşvik edici eğitim faaliyetlerinin artırılması
	Hedef 4.2. Kamu-üniversite-sanayi iş birliği ve girişimcilik ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğinin artırılması.
	Hedef 4.3. Fikri mülkiyet havuzu kapasitesinin geliştirilmesi
	Hedef 4.4. Kurum içi girişimciliğin teşvik edilmesi
Amaç 5. Veri yönetimi ve öz değerlendirme süreçlerini etkin kılarak kurumsal yapıyı güçlendirmek	Hedef 5.1. Kurum genelinde öz değerlendirme çalışmalarının geliştirilmesi
	Hedef 5.2. Veri yönetimi konusunda farkındalık oluşturma
	Hedef 5.3. Kurumsal aidiyetin ve memnuniyetin artırılması
	Hedef 5.4. Teknolojik ve fiziksel altyapının iyileştirilmesi ve yararlanıcı sayısının artırılması

2. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ankara Üniversitesi'nin 2024 Yılı Yatırım Programında toplam 18 adet proje için 767.783.000,00 TL kaynak öngörülmüş olup, yıl içerisinde Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Projesinin yeni proje olarak eklenmesi ile birlikte toplam proje sayısı 19 olmuştur. Diğer taraftan gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu toplam ödeneği 1.506.603.739,48 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 300.000.000,00 TL'si öz gelir 146.933.029,31 TL'si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 46.600.000,00 TL'si döner sermaye, 24.380.716,64 TL'si şartlı bağış ve yardımlar ve 988.689.993,53 TL'si hazine yardımı olarak finanse edilmiştir.

Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılım

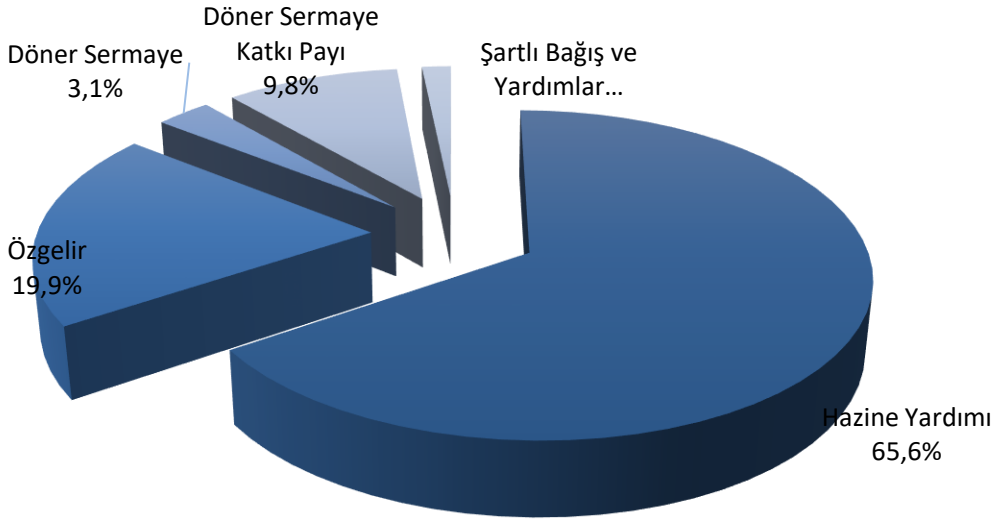

2024 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 5 adet proje için 250.500.000,00 TL kaynak ayrılmış olup, ayrılan kaynağın tamamının hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kültür sektörü kapsamında ise biri etüt proje olmak üzere 3 adet projeye yer verilmiştir ve projeler için toplam 75.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sağlık Sektöründe ise 4 adet proje için toplam 289.000.000,00 TL kaynak tahsis edilmiş olup; 4.000.000,00 TL'sinin döner sermaye kaynakları ve 285.000.000 TL'sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 5 adet proje için 151.283.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; 27.981.000,00 TL'sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 123.302.000,00 TL'sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılacak suretiyle kullanılmaktadır.

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-3 2023 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)

PROJE NO	PROJE ADI	2024 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI				
			ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE	DÖNER SERMAYE KATKI PAYI	HAZİNE YARDIMI	HİBE/DIŞ ÖZKAYNAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM		767.783	0	4.000	27.981	735.802	2.408
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR		151.283	0	0	27.981	123.302	0
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	1.800				1.800	
2024K12-234058	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	15.000				15.000	
2024K12-234059	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	29.502				29.502	
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	77.000				77.000	
2024K12-234057	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	27.981			27.981		
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM		250.500	0	0	0	250.500	0
2024H03-233444	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500				500	
2024H03-233439	Muhtelif İşler	78.000				78.000	0
2020H03-150547	Büyük Onarım	113.000				113.000	
2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	24.000				24.000	
2024H03-233441	Yayın Alımı	35.000				35.000	
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		2.000	0	0	0	2.000	0
2024H05-233790	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000				2.000	
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR		75.000	0	0	0	75.000	0
2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2.000				2.000	
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	70.500				70.500	
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	2.500				2.500	
SAĞLIK		289.000	0	4.000	0	285.000	2.408
2011I00-1432	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	80.000				80.000	
2023I00-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	10.000				10.000	
2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	130.000				130.000	
2024I00-228080	Muhtelif İşler	69.000		4.000		65.000	2.408

3.MEV CUT HİZMET KAPASİTESİ

a) İnsan Kaynakları


Ankara Üniversitesinde 2024 yıl sonu itibarıyla 3.597 kadrolu akademik, 2547/30 madde kapsamında 1 sözleşmeli akademik, 62 yabancı uyruklu akademik, 72 sözleşmeli öğretici, Üniversitemize 2547/35 madde ile görevlendirilen 116 akademik personel, 5.010 kadrolu idari, 1.013 sözleşmeli idari ile 2.146 (2.127'si sürekli, 19'u geçici) işçi olmak üzere toplamda 12.017 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %32'sini akademik, %68'ini idari personel ve işçiler oluşturmaktadır.

Tablo-4 2022-2024 Yılları Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı	2024 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Akademik Personel	3.698	3.646	3.597	-1,3
2547/30 Md. Kapsamında Sözleşmeli Akademik Personel	2	1	1	0,0
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	58	51	62	21,6
Sözleşmeli Öğretici Personel	92	78	72	-7,7
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2547/35)	285	165	116	-29,7
İdari Personel	4.157	5.171	5.010	-3,1
Sözleşmeli İdari Personel	1.392	696	1.013	45,5
İşçi	2.331	2.253	2.146	-4,7
Toplam	12.015	12.061	12.017	-0,4

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-2 2024 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı

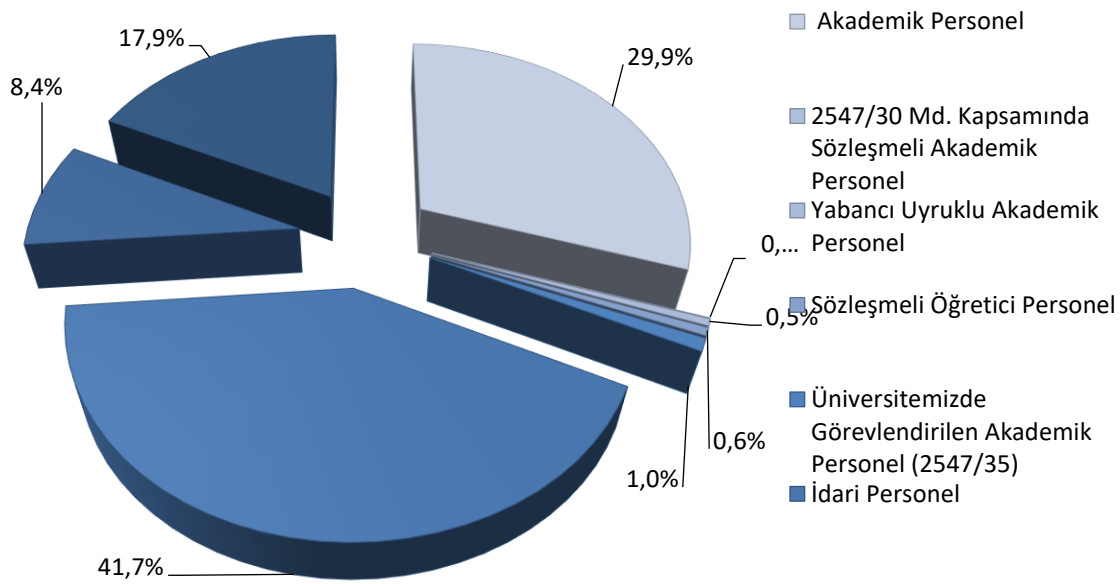

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


2024 yıl sonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %1,3 oranında azalış göstermiştir. Doktor öğretim üyesi kadrosunda %4,3, profesör kadrosunda %4,3 ve doçent kadrosunda %1,9 artış yaşanırken; araştırma görevlisi kadrosunda %8 ve öğretim görevlisi kadrosunda %6,8 oranında azalma yaşanmıştır. 2024 yıl sonu 2.092 öğretim üyesinin, %49,9'u kadın, %50,1'i erkek, toplam akademik personelin ise %53,5'i kadın, %46,5'i erkek akademik personel oluşturmaktadır.

Tablo-5 2022-2024 Yılları Akademik Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı	2024 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%)
Profesör	1.138	1.178	1.226	4,1
Doçent	342	371	378	1,9
Doktor Öğretim Üyesi	372	468	488	4,3
Öğretim Görevlisi	612	558	520	-6,8
Araştırma Görevlisi	1.234	1.071	985	-8,0
Toplam	3.698	3.646	3.597	-1,3

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-3 2024 Yılı Akademik Personel Kadro Dağılımı




2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-6 2022-2024 Yılları İdari Personel Kadro Dağılımı

Personel Sınıfı	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
Genel İdari	1.871	1.848	1.798
Teknik	434	506	494
Sağlık	1.415	2.400	2.315
Eğitim-Öğretim	1	0	0
Avukatlık	8	9	9
Din	0	2	2
Yardımcı	428	406	392
Toplam	4.157	5.171	5.010

Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

Grafik-4 2024 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı



a) Fiziksel Kaynaklar

b.1) Taşınmazlar

Ankara Üniversitesi mülkiyet durumuna göre arsa/arazi alanı; 2024 yılı içerisinde, Gölbaşı Ballıkpınar Yerleşkesi için Üniversite tapulu 1.416.034,00 m² arsa/arazi ilavesi ile toplam 15.357.793,53 m² alanda hizmetlerini sürdürmekte olup, bina/tesis yerleşim alanı toplam 1.129.225,59 m² dir.

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-7 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Arsa/Arazi Alanı (m ²)	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)
Ahlatlıbel 20. Yıl	122.908,00	16.381,34
Altındağ Konak-Özgen	1.688,80	382,00
Ayaş (Diğer)	149.576,41	0,00
Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu Yerleşkesi (Ziraat Fakültesi)	416.144,50	2.255,33
Ayaş Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	6.297,08	1.279,18
Bağlıca 70. Yıl Yerleşkesi	2.430.125,00	23.149,17
Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi	230.449,00	123.042,73
Beşevler Dış Hekimliği Yerleşkesi	17.505,00	51.288,17
Beşevler İlahiyat Yerleşkesi	12.020,00	18.445,50
Beypazarı (Diğer)	484.738,00	0,00
Beypazarı Uygulamalı Bilimler Oteli	680,00	484,00
Beypazarı Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	16.258,00	8.658,10
Bursa Gemlik Zeytinlik	9.901,00	0,00
Cebeci 30. Yıl Yerleşkesi	5.010,00	2.999,79
Cebeci Tıp Yerleşkesi	188.583,00	127.789,58
Cebeci Yerleşkesi	97.580,00	79.418,77
Cevizlidere Kök Hücre Yerleşkesi	4.474,00	3.284,27
Çankaya Ankara Üniversitesi Evi	505,00	714,45
Çankaya ANKÜSEV	651,00	899,58
Çankaya Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM)	0,00	325,88
Çankaya Konut/Kongre Arsası	48.223,00	0,00
Çankaya Korkutreis ASYM	0,00	392,00
Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İşletmesi Yerleşkesi (Ziraat Fakültesi)	108.985,00	2.131,83
Demirlibahçe Beyin Araştırmaları Merkezi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi	4.752,00	4.676,50
Dışkapı Yerleşkesi	100.606,00	54.769,60
Didim ÖRSEM Yerleşkesi	36.977,00	12.295,10
Elmadağ Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	6.422,00	3.607,82
Elmadağ ÖRSEM Yerleşkesi	10.838,00	673,56
Gölbaşı (Diğer)	45.752,00	0,00

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Gölbashi 50. Yil Yerleskesi	712.923,00	130.017,67
Gölbashi Ballikpinar	3.003.731,00	0,00
Gölbashi ÖRSEM Yerleskesi	45.600,00	1.864,29
Gölbashi Teknokent	115.103,00	19.849,00
Gölbashi Yurtlar Bölgesi	251.313,00	56.698,59
Gümüşdere 60. Yil Yerleskesi	139.547,00	11.735,29
Gümüşdere Ziraat Yerleskesi	285.092,00	56.957,85
Haymana (Gölet)	200.167,00	0,00
Haymana Arařtırma ve Uygulama Çiftliđi Yerleskesi (Ziraat Fakültesi)	3.999.507,00	18.940,66
Haymana Meslek Yüksekokulu Yerleskesi	3.791,48	3.438,80
İlgaz ÖRSEM Yerleskesi	3.750,00	5.861,38
İstanbul TÖMER (Beyođlu)	0,00	1.395,90
Kalecik (Arsa)	22.291,00	0,00
Kalecik Bađcılık Arařtırma ve Uygulama İřletmesi Yerleskesi (Ziraat Fakültesi)	198.816,00	347,50
Kalecik Meslek Yüksekokulu Yerleskesi	16.147,60	2.955,21
Karakusunlar	5,00	0,00
Kastamonu Göl Emirler Köyü	1.686,00	0,00
Kazan Eđitim ve Uygulama Çiftliđi Yerleskesi (Veteriner Fakültesi)	1.524.193,00	0,00
Kazan Merkez	25.060,00	16.271,55
Keçiören Sađlık Bilimleri Yerleskesi	24.480,00	15.366,78
Keçiören Şaraphane	0,00	904,90
Keçiören Teknokent	24.126,00	2.042,16
Kızılay TÖMER	-	2.422,90
Kızılcahamam Sađlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	19.453,66	645,11
Maltepe Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Yerleskesi	600,00	2.132,25
Maltepe Vehbi Koç Yurdu	2.686,00	4.490,16
Manavgat ÖRSEM Yerleskesi	21.843,00	8.047,36
Nallıhan Meslek Yüksekokulu Yerleskesi	20.645,00	2.139,35
Sıhhiye Dil ve Tarih-Cođrafya Fakültesi Yerleskesi	18.923,00	31.385,68
Sıhhiye Tıp Yerleskesi	83.581,00	145.191,40
Sıhhiye Yüksek İhtisas Hastanesi Yerleskesi	23.514,00	47.293,92

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Urla Yerleşkesi	11.570,00	1.485,68
Toplam	15.357.793,53	1.129.225,59

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ankara Üniversitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, Üniversite bazında toplam 83 amfide eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Toplam amfinin %96,4'ü fakültelerde, %3,6'sı Devlet Konservatuvarında bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesinde 2024 yılı itibarıyla 854 sınıfta eğitim-öğretim yapılmıştır. Toplam sınıfın %48,6'sı fakültelerde, %22,8'i yüksekokullarda, %15,6'sı araştırma ve uygulama merkezlerinde, %2,4'ü Devlet Konservatuvarında, %1,4'ü enstitülerde ve geri kalan %9,2'si de uygulama merkezleri ile eğitim merkezlerinde bulunmaktadır.

Öğrencilerin uygulama yapmak amacıyla kullandığı 58 atölyenin %36,2'si fakültelerde, %24,1'i yüksekokullarda, %5,2'si uygulama merkezlerinde ve geri kalan %34,5'i de araştırma ve uygulama merkezlerinde bulunmaktadır. Ayrıca, toplam 727 laboratuvarın %54,1'i araştırma, %43,3'ü eğitim, %2,6'sı ise sağlık laboratuvarlarından oluşmaktadır.

Tablo-8 Eğitim ve Uygulama Alanları

KAPASİTE (m2)	AMFİ	SINIF	ATÖLYE	LABORATVUARLAR	TOPLAM
0-50	7	572	55	581	1.215
51-75	1	162	2	48	213
76-100	10	74	1	75	160
101-150	29	38	0	7	74
151-250	21	8	0	5	34
251-Üzeri	15	0	0	11	19
TOPLAM	83	854	58	727	1.722

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara merkezinde 5 kız, 4 erkek öğrenci evi olmak üzere toplam 9 öğrenci evimiz bulunmaktadır.

Tablo-9 Öğrenci Evleri Kapasiteleri

ÖĞRENCİ EVİ	ALAN (m ²)	KAPASİTE (Kişi)
Cumhuriyet Öğrenci Evi	5.972	186
Cumhuriyet Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası	1.917,50	74
Keçiören Öğrenci Evi	3.018,00	137
Milli Piyango Öğrenci Evi	9.543,52	384
Vehbi Koç Öğrenci Evi	4.698,00	224
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	4.439,00	165
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	5.144,00	236
Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası	1.570,00	47
Kızılcahamam Abdülkadir Özcan Erkek Öğrenci Evi	1.533,00	40
TOPLAM	37.835,02	1.493

Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Milli Piyango Öğrenci Evi bünyesinde Üniversitemiz misafirlerine hizmet vermek üzere misafir odaları bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşdere Yerleşkesinde yardımcı hizmetli personelin yararlandığı 2 bina olarak, 20 daireden oluşan toplam 1.780 m² alana sahip lojman bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hizmet verilen, Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde 1 adet merkez mutfak ve 41 adet birim yemekhanesi olmak üzere toplam 42 adet yemekhane bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 63 adet kantin/kafeterya ve 2 adet büfe bulunmaktadır.

Tablo-10 Yemekhane, Kantin/Kafeteryalar ve Restoranlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	12.958,00	42	6.302
Kantin / Kafeteryalar	24.691,31	63	-
Restoran	50,04	2	-

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-11 Toplantı ve Konferans Salonları

KAPASİTE (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	TOPLAM
0-50	179	10	189
51-75	20	8	28
76-100	3	8	11
101-150	4	6	10
151-250	0	8	8
251-Üzeri	1	14	15
TOPLAM	207	54	261

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesinde 2 adet sinema salonu, Ziraat Fakültesinde 1 adet tiyatro salonu ve Devlet Konservatuvarında 1 adet konser salonu; Rektörlük binasında Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinde Oyuncak Müzesi, Veteriner Fakültesi (Anatomi Müzesi ile Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Sergi Salonu) 2 adet, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sergi Salonu, Eczacılık Fakültesi içinde yer alan Eczacılık Müzesi, Hemşirelik Fakültesinde HemşirelikEbelik Sergi Salonu, İlahiyat Fakültesi Sergi Salonu, Tıp Fakültesi 75. Yıl Sergi Salonu, Ziraat Fakültesi Müzesi ve Ankara Üniversitesi BEYAS Arşiv Müzesi ile toplamda 11 adet müze/sergi salonu bulunmaktadır.

Tablo-12 Diğer Sosyal Alanlar

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET	KAPASİTE (Kişi)
Sinema Salonu	313	2	240
Tiyatro Salonu	351	1	150
Konser Salonu	557	1	100
Müzik Salonu	72,55	2	29
Müze ve Sergi Salonları	2.727,27	11	-
Okuma Salonu	5.134,16	34	2.392
Çok Amaçlı Salon	802,50	9	463

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Dans Atölyesi	55	1	10
Drama Salonu	67,30	1	30
El Sanatları Salonu	1	50	9
İç Bahçe	350	1	150
Öğrenci Sosyal Alanı	99,15	2	50
Bilgisayar Salonu	64	1	32
Sosyal Tesis (Ayaş, Haymana, Kalecik)	2.329	3	150
Öğrenci Kulüpleri	431	11	-
Kitap Satış Yeri	100	1	-
Ürün Satış Yeri	300,6	6	-
Berber	23,90	2	7
Kuaför	42,45	2	5
Kuaför ve Berber	15	1	5
Market	1.159,82	3	-
Mescit	1.753,19	50	1.597

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine mesleki alanlarına göre araştırma ve uygulama yapma imkanı sunmaya devam etmektedir.

Tablo-13 Araştırma Uygulama Alanları

ALAN ADI	Arsa/Arazi Alanı (m2)	Kapalı Alan (m2)	ADET
Araştırma Uygulama Çiftliği	6.247.645,50	23.675,32	5
Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri	119.008,00	28.741,69	5
Kütüphane	-	16.668,92	35

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-14 Spor Alanları

Birim Adı	Kapalı Spor Tesisleri			Açık Spor Tesisleri		
	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)	Spor Dalı	Adet	Alan (m ²)
Beşevler 10. Yıl	Tenis Kortu	3	1.944	Tenis Kortu	3	1.944
	Fitness Egzersiz Salonu	2	370	Basketbol	3	1.826
	Yüzme Havuzu	1	3.510	Voleybol	2	550
	Piri Reis Spor Salonu	1	1.082	Futbol	1	1.152
Beypazarı Meslek Yüksekokulu				Basketbol	1	375
				Voleybol	1	300
Cebeci Yerleşkesi	Cebeci Spor Salonu	1	2.045	Futbol	1	1.152
	Egzersiz Salonu	1	250			
Demirlibahçe				Voleybol	1	100

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Dışkapı Yerleşkesi	Dışkapı Spor Salonu	1	1.250	Basketbol	1	270
				Futbol	1	2.350
				Halı Saha	1	1.000
	Egzersiz Salonu	1	62	Spor Sahası	1	88
				Tenis Kortu	1	185
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi				Basketbol	1	80
Diş Hekimliği Fakültesi	Fitness	1	30			
Elmadağ Meslek Yüksekokulu	Masa Tenisi	1	36	Basketbol	1	230
	Bilardo	1	64			
	Langırt	1	73	Voleybol	1	230
Gölbaşı 50. Yıl	Atış Poligonu	1	100	Gölbaşı Su Sporları E.M	1	6.000
	Egzersiz Salonu	1	250			
	Genel Amaçlı Salon	1	2.050			
	Güreş ve Uzakdoğu Sporları	1	206	Futbol	1	1.152
	Jimnastik ve Plates Salonu	2	240			
	Masa Tenisi	1	100			
	Okçuluk ve Dart Alanı	1	313	Stadyum Kompleksi	1	11.009
	Ritim Eğitimi	1	100			
Kalecik Meslek Yüksekokulu				Basketbol-Voleybol	1	720
Hemşirelik Fakültesi				Voleybol	1	100
Sıhhiye Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi				Basketbol	1	80
Didim ÖRSEM				Plaj Voleybol	1	594
Morfoloji	Fitnes Salonu	1	180	Basketbol	1	500
				Tenis Kortu	1	500
Ziraat Uygulama Merkezi				Basketbol-Voleybol	2	700

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-15 Hastane Alanları

Alan Adı	İbn-i Sina Uyg. ve Arş. Hastanesi	Cebeci Uyg. ve Arş. Hastanesi	Diş Hekimliği Fak. ve Diş Hekimliği Uyg. Hastanesi	TOPLAM
Acil Servis	1	1	0	2
Yoğun Bakım	7	6	0	13
Ameliyathane	1	26	3	30
Poliklinik	35	176	1	212
Klinik	22	25	19	66
Laboratuvar	6	6	7	19
Eczane	1	1	1	3
Radyoloji Alanı	1	58	30	89
Nükleer Tıp Alanı	0	16	0	16

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sterilizasyon Alanı	1	5	1	7
Mutfak	1	1	0	2
Çamaşırhane	1	0	1	2
Teknik Servis	9	1	3	13
Adli Tıp	0	1	0	1
Morg	1	0	0	1
Kan Merkezi	0	1	0	1
Kompresör Odası ve Kazan Dairesi	0	6	1	7
Hastane Müdürlüğü	1	0	0	1
Hasta Yatış	1	0	0	1
Döner Sermaye	1	0	0	1
Tıbbi Malzeme	1	0	0	1
Bekleme Salonu	0	35	0	35
TOPLAM	91	365	67	523

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-16 Hayvan Sağlığı Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Acil Servis	164,00	1
Yoğun Bakım	236,00	18
Ameliyathane	228,00	9
Poliklinik	583,00	29
Klinik	122,00	9
Laboratuvar	500,00	11
Eczane	34,00	1
Radyoloji Alanı	217,00	10
Sterilizasyon Alanı	30,00	2
Mutfak	62,00	3
Çamaşırhane	10,00	1
Teknik Servis	10,00	1
Kompresör Odası ve Kazan Dairesi	287,00	2
TOPLAM	2.499,00	97

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-17 Ambar ve Arşiv Alanları

ALAN ADI	KAPALI ALAN (m ²)	ADET
Ambar Alanı	9.852	95
Arşiv Alanları	9.204	188
Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri	29.486	679
TOPLAM	48.542	962

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

b.2) Taşınır

Aşağıda verilen tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. 2024 yıl sonu itibarıyla, I. düzeyde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda toplam 59.335, 254 Taşıtlar grubunda toplam 509 ve 255 Demirbaşlar grubunda da 328.243 adet taşınır kayıtlıdır.

Tablo-18 2024 Yılı İtibarıyla Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayısı

Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınır	Ölçü Birimi	2024 Yılı
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	59.335
254	Taşıtlar Grubu	Adet	509
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	328.243

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tablo-19 Taşıtlar Grubu

Taşıtların Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Toplam
Otomobiller (Binek)	16	26	42
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs)	16	0	16
Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon)	20	0	20
Hafif Ticari Araç	1	2	3
Arazi Taşıtları	2	0	2
Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler)	7	0	7
Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork)	417	0	417
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)	9	0	9
Botlar	10	0	10
Yelkenliler	3	0	3
Kanolar ve Kayıklar	9	0	9
Toplam	509	28	537

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Ankara Üniversitesi, bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanma ilkesiyle, günümüz gereksinimleri ve geleceğe dair öngörüler doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici altyapı, hizmet ve yazılım üretmekte ve bunları güncel tutmaktadır. 12 Gbps hızında Metro Ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahip olan Ankara Üniversitesi yerleşkelerindeki tüm toplanma noktalarına fiber optik kablo çekilmiş, tüm kullanıcılara ve bilgisayar laboratuvarlarına aktif ağ ucu sağlanmış, olası kesintilere karşı internet hattı yedeklenmiştir.

Tablo-20 Teknolojik Kaynaklar (2022-2024)

	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
Sunucular	351	356	351
Masaüstü Bilgisayar	14.759	14.789	14.506
Taşınabilir Bilgisayar	4.667	4.580	4.525
Tablet Bilgisayar	1.366	1.347	1.341

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Cep Bilgisayar	223	220	208
----------------	-----	-----	-----

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tablo-21 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2022-2024)

	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
Projeksiyon	1.860	1.868	1.869
Tepegöz	176	155	145
Barkot Okuyucu	287	435	430
Yazıcı	6.235	6.273	6.169
Baskı Makinesi	25	22	21
Fotokopi Makinesi	232	228	210
Faks	107	101	95
Fotoğraf Makinesi	388	379	407
Kameralar	2.467	2.485	2.674
Televizyonlar	2.306	2.292	2.274
Tarayıcılar	705	730	755
Müzik Setleri	361	346	339
Mikroskoplar	2.460	2.422	2.424
DVD'ler	180	157	146
Yazı Tahtası	1.425	1.485	1.460

Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Birim Faaliyet Raporları

2024 yılında birimlerden ve kullanıcılardan gelen kitap talepleri ile doğrudan temin yöntemiyle 1.193 Türkçe, 69 yabancı olmak üzere toplam 1.262 kitap alınmış olup, dağılımı Tablo 23'te gösterilmiştir.

Tablo-22 Kütüphane Kaynakları

	2024 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	19.294	1.666.640	1.685.934	813.920	1.666.640	2.480.560
Basılı ve Veri Tabanında Yer Alan Süreli Yayın Sayısı	0	74.455	74.455	10.850	74.855	85.705
Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı	22	36	58	22	36	58
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	0	143	143	0	143	143

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-23 Alınan Kitapların Birimler İtibari İle Dağılımı

Birimler	Alınan Kitap Sayısı
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi	9
Diş Hekimliği Fakültesi	18
Eğitim Bilimleri Fakültesi	446
Fen Fakültesi	22
Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi	24
Haymana Meslek Yüksekokulu	55
Hukuk Fakültesi	70
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	13
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	222
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	3
Siyasal Bilgiler Fakültesi	279
Veteriner Fakültesi	14
Yabancı Diller Yüksekokulu	25
Ziraat Fakültesi	62
Toplam	1.262

Kaynak: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu

4.2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo-24 Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Yatırımları

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Sağlık	2024I00-228080	Muhtelif İşler	Acil büyük onarım ihtiyacı bulunan binaların ödenek sınırında büyük onarımının yapılması ve hastanelerin muhtelif makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında büyük bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir ve muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları ödenekler sınırında karşılanmıştır.
Sağlık	2011I00-1432	İbni Sina Hastanesi Deprem Güçlendirilmesi	Ödenek Sınırında Projenin Gerçekleşmesi Planlanmıştır.	Proje devam etmektedir.
Sağlık	2023I00-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi Kapsamında Büyük Onarım İle Makine-Teçhizat İhtiyaçlarının Karşılanması Hedeflenmiştir.	Proje devam etmektedir
Sağlık	2021I00-178521	İbn-i Sina Ameliyathane Tadilatı	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Bakım Onarımının Yapılması Planlanmıştır.	Proje devam etmektedir.
Eğitim	2024H03-233444	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1 Adet Etüd Proje Hizmeti Alınması Planlanmıştır.	Hedeflenen Kapasite Gerçekleşmiştir.

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Eğitim	2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	Proje Kapsamında Yapım ve Bakım Onarım İşi Gerçekleştirilmiştir.	Hedeflenen Kapasite Gerçekleşmiştir.
Eğitim	2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Bakım Onarımının Yapılması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Yapım ve Bakım Onarım İşi Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2024H03-233439	Muhtelif İşler	Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşıllanması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tablet Bilgisayar, Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazları ile Muhtelif Demirbaşların ve Makine Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2024H03-233441	Yayın Alımı	Üniversitemiz kütüphane basılı, elektronik, süreli yayın alımı ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Proje kapsamında mevcut ödenekleri çerçevesinde süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliği ve kitap alımları gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2024H03-245804	Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu	Proje kapsamında gerekli malzeme alımı yapılmıştır.	Proje devam etmektedir.

Tablo-24 Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Yatırımları (Devamı)

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Kültür	2014H04-2028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	Ödenek Sınırında Projenin Gerçekleşmesi Planlanmıştır.	Proje devam etmektedir.
Kültür	2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	Acil Büyük Bakım Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Restorasyonlarının Yapılması Planlanmıştır.	Proje Kapsamında Etüd Proje, Restorasyon, Onarım ve Hizmet Alım İşi Gerçekleştirilmiştir.
Kültür	2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	Yazma Eserler Depolama Alanı Alt Yapısı – Yazma Eserler Kataloglama Denetleme İşi	Alt yapı gerçekleşti. Kataloglama devam etmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor	2024H05-233790	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	Çeşitli Bina ve Spor Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirmiştir.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	2024 yılı içerisinde ülkemiz için önemli yer altı kaynaklarından olan bor elementi üzerine yazmış olduğumuz TÜBİTAK -2568 Çin bilimler akademisi ile uluslararası ikili işbirliği projemiz kabul görmüştür. 3 yılı sürecek bu proje kapsamında bor elementi kullanarak yüksek performanslı magnezyum diborür süperiletken tel üretimi hedeflenmektedir. Geleceğin teknoloji olan süperiletken malzemeler kullanımı git gide artarak devam etmekte olup bor elementinin bu alanda kullanarak ülkemize katma değerli ürünleri arasında yer alması projenin diğer hedefi arasındadır.	Ödenek kısıtı altında alımlar kısmen gerçekleştirilmiş olup; personel giderlerine yönelik ödemeler gerçekleştirilmiştir.

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2024K12-234058	Yer Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi	Konfokal Raman Spektrometresi Lazerleri, Ergiyik Kapanım Sistemi, TL-OSL Tarihlendirme Sistemi, Duraylı İzotop Analiz Sistemi, Mikro Kimyasal Analiz Sistemi, SEM için Raman Spektroskopi Sistemi, Yeriçi Görüntüleme Sistemi Alımı Yapılması Planlanmıştır.	Proje kapsamında alınması öngörülen cihaz alımlarının önemli bir bölümü gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmemesinin ana nedeni döviz kurunda ani ve aşırı artış yetersiz bütçe oluşumuna neden olmuştur. Bu bağlamda pek çok analiz sistemleri (Ergiyik kapanım, SEM için Raman Spektroskopi Sistemi, Yeriçi Görüntüleme Sistemi, Yeriçi Modelleme yazılımları, Sismik cihazı, Manyetotellurik (MT) Sistemi, Anyon Ölçüm sistemi, TIMS Sistemi, TOC Ölçüm Cihazı, Hidroseperasyon Sistemi, Mikro kimyasal analiz sistemi, Portable analiz sistemi, Karbon Yaşlandırma Sitemi vb.) alınmamıştır.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2024K12-234059	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı	Ödenek Sınırında Projenin Gerçekleşmesi Planlanmıştır.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	Kök hücre alanında, klinik uygulamalar ve araştırma çalışmalarında eksikliği doldurmak amaçlanmaktadır.	Ödenek çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)	2024K12-234057	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Tahsis edilen ödenek ile Üniversitemizde yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.	2024 yılında Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri için özel hesaptan harcama yapılmış olup, ayrıca YÖK Başkanlığının Araştırma Üniversiteleri Destek Programına ilişkin Usul ve Esasları çerçevesinde kullanılmak üzere hazine yardımı karşılığı olarak ödenek tahsis edilmiştir.

5. 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


a) Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. 2024 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 4 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için 285.000.000,00 TL hazine yardımı ve 4.000.000,00 TL döner sermaye karşılığı olmak üzere toplam 289.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi için 100.875.238,89 TL likit ödenekten ve 3.000.000,00 TL kurum içi aktarmadan olmak üzere toplam 103.875.238,89 TL ödenek aktarılmıştır. , İbni Sina Deprem Güçlendirme Projesi için likit ödenekten 77.326.016,64 TL ödenek aktarılmıştır. İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı Projesi için ise 16.320.863,00 TL likit ödenek aktarılmıştır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında büyük onarım giderleri ve makine teçhizat alımları için toplam 14.000.000,00 TL Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden ve makine teçhizat alımları için döner sermaye karşılığı olarak 30.000.000,00 TL ödenek kaynak aktarılmıştır. Sağlık sektöründe Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi büyük onarım ve makine-teçhizat alımları, İbni Sina Deprem Güçlendirme Projesi büyük bakım onarımları, İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı Projesi büyük onarım giderleri ve Muhtelif İşler Projesi kapsamında hastanelerin büyük bakım onarımları ve makine teçhizat alımları için toplam 394.345.656,62 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.

Tablo-25 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2021	103.200	134.150	79.840
2022	94.340	376.640	285.578
2023	173.000	280.557	89.709
2024	289.000	527.522	394.346

Grafik-5 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

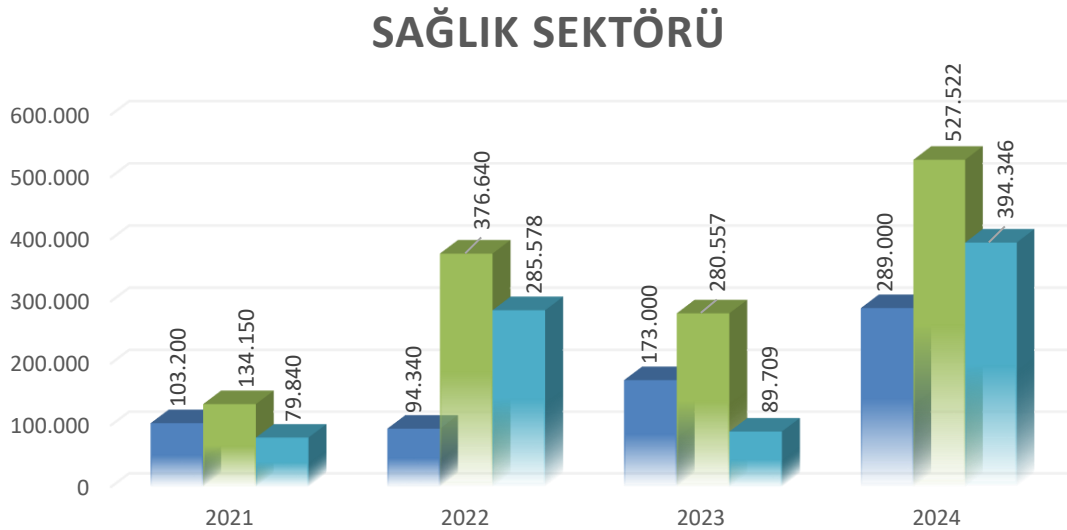

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


2024 yılbaşında 5 adet yükseköğretim, 3 adet kültür sektöründe ve 1 adet beden eğitimi ve spor sektöründe yer almakta olup, yıl içerisinde 1 adet yükseköğretim sektörüne proje eklenmesiyle birlikte toplam 10 adet proje desteklenmiş ve bu projelere toplam 327.500.000,00 TL tutarında kaynak tahsis edilmiştir.

Yıl içerisinde 61.000.000,00 TL Cumhurbaşkanlığının yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş, 23.566.647,44 TL şartlı bağış ve yardım karşılığı 10.959.118,00 TL likit karşılığı ve 12.600.000,00 TL döner sermaye karşılığı olarak ödenek kayıtları ile desteklenmiştir ve revize ödenek toplamı 700.776.791,64 TL olup, toplam harcama ise 629.721.062,06 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı, çeşitli restorasyon işlerinin yapıldığı görülmektedir. Diğer taraftan birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yayın alımları, bilişim malzemesi alımları ve makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.

Tablo-26 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2021	57.650	67.350	58.014
2022	60.700	114.717	72.206
2023	188.500	282.893	248.168
2024	327.500	700.777	629.721

Grafik-6 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

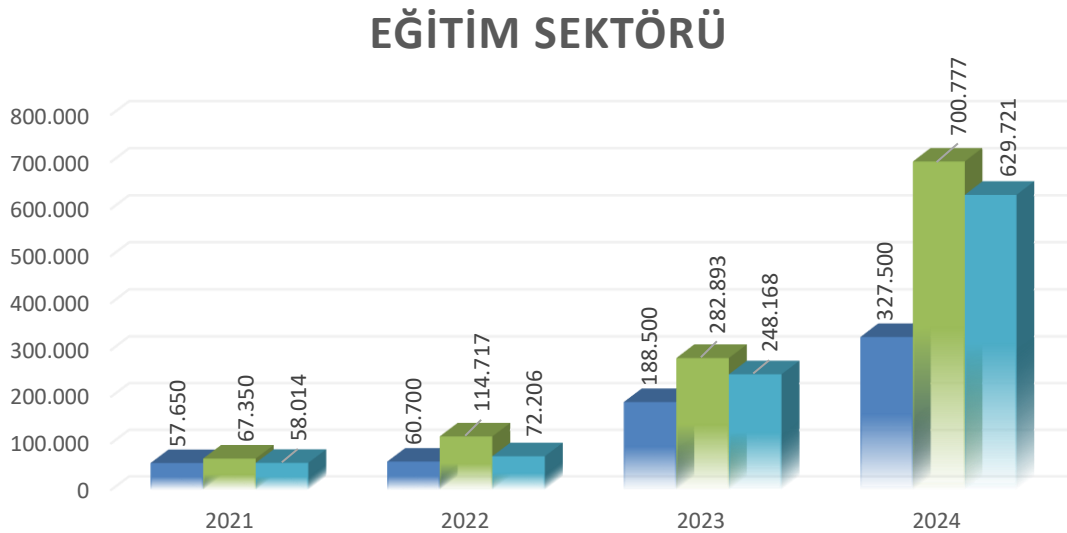

2024 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 5 adet proje için toplam 151.283.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine gelir fazlası karşılığı olarak 118.952.029,31 TL ve YÖK desteği olarak 20.400.000,00 üzere ödenek eklenmiştir.

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


Bilindiği üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.

Tablo-27 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

YILI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
2021	57.383	65.483	65.483
2022	85.304	155.278	155.278
2023	40.000	85.128	85.128
2024	151.283	278.305	278.305

Grafik-7 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)

(DKH) SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ

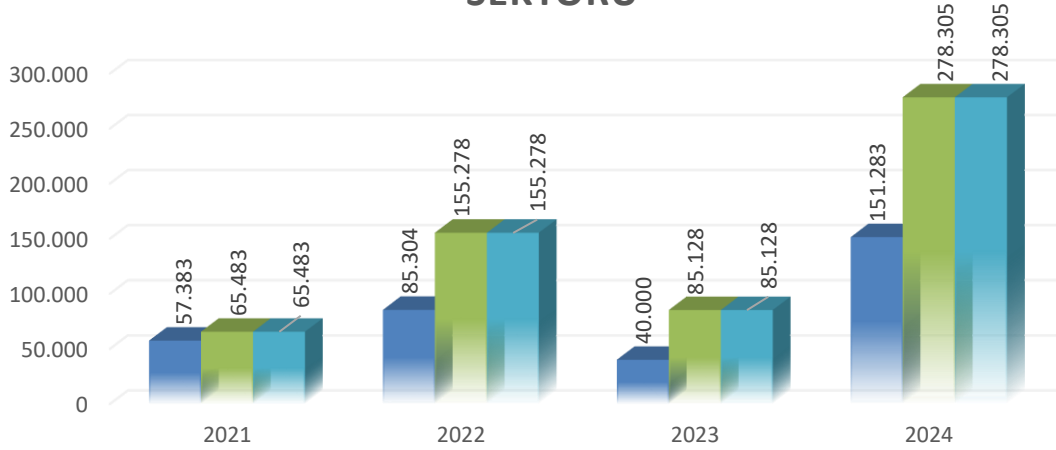

Tablo-28 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Sonu Kümülatif Harcama	2024 Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Revize Ödenek	2024 Yılı Harcama
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	61.613	59.993	1.800		180	1.620	1.634
2024K12-234058	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk.	13.500	0	15.000		1.500	13.500	8.477
2024K12-234059	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme Altyapısı	26.552	0	29.502		2.950	26.552	23.908
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	424.885	355.595	77.000		7.700	69.300	21.168

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KB Destekli Projeler Toplamı		526.550	415.588	123.302	0	12.330	110.972	55.187
2024K12-234057	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri*	167.333	0	27.981	139.352		167.333	137.738
GENEL TOPLAM		693.883	415.588	151.283	139.352	12.330	278.305	192.925

(1) *Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır.*

(2) *Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.*

2024 yılı yatırım programında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe toplam 5 adet proje için 123.302.000,00 TL hazine yardımı ve 27.981.000,00 TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam 151.283.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine gelir fazlası karşılığı olarak 118.952.029,31TL ve YÖK desteği olarak 20.400.000,00 yapılan işlemlerle birlikte toplam ödenek 278.304.829,31 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin tamamı özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 192.924.772,90 TL harcanmıştır.

Tablo-29 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Sonu Kümülatif Harcama	2024 Program Ödeneği	Revize Ödenek	2024 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2024H03-233439	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim)	68.301	0	59.000	55.411	53.879	53.879
2024H03-233441	Yayın Alımı	33.500	0	35.000	37.000	33.452	33.452
2024H03-233439	Muhtelif İşler (Bil.Teknoloj.)	19.000	0	19.000	22.290	19.288	19.288
2024I00-228080	Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Sağlık)	81.408	0	35.000	45.000	44.955	44.955
2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	45.000		45.000	42.000	0	0
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	9.500	5.000	2.500	2.050	437	450
2023I00-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	105.548		9.998	105.864	105.545	105.545
TOPLAM		362.257	5.000	205.498	309.615	257.556	257.569

Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan 3 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 3 adet olmak üzere toplam 6 adet proje için 2024 yılı programında 205.498.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacıyla projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan bütçe işlemlerinin ardından makine-teçhizat, yayın alımı ve bilgi teknolojileri projelerinin toplam ödeneği 309.614.617,09 TL'ye ulaşmıştır. Ödenegin 257.556.451,20 TL'si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %83,19'dur.

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo-30 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Sonu Kümülatif Harcama	2024 Program Ödeneği	Revize Ödenek	2024 Yılı Harcama	Toplam Harcama
2024H05-233790	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.800	0	2.000	1.800	1.648	1.648
2024H03-233444	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	450	0	500	1.150	1.150	1.150
2020H03-150547	Büyük Onarım	298.800	117.800	113.000	143.215	143.132	260.932
2024H03-245804	Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu	810.000	0		300.000	297.276	297.276
2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	61.566	0	24.000	61.601	61.601	61.601
2011I00-1432	İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç.	528.000	14.034	80.000	157.326	104.012	118.046
2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	505.000	235.000	85.000	101.321	98.543	333.543
2024I00-228080	Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	31.997	0	30.000	33.260	32.538	32.538
2023I00-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	37.005	29.675	2	8.752	8.752	38.427
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	0	0	0	200	13	13
2014H04-2028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	5.300	0	2.000	5.300	4.097	4.097
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	297.948	28.500	70.500	58.159	13.748	42.248
TOPLAM		2.577.866	425.009	407.002	872.084	766.510	1.191.519

Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 8 adet, sağlık sektöründe 4 adet olmak üzere, toplam 12 adet proje için 2024 yılı programında toplam 407.002.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde “Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Projesi” yatırım programına eklenmiş olup, ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan bütçe işlemlerinin ardından etüt, inşaat ve büyük onarım projelerinin toplam ödeneği 872.084.293,08 TL olmuştur. Ödeneğin 766.510.267,48 TL’si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %87,89’dur.

Tablo-31 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)

Açıklama	Proje Tutarı	2023 Sonu Kümülatif Harcama	2024 Program Ödeneği	Revize Ödenek	2024 Yılı Harcama	Toplam Harcama
Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler*	693.893	415.588	151.283	278.305	192.925	608.513
Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım	2.577.866	425.009	407.002	872.084	766.510	1.191.519
Makine Teçhizat	309.757	5.000	151.498	250.325	204.816	209.816
Yayın Alımı	33.500	0	35.000	37.000	33.452	33.452
Bilgi Teknolojileri	19.000	0	19.000	22.290	19.288	19.288
GENEL TOPLAM	3.634.016	845.597	763.783	1.460.004	1.216.991	2.062.588

*Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılan tutarlardan proje yürütücüleri tarafından bildirilen harcama tutarları dikkate alınmıştır. Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır.

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2024 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için (döner sermaye hariç) 763.783.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise 1.460.003.739,48 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait 278.304.829,31 TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2023 yılından devreden tutar ve 2024 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde projeler ihtiyacına toplam 205.481.236,53 TL likit karşılığı olarak ödenek eklenmiştir. Ayrıca Bilimsel Araştırma Projeleri ihtiyacına da gelir fazlası karşılığı toplam 79.140.377,00 TL ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında toplamda; 71.000.000,00 TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2024 yılı yatırım programında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından toplam 19 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 629.721.062,06 TL, sağlık sektöründeki projeler için 394.345.656,62 TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için 192.924.772,90 TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 1.216.991.491,58 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo-32 2024 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	EKLENEN						DÜŞÜLEN	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA
		LİKİT	YÖK DESTEĞİ	GELİR FAZLASI	AKTARMA	ŞARTLI BAĞIŞ	YEDEK ÖDENEK			
06.1 Mamul Mal Alımları	316.305.000	95.550.000	20.400.000	79.140.377	7.713.591		17.000.000	28.738.843	507.370.125	462.002.980
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	11.658.000			30.000.000				830.000	40.828.000	40.828.000
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	17.600.000			9.811.652	2.475.600	814.069		5.400.000	25.301.322	25.300.634
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	24.000.000			300.000.000	35.000	23.566.647	14.000.000		361.601.647	358.876.708
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	6.000.000				1.800.000			100.000	7.700.000	7.509.616
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	388.000.000	109.931.237			4.000.000		40.000.000	24.948.591	516.982.646	407.633.559
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	220.000								220.000	220.000
TOPLAM	763.783.000	205.481.237	20.400.000	418.952.029	16.024.191	24.380.717	71.000.000	60.017.434	1.460.003.739	1.302.371.498

b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.
2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarım Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda mali bir baskı yaratmaktadır.
6. Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından uygulama alanı olarak kullanılmakta olan geniş tarım arazileri ve büyük ahır, ağıl ve haraların modern tarım teknikleri ile işletilmesi gerekmekte olup modernleştirme için gerekli ödenek ihtiyacının 30 Milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Üniversitelerin tarım sektöründe proje yürütmesine sıcak bakılmaması eğitim sektörü ödenekleri üzerinde baskı oluşturmaktadır.
7. Ödeneklerin aylık olarak serbest bırakılması nedeniyle hakediş ödemelerinin yapılmasında aksaklıklar meydana gelmekte olup, bu nedenle özellikle yapım işlerinde işlerin bitiş süresi uzamaktadır.

6. 2024 YILI PRJE UYGULAMALARI

1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-33 Sağlık Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTE RİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2023I00-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	2023-2024	Makine ve Teçhizat-Büyük Onarım	10.000.000,00	114.615.238,89	114.296.648,00	Üniversitemizin sağlık hizmetlerin aksamadan yürütülmesi ve muhtelif yerleşkelerinde yapım, tadilat acil bakım onarım ihtiyaçları ve 3 adet MR cihazı alımı için kullanılmıştır.
2011I00-1432	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirilmesi	2011-2026	Büyük Onarım	80.000.000,00	157.326.016,64	98.543.467,06	Proje devam etmektedir.
2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	2021-2025	Büyük Onarım	130.000.00,00	199.326.016,64	104.012.058,80	Proje kapsamında büyük onarım ve cihaz alımı yapılmakta olup, söz konusu proje devam etmektedir.
2024I00-228080	Muhtelif İşler	2024-2024	Makine ve Teçhizat-Büyük Onarım	65.000.000,00	78.260.000	77.493.482,76	Proje kapsamında büyük bakım onarım işleri yapılmıştır. Diğer taraftan hastanelerin muhtelif makine-teçhizat ihtiyaçları proje kapsamında karşılanmıştır.

Tablo-34 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2024I00-228080		Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Bodrum Kat Arşiv Ve Çeşitli Mahallerde Tadilat Yapılması İş	Doğrudan Temin	192.000
		26 (Yirmi Altı) Kalem Marangoz Atölyesi Malzeme Alım İş	Doğrudan Temin	206.064
		Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Simülasyon Odası Yapılması Ve Muhtelif Tadilatlar İş	Doğrudan Temin	663.000
		223 (İki Yüz Yirmi Üç) Kalem Bakım Onarım Malzemesi Alım İş	Doğrudan Temin	746.049
		8 (Sekiz) Kalemelektrik Aydınlatma Malzemesi Alım İş	Doğrudan Temin	737.913
		Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Doğalgaz Tesisatı Yapım İş	Doğrudan Temin	514.800

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Muhtelif İşler	Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Yerleşkesi Prof. Dr. Şerif Çanga Amfisi Koltuk Tadilatları İle İlahiyat Fakültesi Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	429.000
	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarı 50. Yıl Yerleşkesi Ana Giriş Nizamiyesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Sks Binası Öğrenci Tuvaletleri Yebim Binası Ve Muhtelif Mahallerde Onarım Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	624.000
	Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp – İbn-i Sina – 10.Yıl – 50. Yıl – Dışkapı Yerleşkeleri Ve Muhtelif Mahallerde Data Altyapısı Oluşturulması İşİ	Doğrudan Temin	642.000
	Ankara Üniversitesi Tıp Ve Eğitim Yerleşkelerinde Yapılması Planlanan Cami Ve Mescitler İçin Mimari Avan Proje Hazırlanması İşİ	Doğrudan Temin	726.000
	Ankara Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı 2024 Yılı E-Hakediş Programı İçin Güncel Sürüm Hizmeti Alınması İşİ	Doğrudan Temin	180.000
	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Uygulama Hastanesi Tıbbi Malzeme Muhafaza Alanı Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	732.000
	5 (Beş) Kalem Marangoz Atölyesi Malzeme Alım İşİ	Doğrudan Temin	132.540
	Ankara Üniversitesi Keçiören Sağlık Bilimleri Yerleşkesi Misafirhane Binası Statik Mimari Rölövelerin Hazırlanması Ve Deprem Performans Analizi Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	420.000
	Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi Cephesi Alper Gezeravcı Yerleşkesi 50. Yıl Yerleşkesi Ve 10. Yıl Fen Fakültesi Giriş Kapıları Tadilat Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	714.000
	19 (On Dokuz) Kalem Toner Alım İşİ	Doğrudan Temin	246.726
	174 (Yüz Yetmiş Dört) Kalem Bakım Onarım Malzemesi Alım İşİ	Doğrudan Temin	745.828
	Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Kuaförü Pdm AnküzeF Yapı İşleri Dairesi Ofis Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	720.000
	10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı Projektör Alım İşİ	Doğrudan Temin	285.600
	Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Laboratuvar Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	732.000
	Ankara Üniversitesi Muhtelif Yerleşkelerde Kanallar Rögarlar Atık Su Hatları Tadilatları Ve Temizlikleri Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	720.000
	Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı İle Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası Tehlike Arz Eden Su Kaçaklarının Giderilmesi İşİ	Doğrudan Temin	732.000
	Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beyas Binası Sks Binası Doğalgaz Kaçaklarının Giderilmesi Ve Onaylarının Alınması İşİ	Doğrudan Temin	114.960
	Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yemekhane Tadilatı Ve Çökeltme Kuyusu Yapım İşİ	Doğrudan Temin	540.000
	Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Tehlike Arz Eden Cephe Kaplamalarının Sökülmesi İşİ	Doğrudan Temin	720.000
	Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Çatı Mahallinde Tadilat Ve Yalıtım Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	666.000
	113 (Yüz Yirmi Üç) Kalem Kırsatiye, Sıhhi Tesiat Ve Marangoz Üretim Malzemesi Alım İşİ	Doğrudan Temin	746.086
	Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	318.040

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarı Ve Muhtelif Mahallerde Tadilat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	731.400
Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi Ve Ataum Derslik Düzenlenmesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu Lambri Tadilatı Rektörlük Binası Mutfak Tadilatı İle Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşi	Doğrudan Temin	729.600
Veteriner Fakültesi Dekanlığı Çelik Tezgah Alım İşi	Doğrudan Temin	739.800
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Doğalgaz Kaçaklarının Giderilmesi Ve Başkent Gaz Standartlarına Getirilmesi İşi	Doğrudan Temin	108.000
Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Yerleşkesi Veteriner Fakültesi İlahiyat Fakültesi Ve Muhtelif Mahallerde Doğalgaz Hatları Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	734.820
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Görme Araştırmaları Ve Az Görme Rehabilitasyon Birimi Kazan Dairesi Ve Doğalgaz Hattı Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	665.460
Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Klima Santrali Isıtma Hattı Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	648.000
Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Haymana Myo Lamer Hukuk Fakültesi Dctf Ve Muhtelif Mahallerde Tadilat Yapım	Doğrudan Temin	624.000
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Teras Kat Çelik Çatı Projesi Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	84.000
Akraba Dışı Doku Ve Kordon Kanı Bankası Sıcak Su Hattı Tadilatı İle Muhtelif Mahallerde Kanal Tadilatları Ve Temizlikleri Yapılması İşi	Doğrudan Temin	720.000
Ankara Üniversitesi Eski Diş Hekimliği Fakültesi Binası Güçlendirme Ve Tadilatına Ait Statik İle Mimari Projelerinin Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	696.000
140 (Yüz Kırk) Kalem Sıhhi Tesisat Ve Marangoz Üretim Malzemesi Alım İşi	Doğrudan Temin	720.036
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kızılcahamam Erkek Yurdu Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	720.000
Ankara Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı - Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu - Yabancı Diller Yüksekokulu Ve Muhtelif Mahallerde Tadilat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	719.400
Ankara Üniversitesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tadilat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	726.000
Ankara Üniversitesi Tıp Dekanlık Binası Amfi Mühendislik Fakültesi Konservatuvar Binası Ve Muhtelif Alanlarda Tadilat Yapılması İşi	Doğrudan Temin	660.000
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 300Kv Voltaj Regülatörü Ve Muhtelif Alanlarda Elektrik Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	732.000
Ankara Üniversitesi Keçiören Öğrenci Evi İle Gıda Mühendisliği Kombi Ve Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşi	Doğrudan Temin	648.500
Ankara Üniversitesi Cebeci Eğitim Yerleşkesi Kazan – Sağlık Bilimleri Fakültesi Boyler Hattı Ve Muhtelif Tesisat Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	600.000
Ankara Üniversitesi Araştırma Merkezi Korkuluk Yapılması İşi	Doğrudan Temin	504.000

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	Ankara Üniversitesi Muhtelif Birimlerdeki Jeneratörlerin Ağır Bakımlarının Ve Gerekli Tadilatlarının Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	582.000
	90 (Doksan) Kalem Sıhhi Tesisat Ve Marangoz Üretim Malzemesi Alım İşi	Doğrudan Temin	534.742
	2023/1120268 Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik M.Y.O. Onarım İşi. (2023-2024 Yıllarına Sari)	Açık İhale	554.246
	2023/1081564 İkn.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Uygulama Hastanesi Depo Onarım İşi (2023-2024 Yıllarına Sari)	Açık İhale	3.400.236
	2021/124520 İhale Kayıt Numaralı Ankara Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım (2021-2022 Yıllarına Sari) İşi	Açık İhale	9.225
TOPLAM			32.538.071

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-35 İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşi

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2011100-1432	İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi	2023/745878 İhale Kayıt Numaralı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Deprem Performansının İyileştirilmesi Ve Cephe Onarım İşi (2023-2026) Yıllarına Sari)	Pazarlık Usulü	104.012.059
TOPLAM				104.012.059

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-36 İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım İşi

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2021100-178521	İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Tadilatı	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Kbb, Üroloji Ve Genel Cerrahi Ameliyathaneleri Büyük Onarım İşi (2021-2022 Yıllarına Sari) 9- Ek Hakediş, 2024/287116 Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi 9 Adet Ameliyathane Ve Strelizasyon Mahali Yapım İşi. (2024-2025 Yıllarına Sari)	Pazarlık Usulü	98.543.467
TOPLAM				98.543.467

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-37 Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşi

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023100-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi			

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	Ankara Üniversitesi Çankırı Şabanözü Çaparkayı Köyü 117 Ada 80 Parsel Hâlihazır Harita Ve İmar Planı Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	414.000
	Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşi	Doğrudan Temin	41.960
	2024/397492 İkn Ankara Üniversitesi Çankırı İli Şabanözü İlçesi 117 Ada 80 Parselde İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Yapılmasına Ait Hizmet Alım İşi	Pazarlık Usulü (21/F)	920.000
	2021/502161 İhale Kayıt Numaralı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Çocuk Hastalıkları Abd Binası Zemin Kat Tadilat İşi Kesin Hesap Ödemesi	Açık İhale Usulü	46.982
	2023/988921 Ankara Üniversitesi Girişimsel Mr Klinik Araştırma Uygulama Merkezi Tadilat İşi 3. Hakediş Ödemesi	Pazarlık Usulü	7.328.706
TOPLAM			8.751.648

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-38 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023I00-206147	Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	CPM CİHAZI (2 adet)	Doğrudan Temin	176.880
		KLİMA (18000 BTU, 5 adet)	Doğrudan Temin	216.000
		KLİMA (24000 BTU, 11 adet))	Doğrudan Temin	526.790
		C KOLLU SKOPİ CİHAZI	DMO	1.848.488
		SABİT RENKLİ DOPPLER USG CİHAZI	DMO	1.439.875
		SABİT RENKLİ DOPPLER USG CİHAZI	DMO	877.903
		ENDOSKOPI YIKAMA CİHAZI	DMO	246.717
		EKOKARDİYOĞRAFI	DMO	1.232.295
		SABİT RENKLİ DOPPLER USG CİHAZI (2 adet)	DMO	1.937.707
		AŞI SAKLAMA DOLABI(2 adet)	DMO	42.794,40
		AYAK BACAĞ POZİSYON BOTU (2 adet)	DMO	382.644
		FOTOTERAPİ(6 adet)	DMO	184.020
		RADYAN ISITICILI YATAK	DMO	139.530
		VENTİLATÖR (2 adet)	DMO	1.320.393
		DEFİBİLATÖR (CPR DESTEKLİ VE PACE ÖZELLİKLİ, 2 adet)	DMO	215.013

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

DEFİBİLATÖR (CPR DESTEKLİ VE PACE ÖZELLİKLİ,3 adet)	DMO	338.133
EKG (4 adet)	DMO	249.059
EKG (5 adet)	DMO	289.708
EKG	DMO	58.527
ZEMİN TEMİZLEME ARACI KARCHER	DMO	62.926
YER YIKAMA MAKİNESİ	DMO	62.926
TELSİZ MİKROFON (4 adet)	DMO	69.066
HEADSET MİKROFON (4 adet)	DMO	50.759
RENKLİ SABİT DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI	DMO	1.492.854
RADYAN ISITICILI AÇIK YATAK (2 adet)	DMO	299.798
TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (8 adet)	DMO	310.205
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	DMO	34.621
MOMOGRAFİ CİHAZI	Açık İhale Usulü	13.306.700
MİKROMANİPULASYON SİSTEMİ	Açık İhale Usulü	5.460.000
BATARYALI DELİCİ OYUCU MOTOR SETİ	Pazarlık Usulü	1.944.000
OTOMATİK ENJEKTÖR CİHAZI	Açık İhale Usulü	1.170.400
WES KİTİ VE SARFI (400 adet)	Açık İhale Usulü	3.965.280
KROMATOĞRAFİ CİHAZINA KİT ALIMI (7 Kalem) -AMİNO ASİT -GENİŞLETİLMİŞ METABOLİK TARAMA	Açık İhale Usulü	224.160
KROMATOĞRAFİ CİHAZINA KİT ALIMI (7 Kalem) -ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR KİTİ -ANTİBİYOTİK İLAÇLAR KİTİ -ANTİDEPRESAN İLAÇLAR KİTİ -ANTİMİYOTİK İLAÇLAR KİTİ -ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR KİTİ	Açık İhale Usulü	467.720
MİKROBİYOLOJİK EMİNİYET KABİNİ (5 Kalem Laboratuvar Cihazı)	Pazarlık Usulü	348.600
HIZLI WESTERN BLOT KONFİRMASYON SİSTEMİ (5 Kalem Laboratuvar Cihazı)	Pazarlık Usulü	1.848.840
ÇOKLU TÜP ÇALKALAYICI (5 Kalem Laboratuvar Cihazı)	Pazarlık Usulü	86.640
ÇALKALAMALI SU BANYOSU (5 Kalem Laboratuvar Cihazı)	Pazarlık Usulü	62.640
PH ÖLÇÜM CİHAZI (5 Kalem Laboratuvar Cihazı)	Pazarlık Usulü	28.800
TOPLAM		43.019.411

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo 39- Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023100-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	MR 3 KALEM	Açık İhale Usulü	105.545.000
		TOPLAM		105.545.000

2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-40 Eğitim Sektörü Proje Açıklamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	AÇIKLAMA
2024H05-233790	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	2024-2024	Bakım Onarım, Makine-teçhizat	2.000.000	1.800.000	1.648.320	Üniversitemiz bünyesinde bulunan spor tesislerinin bakım ve onarım işleri için kullanılmıştır.
2024H03-233444	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2024-2024	Etüd Proje	500.000	1.150.000	1.150.000	1 adet etüd proje hizmeti alınmıştır
2020H03-150547	Büyük Onarım	2020-2026	Büyük Onarım	113.000.000	143.215.000	143.131.948	Üniversitemizin muhtelif birimlerinde yapım ve acil bakım onarım ihtiyaçları için kullanılmıştır.
2024H03-233441	Yayın Alımı	2024-2024	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	35.000.000	37.000.000	33.452.215	Proje ödeneği süreli yayın aboneliği, veri tabanı aboneliğinde ve kitap alımında kullanılmıştır.
2024H03-233439	Muhtelif İşler	2024-2024	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	78.000.000	77.701.026	73.167.225	Proje kapsamında muhtelif birimlerin ihtiyacına makine-teçhizat alımları, tefriş ve bilişim teknolojileri alımları gerçekleştirilmiştir. Ödeneğin 53.878.719,42TL'si muhtelif makine-teçhizat alımları ve tefriş alımlarında, 19.288.505,52 TL'si ise bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır.
2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	2022-2025	Eğitim	24.000.000	61.601.647	61.601.102	Öğrenci sosyal alanlarını arttırmak için yapılan seralar gençlik merkezi işi tamamlanmıştır.
2024H03-245804	Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu	2024-2026	Kurulu Güç (48 MW)	0	300.000.000	297.275.606	Proje devam etmektedir.
2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2014-2024	Etüd Proje	2.000.000	5.300.000	4.097.313	Proje devam etmektedir.
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2014-2026	Restorasyon	70.500.000	58.159.118	13.747.533	Ankara Üniversitesi çeşitli yerleşkelere ait restorasyon işi kapsamında kullanılmıştır.
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler	2018-2026	Bakım onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri	2.500.000	2.250.000	439.800	Alt yapı gerçekleşti ve kataloglama devam etmekte olup, toplam harcama 439.800,00 TL' dir tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo-41 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2024H05-233790	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi TÖMER Basımevi Ve Rektörlük Ek Bina Tesisat Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	196.320
		Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşi	Doğrudan Temin	720.000
		Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Koç Yurdu Ve Cebeci Merkezi Kazan Dairesi Mekanik Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	581.000
		Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Koç Yurdu Ve Cebeci Merkezi Kazan Dairesi Mekanik Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	151.000
TOPLAM			1.648.320	

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-42 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2024H05-233790	-
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	-
Proje Amacı	A.Ü Çevre ve Spor Alanları Düzenlenmesi İşi için kullanılmıştır	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Makine-teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024	-
Proje Tutarı (maliyeti)	2.000(Hazine Yardımı)	-
Yapılan Harcama		1.800

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-43 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2024H03-233444	-
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamındaki Etüd Proje Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Etüd-Proje	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024	-
Proje Tutarı (maliyeti)	500 (Hazine Yardımı)	1.150
Yapılan Harcama		1.150

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-44 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kapsamında Yapılan Etüd-Proje İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2024H03-233444	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Ankara Üniversitesi Çankırı Şabanözü Çaparkayı Köyü 117 Ada 80 Parsel Hâlihazır Harita Ve İmar Planı Hazırlanması İşİ	Doğrudan Temin	135.000
		Ankara Üniversitesi Çankırı Şabanözü Çaparkayı Köyü 117 Ada 80 Parsel Hâlihazır Harita Ve İmar Planı Hazırlanması İşİ	Doğrudan Temin	135.000
		2024/397492 İkn Ankara Üniversitesi Çankırı İli Şabanözü İlçesi 117 Ada 80 Parselde İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüd Yapılmasına Ait Hizmet Alım İşİ	Pazarlık Usulü	160.000
		2024/397492 İkn Ankara Üniversitesi Çankırı İli Şabanözü İlçesi 117 Ada 80 Parselde İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüd Yapılmasına Ait Hizmet Alım İşİ	Pazarlık Usulü	720.000
TOPLAM				1.150.000

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-45 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2020HO3-150547	Büyük Onarım Projesi	Ankara Üniversitesi Haymana Çiftliği Büyükbaş Hayvan Padokları Çatı Ve Muhtelif Tadilatları Yapılması	Doğrudan Temin	708.000
		Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mescit Yapılması İşi	Doğrudan Temin	738.000
		Ankara Üniversitesi Kazan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Kamera Sistemlerinin Mevcut Hatlarının İyileştirilmesi Yapım İşi	Doğrudan Temin	196.200
		2023 Yılı Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alım İşinden Kalan 3. Ödeme.	Doğrudan Temin	58.752
		Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ve Mecra Toplantı Salonu Çatı Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	426.000
		Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi Personel Yemekhanesi Çatı Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	168.000
		Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sistem Odaları K.G.K. Akü Değişimi Ve Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	14.400
		Ankara Üniversitesi Rektörlük Ek Bina Ofis Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	732.000
		Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Muhtelif Binaların Yangın Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	156.000
		Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Akkem Sks Binası Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Muhtelif Mekanik Tadilatlar Yapılması İşi	Doğrudan Temin	712.080
		Ankara Üniversitesi Okçuluk Merkezi Soyunma Odaları Tadilatı Ve Bildiricilik Ünitesi Temiz Su Hattı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	174.000
		Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuaye Alanı Düzenlenmesi Yapım İşi	Doğrudan Temin	660.000
		Ankara Üniversitesi Rektörlük Ve Enerji Mühendisliği Binaları Jeneratör Arızalarının Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	46.800,
		Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Salonu Ses Sistemi Revizyonu Yapılması İşi	Doğrudan Temin	103.920
		Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kompanzasyon Sisteminin Revizyonu Yapılması İşi	Doğrudan Temin	30.000
		Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Asansör Kumanda Panosu Değişim İşi	Doğrudan Temin	103.200
		Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı Ve Bariyeri Tadilatı Yapım İşi	Doğrudan Temin	66.000
		Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi Orta Gerilim Aboneliğine Bağlı 2 Adet Trafo 3 Adet Trafo Kompanzasyon Panosu İle Cevizlidere Kök Hücre Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Kompanzasyon Panosu 2024 Yılı Periyodik Bakım Ve Takibinin Yapılması İşi	Doğrudan Temin	26.400
		Ankara Üniversitesi Keçiören Öğrenci Evi Beyas Binası Çevre Aydınlatma İşleri İle Muhtelif Binalardaki Elektrik Arızalarının Giderilmesi İşi	Doğrudan Temin	264.000
		Ankara Üniversitesi Çankırı İli Şabanözü İlçesi 117Ada 80 Parselde Yaklaşık 100 Hektarlık Alana Ait İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüdünün Yapılması Kapsamında Jeofizik Raporunun Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	276.000
		Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası Mutfak Mahalli Soğuk Oda Ve Muhtelif Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	660.000
		Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Muhtelif Jeneratör Periyodik Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	157.920
		Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Muhtelif Asansörlerin Periyodik Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	162.120
		Ankara Üniversitesi Ankara İli Yenimahalle İlçesi Gazi Mahallesi 43372 Ada 3 Ve 4 Parsellere Ait Parselasyon Planı Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	315.000
		Ankara Üniversitesi Çankırı Şabanözü Çaparkayı Köyü 117 Ada 80 Parsel Hâlihazır Harita Ve İmar Planı Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	135.000
		Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Muhtelif Jeneratör Periyodik Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi	Doğrudan Temin	213.840
		Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi Orta Gerilim Aboneliğine Bağlı 2 Adet Trafo 3 Adet Trafo Kompanzasyon Panosu İle Cevizlidere Kök Hücre Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Kompanzasyon Panosu 2024 Yılı Periyodik Bakım Ve Takibinin Yapılması İşi	Doğrudan Temin	118.800

	Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Muhtelif Asansörlerin Periyodik Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşİ	Doğrudan Temin	505.440
	Ankara Üniversitesi Beypazarı Yüksekokulu İstinat Duvarı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	720.000
	Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İle Rektörlük Senato Odası Elektrik Kabloları Arızası Giderilmesi Ve Muhtelif Elektrik Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	196.800
	Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi 2000 Kva Trafo Tadilatı Yapım İşİ	Doğrudan Temin	450.000
	Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi Mevcut Atık Malzemelerin Taşınması Hizmet Alım İşİ	Doğrudan Temin	719.736
	Ankara Üniversitesi Çankırı Şabanözü Çaparkayı Köyü 117 Ada 80 Parsel Parselasyon Planı Hazırlanması İşİ	Doğrudan Temin	270.000
	Ankara Üniversitesi Keçiören Öğrenci Evi İle Gıda Mühendisliği Kombi Ve Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	73.000
	Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Binası Çöken Zemin Ve Muhtelif Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	720.000
	Ankara Üniversitesi Milli Piyango Yurdu - Mühendislik Fakültesi – 10. Yıl Yerleşkesi Muhtelif Kanalizasyon Tadilatları Ve Temizlikleri Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	720.000
	Ankara Üniversitesi Kalecik Ve Elmadağ Meslek Yüksekokulu Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	732.000
	Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi Ve Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	720.000
	Ankara Üniversitesi F Blok Zemin Kat Wc Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	721.500
	Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi – Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu – Bala Meslek Yüksekokulu – Dtcf Ve Muhtelif Mahallerde Data Hattı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	420.000
	Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci Evi Ve Gıda Mühendisliği İle Muhtelif Birimlerde Tesisat Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	384.000
	Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi – İlahiyat Fakültesi – Spor Bilimleri Fakültesi Ve Muhtelif Binalarda Çatı Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	480.000
	Ankara Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Şoförsüz Araç Kiralama Hizmeti	Doğrudan Temin	324.804
	Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi Beden Eğitimi Fakültesi Telefon Santrali Kurulması İşİ	Doğrudan Temin	342.000
	Ankara Üniversitesi Dtcf – Cebeci – Gümüşdere – Gölbaşı Yerleşkesi Asansör Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	161.700
SAYFA TOPLAMI			16.083.412

Tablo-45 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri (Devamı)

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
DEVİR TOPLAMI				16.083.412
2020H03-150547	Büyük Onarım Projesi	Ankara Üniversitesi Tescilli Fen Fakültesi Merkezi Kazan Dairesi Doğalgaz Projelendirme İle Başkentgaz Uygunluk Belgesi Ve Muhtelif Mekanik Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	1.476.000
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Birimlerin Pano Ve Paratoner Topraklama Ölçümlerinin Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	67.200
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Yerleşkelerde Elektrik Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	180.000
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Yerleşkelerde Jeneratör Tadilatları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	66.000
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Yerleşkelerde Asansör Tamiratları Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	180.000
		Ankara Üniversitesi Muhtelif Mahallerde Çatı Tadilatı Yapılması İşİ	Doğrudan Temin	516.000

Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Ana Bina Asma Kat Yemekhanesi Doğalgaz Kaçakları Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	137.520
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ve Yıldırım Beyazıt Yurdu Mekanik Tesisat Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	695.760
Ankara Üniversitesi Beypazarı Myo. A-B-C Blok Asansörlerinin Periyodik Muayene Eksiklerinin Tamamlanması İşi	Doğrudan Temin	24.000
Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Muhtelif Binaların Yangın Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi	Doğrudan Temin	492.000
Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Aziz Köklü Konferans Salonu Teras Alanı Statik Raporu Düzenlenmesi İşi	Doğrudan Temin	30.000
Ankara Üniversitesi 10. Yıl 50. Yıl Dışkapı Ve Cebeci Yerleşkeleri Data Hatları Yapılması İle Nallıhan Meslek Yüksekokulu Elektrik Tesisatı Tadilatları Ve Yenileme Yapım İşi	Doğrudan Temin	720.000
Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası Makam Odası Tadilatı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	192.000
Ankara Üniversitesi Muhtelif Birimlerin Kesintisiz Güç Kaynağı Ve Elektrik Tamiratları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	372.000
Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi Köpek Barınağı Ve Muhtelif Tadilatlar Yapım İşi	Doğrudan Temin	729.306
Ankara Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ofis Tadilatı İle Kuruma Ait Kocatepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Üzerindeki Taşınmazın Isıtma Tesisatı Ve Doğalgaz İşleri Yapılması	Doğrudan Temin	540.000
Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesi Çevre Sulama Sistemi Ve Hidrofor Tadilatı Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Isıtma Sistemi Pompaları İle Kolektör Değişimi Ve Muhtelif Tesisat Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	720.000
2023/1312951 Ankara Üniversitesi Cebeci Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu Cephe Tadilat İşi(2023-2024 Yıllarına Sari)	Pazarlık Usulü	1.621.087
2023/1204851 Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Şevket Aziz Kansu Binası 8.Kat Ofis Tadilatı İşi	Açık İhale	337.494
2023/1120268 Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik M.Y.O. Onarım İşi. (2023-2024 Yıllarına Sari)	Açık İhale	3.374.189
2023/788647 Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi F Blok Güçlendirme Ve Tadilat İşi.	Pazarlık Usulü	113.413.061
Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Yerleşkesi Lojman Binasının Depremzede Vatandaşlar İçin Düzenlenmesi İşi	Doğrudan Temin	1.746
Ankara Üniversitesi Çankırı İli Şabanözü İlçesi Çaparkayı Mahallesinde 117 Ada 80 Parselde Yapılması Düşünülen 40 Mwe Saha Uygulamalı Ges Projelendirme Hizmet Bedeli Ödemesi.	Kamu İhale Kanuna Tabi Olmayan Harcamalar	860.046
Ankara Üniversitesi Çankırı İli Şabanözü İlçesi Çaparkayı Mahallesinde 117 Ada 80 Parselde Yapılması Düşünülen 40 Mwe Saha Uygulamalı Ges Bağlantı Hattı Proje Onay Bedeli.	Kamu İhale Kanuna Tabi Olmayan Harcamalar	303.127
TOPLAM		143.131.948

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-46 Yayın Alımı Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2024H03-233441	-
Proje Adı	Yayın Alımı	-

Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına Eğitim ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024	-
Proje Tutarı (maliyeti)	35.000 (Hazine Yardımı)	37.000
Yapılan Harcama		33.452

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-47 Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları

Proje No	Proje Adı	Alım Usulü	Alımı Yapılan Mallar	Alımın Toplam Maliyeti
2024H03-233441	Yayın Alımı	4734 Sayılı Kanununun 22/a-22/d maddesi	Sürelî Yayın Aboneliği Veri Tabanı Aboneliği Kitap Alımı Bilişim Malzemesi Alımları	33.452.215
TOPLAM				33.452.215

Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tablo-48 Yazma ve Nadir Eserler Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
		MAL ALIM	Doğrudan Temin	439.800
TOPLAM				439.800

Kaynak: Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

Tablo-49 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Alımları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2024H03-233439	-
Proje Adı	Muhtelif İşler	-
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje Kapsamında Muhtelif Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımlarının Gerçekleştirilmesi	-
Proje Yeri	Ankara	-
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024	-
Proje Tutarı (maliyeti)	78.000 (Hazine Yardımı))	77.701 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama		73.167

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-50 Muhtelif İşler Projesi (Bilgi Teknolojileri) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar
----------	-----------	--------------------

		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2024H03-233439	MUHTELİF İŞLER (Bilgi Teknolojileri)	İşletim Sistemi Lisans Güncelleme	4734-13 b/3	1.751.400
		Güvenlik Yazılımı (Symantec Endpoint Protection)Lisans Güncelleme	4734-13 b/3	1.257.600
		Zafiyet Yönetimi Aracı Yaz. Lisans Güncelleme	4734-13 b/3	516.000
		Siber Olgunluk Risk ve Güvenlik Uygulaması Yaz.	4734-3/b	780.000
		3D Mücevher Yazılım Lisansı	4734-22/a	869.460
		Kesintisiz Güç Kaynağı Periyodik Bakım	4734-22/b	141.600
		Sistem Odası Klima Periyodik Bakım	4734-22/d	126.324
		Kurumsal Veri Merkezi Bakımı	4734-22/d	352.800
		Akademik Sınav Yazılımı	4734-22/d	250.000
		Oracle Veri Tabanı Lisans Güncelleme ve Destek	4734-22/d	40.985
		Oracle Lisans Güncelleme Ve Destek	4734-22/d	48.188
		Bütünleşik Veri Analizi (Ranking Dashboard) Yazılımı	4734-22/d	717.600
		Ek Ders Otomasyonu Bordro Modülü Yazılımı	4734-22/d	168.000
		19 Kalem Yedek Parça Alımı	4734-22/d	496.314
		Dizüstü ve Tablet Bilgisayar	4734-22/d	186.408
		43 Kalem Yedek Parça Alımı	4734-22/d	747.212
		Kullanıcı Denetim Yazılım	4734-22/d	350.000
		E-Posta Yazılımı	4734-22/d	180.000
		REDHat Lisans Yenileme	4734-22/d	178.500
		Ek Ders Otomasyon Yazılımı lisanslı	4734-22/d	372.000
		DLP Veri Sızıntı ve Tespit ve Engelleme Yaz. Lisansı	4734-22/d	378.000
		Web Zafiyet Yazılım Lisansı	4734-22/d	317.760
		92 Kalem Yedek Parça Alımı	4734-22/d	730.135
		Video Konferans Yazılım lisansı	4734-22/d	12.960
		Web Tarama ve Etkinlik Değ.Yaz. Lisansları	4734-22/d	39.000
		Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama Yazılımı	4734-22/d	603.750
		Sunucu Alımı	4734-22/d	744.000
		San Anahtarlama Cihazı ve Yedekleme Sunucusu Alımı	4734-22/d	746.400
		Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Lisansı	4734-3/g	2.373.233
		Yeni nesil Güvenlik Duvarı Lisansı Yenileme	4734-3/g	2.370.947
		Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Lisansı Yenileme	4734-3/g	313.600
		Hard Disk Alımı	4734-3/g	405.506
		Ağ Anahtarlama Cihazı ve Kenar Anahtarı Alımı	4734-3/g	722.824
TOPLAM				19.288.506

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo-51 Muhtelif İşler Projesi (Makine Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023H03-212121	MUHTELİF İŞLER (Makine-Teçhizat)	İç Ortam Gece Görüşlü Kamera Gece Görüşlü Dom Kamera Dış Ortam Gece Görüşlü Kamera Barkod Yazıcı Sanal Gerçeklik Gözlüğü	22/D	52.038
		Güneşlik Perde Tül Perde Mescid Halısı Zebra Perde	22/D	64.049
		Soyunma Dolabı Dosya Dolabı Ayakkabılık	22/D	136.762
		Eliptik Bisiklet Koşu Bandı	22/D	479.760
		Verzalit Yemek Masası	22/D	78.540
		Çamaşır Yıkama Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi	22/D	83.214
		TOPLAM		

Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tablo-51 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2023H03-212121	MUHTELİF İŞLER (Makine Teçhizat)	ZEBRA PERDE BLACK OUT ZEBRA PERDE KALIPÇI TAŞLAMA MAKİNESİ KARBONDİOKSİT TÜPÜ VE BASINÇ KONTROL ARMATÖRÜ OKSİJEN TÜPÜ VE BASINÇ KONTROL ARMATÖRÜ ARGON TÜPÜ VE BASINÇ KONTROL ARMATÖRÜ BASINÇ KONTROL ARMATÖRÜ PROJEKSİYON CİHAZI KONFERANS KOLTUĞU UPS 6 KVA BASINÇ ÖLÇME PLATFORMU DENEY VE EĞİTİM SETİ SAVAKLAR ÜZERİNDEN AKIŞ DENEY VE EĞİTİM SETİ KOMPRATÖR KUMPAS KÜÇÜK TORNA MANYETİK KARIŞTIRICI VORTEKS OTOMATİK PİPET SETİ	DMO	3.263.153

	<p>KÜL FIRINI TABURE (SIRTLIKLI TABURE) İÇİ DOLU TAKIM DOLABI HİDROLİK DENEY VE EĞİTİM SETİ İNTRAVENÖZ ENJEKSİYON KOL MAKETİ 4'LÜ ÖĞRENCİ DOLABI ELYAFLI SİYAH DANS FLOOR KAPLAMA MUŞAMBA (400 M2 1.6 MM KALINLIK) MASA ÖRTÜSÜ METAL DERİ DÖŞEME SANDALYE DİKDÖRTGEN YEMEK MASASI YUVARLAK YEMEK MASASI</p>		
	<p>YEMEKHANELERDE KULLANILMAK ÜZERE 82 KALEM TEFRİŞAT MALZMESİ ALIMI GRAFİK ÇİZİM TABLETİ TARAYICI HOPARLÖR MONİTÖR MİKROFON MİKROFON SEHPASI ÇELİK RAF ÇELİK RAF LR SFP LX SFP LR SFP SX SFP SR SFP GİGABİT POE++ İNJEKTOR GİGABİT POE++ İNJEKTOR 1050W POWER SUPPLY HBA KART SR SFP DİRECT ATTACH CABLE BLACK OUT PERDE PLİCELL PERDE ZEBRA PERDE VERZALİT MASA 80X140 KATLANIR ÇADIR 3X3 ZEBRA PERDE ALÜMİNYUM JALUZİ PERDE BLACK OUT PERDE SIRTLIKLI TABURE UPS AKÜ VE BİLEŞENLERİ 6 KVA AKÜSÜZ</p>	DMO	5.316.155
	<p>ZEBRA PERDE DİJİTAL KAMERA MİCRO SD KARTI SES KAYIT CİHAZI HEADSET MİKROFON KONTROL KALEMİ DOME KAMERA FİMER MEDYA CONVERTER 24 PORT POE SWİCH 32 KANAL AHD NVR KAYIT CİHAZI BULLET KAMERA YAN KESKİ</p>	DMO	4.014.963

BARİYER KUMANDASI
BARİYER KUMANDASI
KAPI İSİMLİĞİ
KAR BUZ MAKİNESİ
DİJİTAL ULTRASONİK BANYO
18 LT
MİKROPLAKA İNKÜPATÖR
ÇALKALAYICI
ULTRASONİK
HOMOJENİZATÖR
MASAÜSTÜ SOĞUTMALI
SANTRİFÜJ
KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ
ÇOK KANALLI PİPET
TABURE
SIRTLIKLI TABURE
TABELA
KURUM LOGOSU
KUMLAMA FOLYO CAMLARA
ŞERİT UYGULAMA
KURUM LOGOSU
ÜNİVERSİTE LOGOSU
AYAKLI TABELA
İLAN PANOSU
KAPI İSİMLİĞİ
UPS
ÇELİK RAF
OTOMATİK SAF SU CİHAZI (DİSTİLE SU CİHAZI)
ÜÇLÜ KAPAKLI VOLANLI
KOMPACT ARŞİV DOLABI
ÜÇLÜ KAPAKLI VOLANLI
KOMPACT ARŞİV DOLABI
ÜÇLÜ KAPAKSIZ SABİT
KOMPACT ARŞİV DOLABI
22 KALEM TABELA İSİMLİK
8 KALEM TABELA İSİMLİK
2 KALEM TABELA İSİMLİK
KLİMA
PANEL VE MASA SİSTEMİ (KÜP ŞEKLİNDE) TEKLİ
PANEL VE MASA SİSTEMİ (KÜP ŞEKLİNDE) ÇİFTLİ
PANEL VE MASA SİSTEMİ (KÜP ŞEKLİNDE) BÖLÜCÜ
ÇALIŞMA MASASI (70X120)
İSTİF RAFI 4 KATLI 180X80X161
İSTİF RAFI 4 KATLI 200X70X105
İSTİF RAFI 4 KATLI 100X80X161
İSTİF RAFI 4 KATLI 200X180X161
PLAKA TANIMA SİSTEMİ
SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ
EL TİPİ FETAL DOPPLER CİHAZI
FOTOSEL
ELEKTRONİK TRAKEAL ENTÜBASYON EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ (SESLİ UYARI)
SEKİZ DAMARLI ÇOK FONKSİYONLU ENJEKSİYON EĞİTİM KOLU

	<p>KARŞILAŞTIRMALI KALÇA İNTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ</p> <p>ABDOMEN PALPASYO VE DOĞUM SİMÜLATÖRÜ</p> <p>BASİT ERKEK ÜRETAL KATERİZASYON SİMÜLATÖRÜ</p> <p>BASİT KADIN ÜRETAL KATERİZASYON SİMÜLATÖRÜ</p>		
	<p>BEBEK CPR MANKENİ (MANUEL)</p> <p>ÇOCUK OBSTRÜKSİYON VE CPR MANKENİ (MANUEL)</p> <p>ÇOCUK ENTÜBASYON SİMÜLATÖRÜ</p> <p>BEBEK ENTÜBASON SİMÜLATÖRÜ</p> <p>TEL RAF 183x61x180 4 KATLI</p> <p>TEL RAF 170x61x180 4 KATLI</p> <p>TEL RAF 91x61x180 4 KATLI</p> <p>40 TEPİLİ KONVEKSİYONLU FIRIN</p> <p>KONVEKSİYONLU FIRIN YEDEK TEPİLİ ARABASI</p> <p>YEMEKHANE ZEMİN IZGARASI</p> <p>METAL DERİ DÖŞEME</p> <p>SANDALYE</p> <p>DİKDÖRTGEN YEMEK MASASI</p> <p>TEHLİKELİ ATIK DEPOSU</p> <p>SOĞUTMA EKİPMANI</p> <p>PERDE</p> <p>PERDE</p> <p>DAL ÖĞÜTME MAKİNESİ</p> <p>NEVRESİM TAKIMI</p> <p>YASTIK</p> <p>YASTIK ALEZİ</p> <p>ELYAF YORGAN</p> <p>MİKRODALGA FIRIN</p> <p>50 PE100 BORU PN10 SDR17</p> <p>32 PE100 BORU PN10 SDR17</p> <p>20 PE100 BORU</p> <p>9 UÇLU SULAMA KABLOSU</p> <p>5 UÇLU SULAMA KABLOSU</p> <p>1"SELENOİD VANA DEBİ KONTROLLÜ</p> <p>1" PN16 KÜRESEL VANA</p> <p>PİRİNÇ T.G</p> <p>3/04 AÇI HAFIZALI ROTOR</p> <p>1/2" ROTOR SPRİNK</p> <p>MP-2000-90 ROTATOR</p> <p>MP-1000-90 ROTATOR</p> <p>1/2" SPREY SPRİNK GÖVDE</p> <p>STANDART VANA KUTUSU</p> <p>26*39 h: 31 cm</p> <p>JUMBO VANA KUTUSU 36*50 h:31 cm</p> <p>20*1/2" ERKEK DİRSEK KAPLİN</p> <p>20*3/4" ERKEK DİRSEK KAPLİN</p> <p>50*1 1/2" ERKEK ADAPTÖR KAPLİN</p> <p>50*1 1/2" ERKEK DİRSEK KAPLİN</p>	Doğrudan Temin/DMO	8.825.667

50*1 1/2" DİŐİ ADAPTÖR
KAPLİN
50*1 1/2" DİŐİ DİRSEK KAPLİN
32*1/2" CİVATALI PRİZ KOLYE
32*3/4" CİVATALI PRİZ KOLYE
TEFLON BANT BÜYÜK 10
METRE
50*1"*50 ERKEK TE KAPLİN
50*50*50 TE KAPLİN
50*50 DİRSEK KAPLİN
50 KÖRTAPA KAPLİN
50*50 MANŐON KAPLİN
32 KÖRTAPA KAPLİN
32*1" ERKEK ADAPTÖR KAPLİN
32*1" ERKEK DİRSEK KAPLİN
1"*1" NİPEL P.P.
MTT-100 1" 2 ÇIKIŐLI
KOLLEKTÖR
32*32 MANŐON KAPLİN
MPTOOL AYAR ANAHTARI
14 İSTAYSONLU KONTROL
ÜNİTESİ
4 İSTASYONLU KONTROL
ÜNİTESİ
6 İSTASYONLU KONTROL
ÜNİTESİ
ELEKTRİK BANTI
LABORATUVAR TİPİ İLETKENLİK
ÖLÇER
LABORATUVAR TİP-TEK İNOX
KAPI DİK BUZDOLABI
2 GÖZLÜ CAM OCAK
KLİMA (DIŐ ÜNİTE)
KLİMA (DIŐ ÜNİTE)
KLİMA (İÇ ÜNİTE)
KLİMA (KONTROL PANELİ)
ERİŐİM NOKTASI
TERAPATİK BOY AYNASI
MASAÜSTÜ TERAPİ AYNASI
EL DİNAMOMETRE/EL GÜCÜ
ÖLÇÜM CİHAZI
ELECTRONİK PİNÇMETRE
MONOFİLAMENT SET
HAFİF DOKUNMA DERİN
BASINÇ AYAK DUYU
DEĞERLENDİRME SETİ
AESTHESİOMETER 2 NOKTA
DİSKRİMİRATÖR
DOKUZ DELİKLİ PEG TESTİ
ANAHTAR ÇEVİRME
YARDIMCISI
GÜNLÜK YAŐAM AKTİVİTELERİ
SETİ
TERAPATİK EGZERSİZ HAMURU
DUYU FIRÇA SETİ
PLATES TOPU
EGZERSİZ HAMURU
ENGELLİ TRANSFER TAHTASI
GONYOMETRE
KANEDYEN KOLTUK DEĞNEĐİ
MANUEL TEKERLEKLİ
SANDALYE
BEYAZ DENGE BASTONU

DÜĞME İLİKLEME APARATI
6 İŞLEVLİ BECERİ KÜPÜ
DENGE TAHTASI
DİĞİ FLEX EL EGZERSİZ YAYI
SETİ
KLOZET YANI TUTUNMA BARI
EL BECERİ GELİŞTİRME
TABLASI
TERMOPLASTİK PELLETS
TRANSFER DESTEK KEMERLERİ
KLOZET
MASAJ TABANCASI
KÜVET OTURAĞI
EGZERSİZ BAND SETİ
MOTORLU KUMANDALI
TAŞIMA LİFTİ
TRANSFER KAYIŞ ASANSÖRÜ
ÖN VE YAN PANELLİ KÜVET
KAYDIRMAZ ÖRTÜ
HAFIZA KARTLARI GÖRSEL
EĞİTİM SETİ 1 YETİŞKİN 1
ÇOCUK
KALEM TUTMA APARATI
HALKA GEÇİRME AKTİVİTESİ
KALIN TUTAMAÇLI MANDAL
SETİ
İNCE TUTAMAÇLI MANDAL
SETİ
BİLYE
BONCUK
KUTULU SAYI ÇUBUĞU
KUTULU SAYMA FASULYESİ
100'LÜ LEGO
JENGA OYUNU
TANGRAM OYUNU
BALONCUK ÇIKARTMA OYUNU
KAVRAMA APARATLARI SETİ
BOX AND BOX
PARMAK GONYOMETRE
EGZERSİZ MATI
CIRT CIRT (EXER TABLA) EL
EGZERSİZ
EL BECERİ GELİŞTİRME
TABLASI
EL REHABİLİTASYON MASASI
(FASULYE MASA,
FONKSİYONEL MASA)
PURDUE PEGBOARD EL BECERİ
TESTİ
EGZERSİZ MERDİVENİ (3
BASAMAKLI)
TEDAVİ YATAĞI
DİKENLİ TIRTIKLI DUYU TOPU
TEKERLEKLİ WALKER OTURMA
APARATLI KATLANABİLİR
TEKERLEKSİZ WALKER
HAREKETLİ KATLANIR
ÜÇGEN VE RULO
POZİSYONLAMA YASTIKLARI
PARALEL BAR (PLATFORMLU)
KUM TORBASI SETİ
BOSU TOPU/DENGE PEDİ
EGZERSİZ FLEXBAR

	<p>POWER WEB EL EGZERSİZ ÇEMBERİ DİKSRİMANATÖR MEZURA BASELİNE MEASUREMENT TAPE MOTORLU TEDAVİ YATAĞI STOR PERDELER / GÜNEŞLİKLER (ÖLÇÜ ALINMASI GEREKLİDİR) HAVA PERDESİ KLİMA ELEKTRİKLİ DAİRE TESTERE ARAÇ BAKIM ONARIM SANTRAL BAKIM ONARIM TAMİR İŞİ 06AU0533 7 ADET ARAÇ BAKIM ONARIM 9 ADET ARAÇ BAKIM ONARIM ARAÇ BAKIM ONARIM KLİMA & BARDAK YIKAMA MAKİNASI BAKIM ONARIM ÇİM BİÇME, HAVA ÜFLEME, DAL BUDAMA, MOTORLU TIRPAN, MOTORLU TESTERE, ÇİM KESME, AĞAÇ KESME MAKİNASI BAKIM ONARIM YAZICI VE FOTOKOPİ MAKANASI YAZICI & FOTOKOPİ MAKİNAESİ LAZER YAZICI LAZER YAZICI LAZER YAZICI PROJEKSİYON CİHAZI PROJEKSİYON CİHAZI PROJEKSİYON CİHAZI PROJEKSİYON CİHAZI PROJEKSİYON CİHAZI MONİTÖR MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR KASASI MONİTÖR YIKAMA ROBOTU MASA DOLAP GRUBU SEHPA ÇALIŞMA KOLTUĞU MİSAFİR KOLTUĞU SEHPA SEHPA KOLTUK ÇALIŞMA KOLTUĞU MASA L TABLASI LAZER YAZICI YENİ NESİL 2024 STANDART ÇALIŞMA MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR MONİTÖR MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI MONİTÖR</p>		
	<p>ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNESİ</p>	<p>Doğrudan Temin/DMO/Açık İhale/Pazarlık</p>	<p>32.458.781</p>

CICCO C9200 STACK ALICI
VERİCİ LR SFP
HUAWEI D5V6 SSD HARD DİSK
HARD DİSK
HARD DİSK
YEDEKLEME ÜNİTESİ
YEDEKLEME ÜNİTESİ
OMURGA ANAHTAR ALICI
VERİCİ
YAZICI
YAZICI
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
BULAŞIK MAKİNASI
TOPLANTI MASASI
TOPLANTI KOLTUĞU NORMAL
HOLM ÖNDEN ASKILI VESTİYER
L:80 H: 191
POLY KOLTUK / BOYALI KIZAK
AYAK- S.DERİ VEYA KUMAŞ
PUZZLE 80*160 ETAJERLİ
PERDELİ MASA
HOLM DOLAP L:80 H:84
NOTE DOLAP AÇIK RAFLI
50*140 H:67 /MELAMİN
HOLM YARIM KAPAKLI DOLAP
L:80H:156
HOLM DOLAP L:80 H:84
HOLM DOLAP L:80 H:84
HOLM YARIM KAPAKLI DOLAP
L:80 H:156
HOLM YARIM KAPAKLI DOLAP
L:80H:156
HOLM DOLAP L:80 H:84
HOLM DOLAP L:80 H:84
KEOPS KOLSUZ ÜÇLÜ KANEPE /
S. DERİ
KEOPS KOLSUZ TEKLİ KANEPE /
S.DERİ
HOLM DOLAP L:80 H:84
HANDY DİKDÖRTGEN MASA
70*140 / XLARGE - MELAMİN
"POINT 4 AYAKLI SİYAH /
BOYALI AYAK
- PLASTİK SIRT - S.DERİ VEYA
KUMAŞ"
PUZZLE 70*140 PERDELİ
ÇALIŞMA MASASI
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ
ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNESİ
BÜRO TİPİ BUZDOLABI
BÜYÜK BOY BUZDOLABI
FOTOKOPİLİ YAZICI
BELGE TARAYICI
BİLGİSAYAR KASASI
MONİTÖR
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
FLEKSSİT FERRO HTFR 16 3000
"L" Tipi 2'li Masa Takımı
FLEKSSİT LUKA SDSEC 1400 30
"L" Tipi 2'li Masa Takımı
FLEKSSİT LUKA SDSEC 1400 75
2'li Masa Takımı

FLEKSSİT ECOME HTMD 190 YK
80 800 x 380 x 1900 mm Dosya
Dolabı
FLEKSSİT ECOME HTMD 160 S
55 800 x 425 x 1560 mm Çift
Kişilik Soyunma Dolabı
FLEKSSİT FULYA SDSFL 0500 50
500 x 500 x 450 mm Sehpa
GOLDSİT QUATRO Quatro 100
Pa Çalışma Koltuğu
GOLDSİT REKS Reks 100 F
Çalışma Koltuğu
GOLDSİT QUATRO M 300 P
Misafir Koltuğu
GOLDSİT MOTTO Motto Cs01
Masa Takımı 180 6'lı Masa
Takımı
VİOMOB VBMDA-021005
VBMDA-021005 Konferans
Sandalyesi
ARÇELİK 6433 Bulaşık makinesi
ARÇELİK D 154140 MB Büro
tipi buzdolabı
MORMAŞ MY01 METAL
PROFİL Askılık
MORMAŞ FORM K-006-1
Sandalye
GOLDSİT LEGOLD LEGOLD
MS03 OVAL 250 LİK TOPLANTI
MASASI 2500 x 1100 x 750 mm
Toplantı Masası
OFİSMARK YMK-COM-01 YMK-
COM-01 770 x 770 x 750 mm
Yemek Masası
OFİSMARK MİNEL AMFİ-MN-
09 ÖN MODÜL Çift Kişilik Amfi
Sırası
OFİSMARK MİNEL AMFİ-MN-
10 ORTA MODÜL Çift Kişilik
Amfi Sırası
OFİSMARK MİNEL AMFİ-MN-
11 ARKA MODÜL Çift Kişilik
Amfi Sırası
GOLDSİT NET Net 200 B
Konferans Sandalyesi
MY MY 3B S30 MY 3B S30 3
Boyutlu Yazıcı
27" EKRAN
TEKLİ BANK TİPİ SANDALYE
ÇALIŞMA MASASI
DOSYA DOLABI
KİTAPLIK
SANDALYE
TOPLANTI MASASI
ÇALIŞMA KOLTUĞU
YEMEK MASASI
ÇALIŞMA MASASI
DOSYA DOLABI
SANDALYE
KONFERANS SANDALYESİ
TOPLANTI MASASI
2'Lİ MASA TAKIMI
L TİPİ 2'Lİ MASA TAKIMI

L TİPİ 2'Lİ MASA TAKIMI		
2'Lİ AÇIK OFİS SİSTEMİ		
SEHPA		
TEKLİ BANK TİPİ SANDALYE		
SEHPA		
SEHPA		
SEHPA		
2'Lİ MASA TAKIMI		
TOPLANTI MASASI		
ÇALIŞMA KOLTUĞU		
MASA TAKIMI		
KANEPE		
ÇALIŞMA KOLTUĞU		
TOPLANTI MASASI		
TOPLANTI MASASI		
TOPLANTI MASASI		
DOSYA DOLABI		
SANDALYE		
ÇALIŞMA KOLTUĞU		
PROJEKSİYON CİHAZI		
PROJEKSİYON CİHAZI		
ANAHTARLAMA CİHAZI (SWİCH)		
ERİŞİM NOKTASI		
ERİŞİM NOKTASI		
ERİŞİM NOKTASI		
DOKU TAKİP CİHAZI		
DOKU GÖMME CİHAZI		
MİKROTOM CİHAZI		
MOKROSKOPİ KABİNİ		
TEZGAH ÜSTÜ METERTYAL İSTASYONU		
ARAŞTIRMA MİKROSKOBU		
ÜÇLÜ EĞİTİM ATAŞMANI		
ÇALIŞMA KOLTUĞU		
ÇALIŞMA KOLTUĞU BAR		
SANDALYESİ		
ÇALIŞMA KOLTUĞU		
DAİRESEL DÖNÜŞLÜ MASA		
V MASA		
MASALAR İÇİN ÖN PERDE		
YÜKSEK MASA		
DAİRESEL MASA		
BİSTRO MASA		
BUAT KAPAĞI		
KABLO TAVASI		
MASA		
MASA		
EĞİTMEN MASASI		
TOPLAM		53.878.719

Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tablo-52 Tarihi Yapıların Restorasyonu Projesi Kapsamında Yapılan Bakım Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	2023/300671 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tescilli Anatomi Patoloji Binası Restorasyonu Uygulama İşleri	İstisna 4734 / 3-I	3.177.933

	Ankara Üniversitesi Tescilli Hayvan Hastanesi Ve Acil Kliniği Zemin Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	632.067
	Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesi Tescilli Zootehni Ve Genetik A.B.D. Binalarında Tehlike Arz Eden Cephelerin Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	1.980.000
	Ankara Üniversitesi Tescilli Hayvan Hastanesi Ve Acil Kliniği Zemin Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	1.467.933
	Ankara Üniversitesi Tescilli Ziraat Fakültesi Uygulama Ve Araştırma Çiftliği Orta Gerilim Hattı Revizyon Yapılması İşi	Doğrudan Temin	729.600
	Ankara Üniversitesi Tescilli Cebeci Tıp Yerleşkesi Atık Deposu Revize Edilmesi Yapım İşi	Doğrudan Temin	2.100.000
	Ankara Üniversitesi Tescilli 10. Yıl Yerleşkesi Otopark Ve Çevresi Düzenlenmesi Aydınlatması İle Kanalizasyon Hattı Yapılması İşi	Doğrudan Temin	2.136.000
	Ankara Üniversitesi Tescilli Fen Fakültesi Merkezi Kazan Dairesi Doğalgaz Projelendirme İle Başkentgaz Uygunluk Belgesi Ve Muhtelif Mekanik Tadilatları Yapılması İşi	Doğrudan Temin	264.000
	2024/493562 İ.K.N. Ankara Üniversitesi Çankırı İli Şabanözü İlçesi Çaparkayı Mahallesi 117 Ada 80 Parselde Yapılması Düşünülen 40 Mwe Saha Uygulamalı Ges Projelendirme İşi 2. Hakediş Ödemesi	Açık İhale Usulü	1.260.000
Toplam			13.747.533

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tablo-53 Tarihi Yapıların Etüd Projesi Kapsamında Yapılan Bakım Onarım İşleri

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Hizmet ve Yapım İşi	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2014H040020	Tarihi Yapıların Etüd Projesi	2023/1120268 Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik M.Y.O. Onarım İşi. (2023-2024 Yıllarına Sari)	Açık İhale Usulü	200.000
		2023/1120268 Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik M.Y.O. Onarım İşi. (2023-2024 Yıllarına Sari)	Açık İhale Usulü	856.647
		Ankara Üniversitesi Araştırma Merkezi Korkuluk Yapılması İşi	Doğrudan Temin	213.000
		Tescilli 43372 Ada 3 Parselde Yapılması Planlanan Mescit Binasına Ait Mimari Mühendislik Projeleri Zemin Etüdü Ve Yaklaşık Maliyet Dosyası Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	1.800.000

	Ankara Üniversitesi Tescilli 10. Yıl Yerleşkesi Ve Muhtelif Alanların Arazi Ölçümü Durum Haritası İle Aplikasyon Krokisi Yapılması İşi	Doğrudan Temin	34.000
	Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi Çevre Düzenleme İşi	Doğrudan Temin	732.666
	Ankara Üniversitesi Haymana Çiftliği Orta Gerilim Havai Hat Projesi Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	120.000
	Ankara Üniversitesi Çankırı Şabanözü Çaparkayı Köyü 117 Ada 80 Parsel Hâlihazır Harita Ve İmar Planı Hazırlanması İşi	Doğrudan Temin	141.000
TOPLAM			4.097.313

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

Tablo-54 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	2010-2024	Makine-Teknik, Teknolojik Araştırma, İnşaat (5.930 m ²)	1.800.000	1.620.000	1.633.741	Proje kapsamında ihtiyaca binaen mal alımı ve personel alımları olmak üzere toplam 1.633.740,82 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2024K12-234058	Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Lab.	2024-2024	Bakım Onarım, Teknolojik Araştırma	15.000.000	13.500.000	8.746.800	Proje kapsamında ihtiyaca binaen mal alımı için 8.476.800,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2024K12-234059	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme	2024-2024	Bakım Onarım, Teknolojik Araştırma	29.502.000	26.551.800	23.908.425	Proje kapsamında personel ödemeleri ve sar malzemesi giderleri için toplam 23.908.424,66 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

***Projelerin özel hesabına 2023 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.**

Tablo-54 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu (Devamı)

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKT ERİSTİĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA*	AÇIKLAMA
2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	2017-2024	Etüt-Proje	77.000.000	69.300.000	21.168.000	Proje kapsamında 21.168.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, Kök Hücre Araştırma Merkezi inşaatı tamamlanmıştır.

2024K12-234057	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2024-2024	Proje Desteği	27.981.000	167.333.029	137.737.807	. Yıl içerisinde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine gelir fazlası karşılığı olarak 118.952.029,31TL ve YÖK desteği olarak 20.400.000,00 yapılan işlemlerle birlikte toplam ödenek 167.333.029,31TL'ye ulaşmıştır toplam 137.737.807,42 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
----------------	--	-----------	---------------	------------	-------------	-------------	---

***Projelerin özel hesabına 2023 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında proje yürütücüleri tarafından birim yatırım değerlendirme raporlarında bildirilen tutarlar dikkate alınmıştır.**

Tablo-55 Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab. Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Yardımcı Personel	Doğrudan	1.531.541
		Sarf Malzeme	İhale	19.200
		Sarf Malzeme	İhale	34.200
		Sarf Malzeme	İhale	28.800
		Seyahat	Doğrudan	20.000
TOPLAM				1.633.741

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Tablo-56 Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Proje No	Proje Adı	Yapılan Harcamalar		
		Mal/Hizmet Yapım İşİ	Alım Usulü	Alımın Toplam Maliyeti
2024K12-234058	Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı	Standart Numune Alımı	İhale	286.800
		Konfokal Raman Spektroskopisi	İhale	2.450.000

		Mikro Kimyasal Analiz Sistemi	İhale	1.950.000
		UPS ve Regülatör Sistemi	İhale	3.790.000
TOPLAM				8.476.800

Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

7. ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların artırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının artması anlamına gelecektir.

Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinliği artıracaktır.

Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet içi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve değerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Tablo-57 Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 Sonu Kümülatif Harcama			2024 Yılı Program Ödenek			2024 Yılı Revize Ödenek			2024 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	10		1.607.301			151.300			327.500			688.177		629.721	
Sağlık	4		1.335.695			278.709			285.000			567.025		394.346	
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	5		151.283			415.588			151.283			278.305		278.305	
TOPLAM	19		3.094.279			845.597			763.783			631.078		1.302.372	

Tablo-58 Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 Sonu Kümülatif Harcama			2024 Yılı Program Ödenek			2024 Yılı Revize Ödenek			2024 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık	1		4.000			0			4.000			4.000		0	
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		2.000			0			4.000			4.000		0	

Tablo-59 Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: HİBE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 Sonu Kümülatif Harcama			2024 Yılı Program Ödenek			2024 Yılı Revize Ödenek			2024 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	-		-			-			-			-			-
Sağlık	1		2.408			-			2.408			2.408			-
Diğer Kamu Hizmetleri	-		-			-			-			-			-
-İktisadi															
-Sosyal	-		-			-			-			-			-
TOPLAM	1		2.408			0			2.408			2.408			0

Tablo-56 Ankara Üniversitesi 2024 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem

Bütçe Türü: İCMAL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 Sonu Kümülatif Harcama			2024 Yılı Program Ödenek			2024 Yılı Revize Ödenek			2024 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	10		1.607.301			151.300			327.500			688.177			629.721
Sağlık	4		1.342.103			278.709			291.408			573.433			394.346
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	5		151.283			415.588			151.283			278.305			278.305
TOPLAM	19		3.100.687			845.597			770.191			637.486			1.302.372

2024 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablo-61 Sektör Adı: Eğitim

2024 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2023 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2020H03-150547	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2026	Ankara	298.000	117.800	143.215	+	30.215	143.132
408	2014H-042028	Tarihi Yapıların Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	5.300	0	5.300	+	3.300	4.097
408	2014H04-2029	Tarihi Yapıların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2026	Ankara	297.948	28.500	64.659	-	5.841	13.748
408	2018H04-18318	Yazma ve Nadir Eserler Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2026	Ankara	9.500	5.000	2.250	-	2.250	470
408	2024H05-233790	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	1.800	0	1.800	-	200	1.648
408	2022H03-186627	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ankara	61.602	0	61.602	+	37.602	61.601
408	2024H03-233444	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	1.150	0	1.150	+	650	1.150
408	2024H03-233439	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	87.701	0	77.701	-	299	73.167
408	2024H03-245804	Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu	ÖZEL GELİR	2026	Çankırı	810.000	0	300.000	+	300.000	297.276
408	2024H03-233441	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	37.000	0	37.000	+	2.000	33.452
TOPLAM						1.610.001	151.300	694.677		365.177	629.741

Tablo-62 Sektör Adı: Sağlık

2024 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2023 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mik.	Harcama Toplam
408	2011I00-1432	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	ÖZEL BÜTÇE	2026	Ankara	0	520.000	14.034	157.326	+	77.326	104.012
408	2021I00-178521	İbn-i Sina Hast. Ameliyathane Tadilatı	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ankara	0	550.000	235.000	130.000	+	13.321	98.543
408	2024I00-228080	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	0	78.260		78.260	+	13.260	77.493
408		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE		Ankara	0	4.000		4.000			
408	2023I00-217181	Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	0	144.290	105.000	114.615	+	104.615	114.297
TOPLAM						0	1.296.550	354.034	484.201		208.522	394.345

Tablo-63 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)

2024 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2023 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	(+/-)	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
408	2010K12-1300	Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	0	61.613	59.993	1.620	-	180	1.634
408	2024K12-234058	Yer Bilimleri Uyg. Ve Ar. Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	0	13.500	0	13.500	-	1.500	8.477
408	2024K12-234057	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2024	Ankara	0	167.333	0	167.333	+	139.352	137.738
408	2024K12-234059	Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücre Ürün Geliştirme Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	0	26.552	0	26.552	-	2.950	23.908
408	2017K12-3908	Kök Hücre Araştırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ankara	0	424.895	355.596	69.300	-	7.700	21.168
TOPLAM						0	693.893	415.589	85.128		127.022	192.925
